


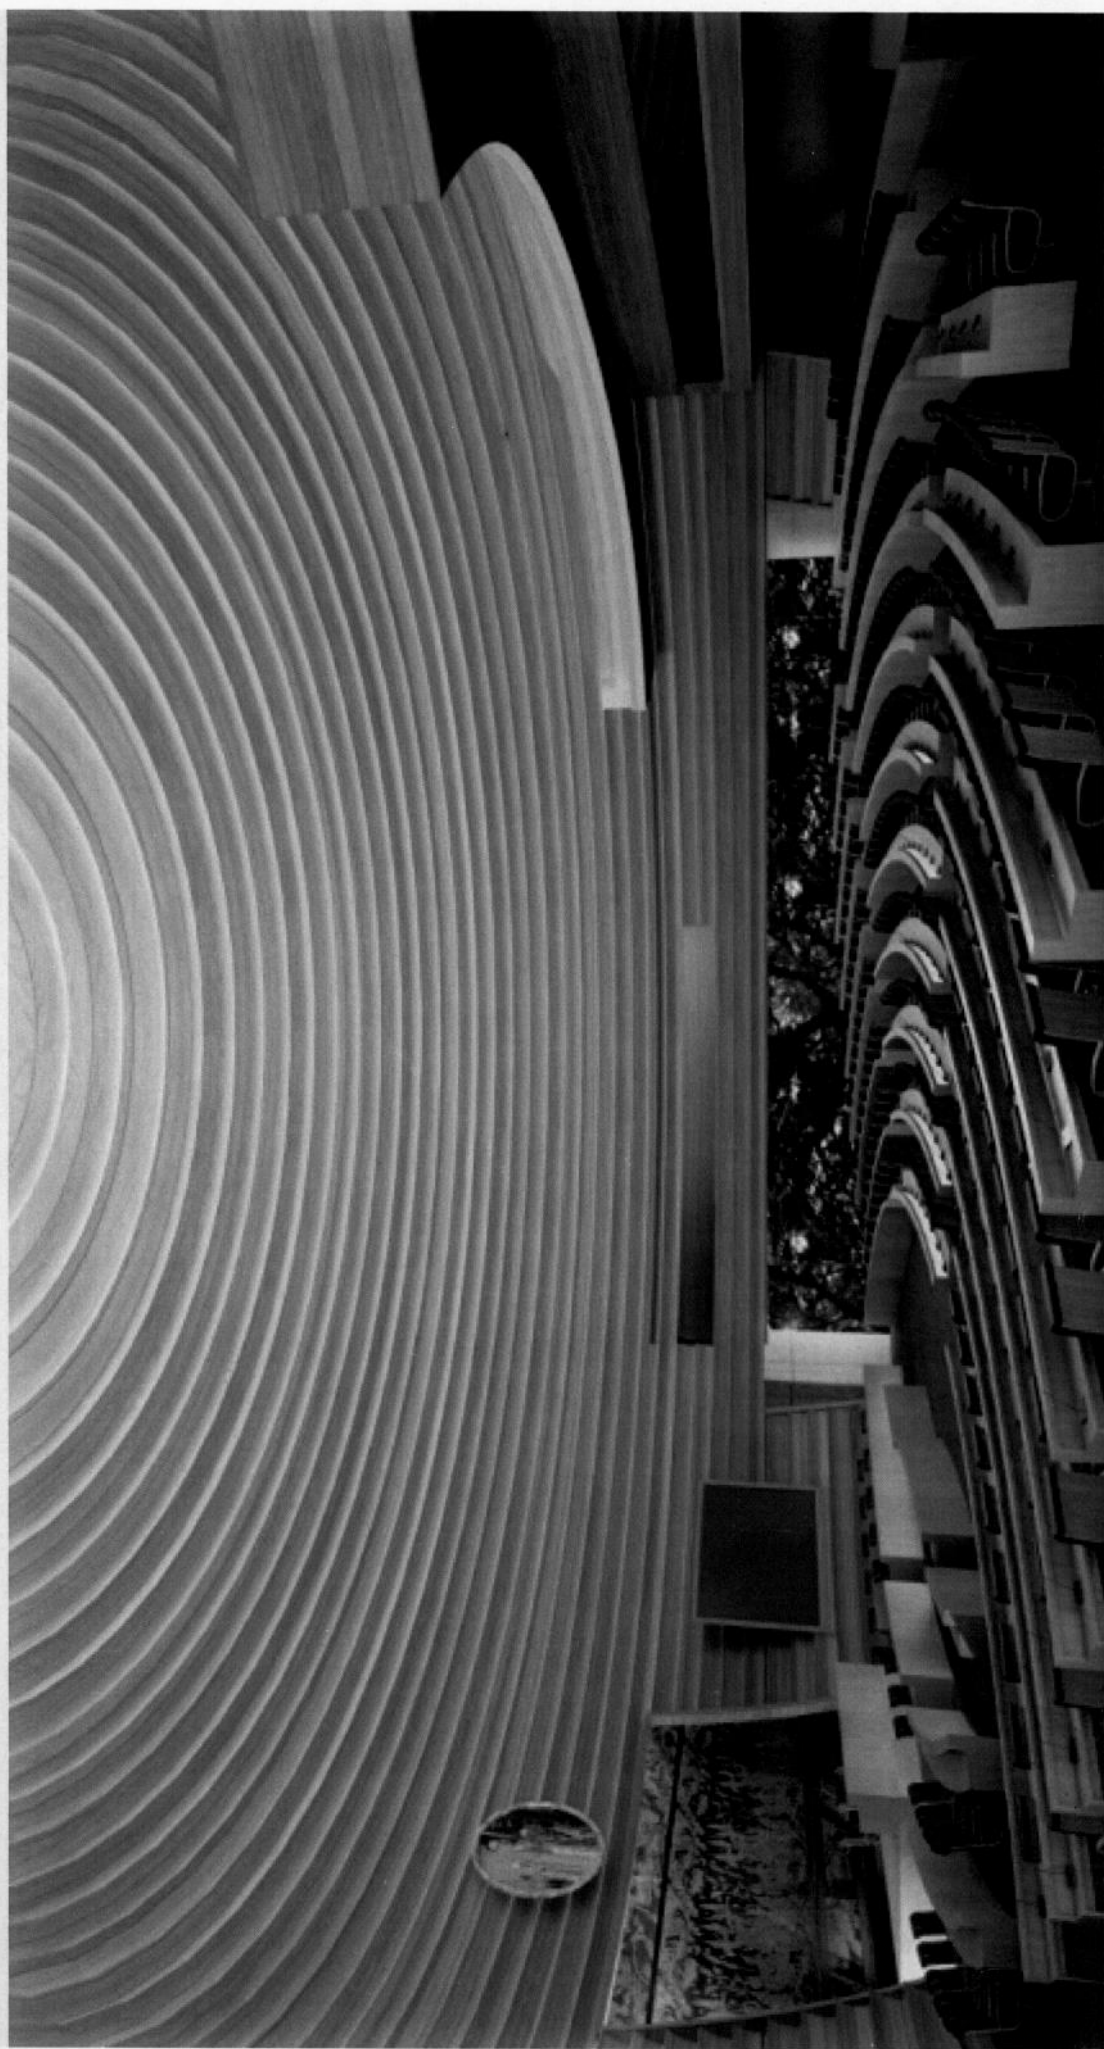

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สารบัญ

หน้า

- สารบัญ
- บทสรุปผู้บริหาร
- สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
- ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ก

ข

๑

๑๓

บทสรุปผู้บริหาร

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ผู้รับจ้างครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ นับวันเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ด้วยการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ประกอบกับปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า และไม่มีที่พักดิน จึงทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังชั่วคราว และงานขุดดิน งานก่อสร้างรากฐาน และงานต่อเนื่องส่วนอื่นๆ
- ตามสัญญาก่อสร้าง กำหนดแบ่งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่โดยประมาณ ๑๒๓ ไร่) ออกเป็น ๔ ครั้ง โดยกำหนดส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดได้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ในความเป็นจริงได้มีการแบ่งการส่งมอบพื้นที่ออกเป็นครั้งย่อยๆ และล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยในปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะในขอบเขตการก่อสร้างอาคารหลักครบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่สามารถส่งมอบให้ผู้รับจ้างได้อีกประมาณ ๒๐ ไร่
- ปริมาณดินที่ต้องขุดเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้งหมด(จากการคำนวณ) ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลบ.ม. โดยตามสัญญาระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดและขนย้ายดินไปยังพื้นที่ภายในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้ ซึ่งในช่วงแรกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการบริจาคดินให้กับวัดและหน่วยงานราชการควบคุมไปกับการขายทอดตลาด แต่ต่อมากรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ ที่ กค๐๓๑๔/๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระงับการบริจาคดินทั้งหมดและให้ดำเนินการขายทอดตลาดเพียงอย่างเดียว
- ปัจจุบันได้ทำการขนย้ายดินตามปริมาณที่คำนวณไว้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ยังเหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทำการขนย้ายออก (เพิ่มเติมจากปริมาณที่ได้คำนวณไว้) ประมาณ ๓๕,๗๐๐ ลบ.ม. ซึ่งปัจจุบันดำเนินการขนย้ายดินไปแล้ว ๖,๐๖๙ ลบ.ม.
- สำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน งานระบบป้องกันดินพังและขุดดินขนย้ายดิน และงานฐานรากอาคาร ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนงานทั้งโครงการ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๑๕.๔๑ %

บทสรุปผู้บริหาร (ต่อ)

- ตามที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จากสาเหตุผลกระทบจากการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ออกไปจำนวน ๔๗๙ วัน เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๗ คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ในขณะนั้น) ได้พิจารณาประเด็นการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจากเอกสารคำร้องของผู้รับจ้าง จำนวน ๒๕ ฉบับ รวมถึงข้อเท็จจริงจากที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างและที่ปรึกษาบริหารโครงการ และมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๒๘๗ วัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจการจ้างชุดใหม่ ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดเดิม ได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมและมีมติจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้เพิ่มการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปเป็น ๓๘๗ วัน ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ประเด็นปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ในส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครและโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งได้รับแจ้งในที่ประชุมว่ากรุงเทพมหานครจะส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และโรงเรียนโยธินบูรณะจะส่งมอบพื้นที่ได้ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๙ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พิจารณาแล้วมีมติว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม ไม่กระทบกับการก่อสร้างอาคารหลัก โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการส่งมอบพื้นที่ต่อไป

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
1	ผลงานสะสมที่ทำได้	ผลงานที่ทำได้ 15.41 % หมายเหตุ 1. ผลงานสะสมเมื่อ 31 ต.ค.58 ทำได้ 14.81 % 2. คณะกรรมการตรวจการจ้างชุดใหม่ ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดเดิม ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและอุปสรรคจากการทำงาน ออกไปจำนวน 387 วัน จากการประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการจัดดำเนินการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับขยายออกไป	มีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน ได้แก่ - งานขุดและชนดิน (เพิ่มขึ้น 6,069 ลบ.ม.) - งานฐานรากอาคารหลัก แล้วเสร็จ 775 ฐาน จาก 888 ฐาน (เพิ่มขึ้น 20 ฐาน) - งานพื้นชั้น B2 แล้วเสร็จ 59,866 ตร.ม. จาก 80,000 ตร.ม. (เพิ่มขึ้น 6,913 ตร.ม.) - งานติดตั้งเสาเหล็ก ชั้น B2 แล้วเสร็จ 617 ต้น จาก 742 ต้น (เพิ่มขึ้น 17 ต้น) - งานติดตั้งเสาเหล็ก ชั้น B1 แล้วเสร็จ 292 ต้น จาก 800 ต้น (เพิ่มขึ้น 41 ต้น) - งานติดตั้งเสา ชั้น G-2 แล้วเสร็จ 211 ต้น จาก 778 ต้น (เพิ่มขึ้น 39 ต้น) - งานติดตั้ง Bracing Layer 2 แล้วเสร็จ 9,080 ม. จาก 9,278 ม. (เพิ่มขึ้น 0 ม.)

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
2	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 $\frac{7}{10}$ ไร่)	ยังไม่มี การส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม	ส่งมอบแล้ว 102 - 3 - 76 ไร่ (คิดเป็น 83.5%) โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 57 เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 20 - 0 - 80 ไร่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
3	การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - ปริมาณดินทั้งหมดจากการคำนวณ 1,032,818 ลบ.ม. - ผู้รับจ้างขอใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 35,000 ลบ.ม. - เหลือดินที่ต้องทำการขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 997,818 ลบ.ม. ซึ่งใน ส่วนนี้ได้ทำการขนย้ายแล้วเสร็จ - จากการตรวจสอบพบว่ายังมีปริมาณ ดินส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ขุดและขนย้าย ออกอีกประมาณ 35,700 ลบ.ม. (เพิ่มเติมจากปริมาณดินที่คำนวณไว้)	- สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรได้ผู้รับซื้อดิน จำนวน 35,700 ลบ.ม. คือ บ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการขน ย้าย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ใช้เวลาขนย้าย 24 วัน ปัจจุบันดำเนินการขนย้ายดินไปแล้ว 6,069 ลบ.ม. คงเหลือดินที่ต้องทำการขนย้ายอีกจำนวน 29,631 ลบ.ม.	

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค 4.1 ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือ ยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลาน-ประชาชน ลานประชาธิปไตย อาคาร รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งตามแผนงานผู้รับจ้างจะใช้เวลา ก่อสร้างงานส่วนดังกล่าวเป็นเวลา 376 วัน	4.1 ได้มีการเร่งรัดติดตามพื้นที่จากหน่วยงานเดิม ดังนี้ 4.1.1 พื้นที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นพื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร	- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่งคืนพื้นที่พร้อมอาคารให้กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 - กรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดิน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 - ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างดำเนินการขยายสภาพเพื่อรื้อถอนอาคาร ครั้งที่ 2

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.1.2 พื้นที่ของ กทม. เป็นพื้นที่ห้องสมุดและศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้องทำการรื้อถอนอาคารเดิมออกก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	- กรุงเทพมหานครได้ย้ายอุปกรณ์ส่งเครื่องมือทางการแพทย์ ออกจากพื้นที่ทั้ง 2 หน่วยแล้ว ในเดือนเมษายน 2558 - กรมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงินค่าชดเชยให้กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวน 142,000,000 บาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 - กรุงเทพมหานครได้รับค่าชดเชยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 - กรุงเทพมหานครแจ้งว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้กับรัฐสภาได้ภายในเดือนธันวาคม 2558

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.1.3 พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักแห่งใหม่ให้กับ ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำนวน 79 ครอบครัว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างวันที่ 1 พ.ค. 55 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 56 โดยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 56 ถึงสิ้นสุดวันที่ 26 พ.ค. 57 - ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ 1 จากมติครม. ช่วยเหลือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท ออกไป 150 วัน สิ้นสุดวันที่ 23 ต.ค. 57 - ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จากอุปสรรคการส่งมอบพื้นที่ที่ไม่สามารถทำงานได้ (งานเฟส3) ออกไป 270 วัน สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 58

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)		(ต่อ) - ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ครั้งที่ 3 จากอุปสรรคการส่งมอบพื้นที่ที่ไม่สามารถทำงานได้ (งานเฟส4) ออกไป 177 วัน สิ้นสุดวันที่ 13 ม.ค. 59 - ปัจจุบัน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเร่งรัดการก่อสร้าง - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้อาศัยเข้าพักที่ใหม่ โดยประสานกรมธนารักษ์เกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดการเข้าพัก และปรับปรุงแปลต ขส.ทบ.เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้สิทธิ์ในที่อยู่ จำนวน 19 ครอบครัว เข้าพักตามระเบียบข้อกำหนดกรมธนารักษ์ต่อไป

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.1.4 พื้นที่ของ สพฐ. เป็นพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งก่อสร้างที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ	- สพฐ.ได้รับค่าชดเชย ค่าร้อยละย่ายและก่อสร้าง อาคารเรียนแห่งใหม่ ตามบันทึกข้อตกลง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ลง 15 ส.ค. 51 จำนวน 1,000,000,000 บาท -รัฐสภาโดยสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมจำนวน 105,654,700 บาท ตามที่ โรงเรียนโยธินบูรณะเสนอและกรม.อนุมัติให้ ดำเนินการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.57 -รัฐสภาร่วมกับ สพฐ. แก้ไขบันทึกข้อตกลงโครงการ การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ฉบับวันที่ 15 ส.ค.51 ในส่วนของโรงเรียนโยธินบูรณะ ข้อ 2.4 และมีข้อตกลงร่วมกันใหม่เมื่อวันที่


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)		(ต่อ) 9 ก.พ.58 ซึ่งโรงเรียนจะต้องส่งมอบพื้นที่ให้กับรัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม 2558 -สพฐ. โดยโรงเรียนโยธินบูรณะ ลงนามสัญญาจ้างเพิ่มเติม (งบประมาณ 105,654,700 บาท) กับผู้รับจ้างรายเดิม เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน สิ้นสุดวันที่ 20 ม.ค. 59 -ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเร่งรัดการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งโรงเรียนโยธินบูรณะแจ้งว่าจะส่งมอบพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับรัฐสภาได้ภายในเดือนเมษายน 2559

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ผังแสดงพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง

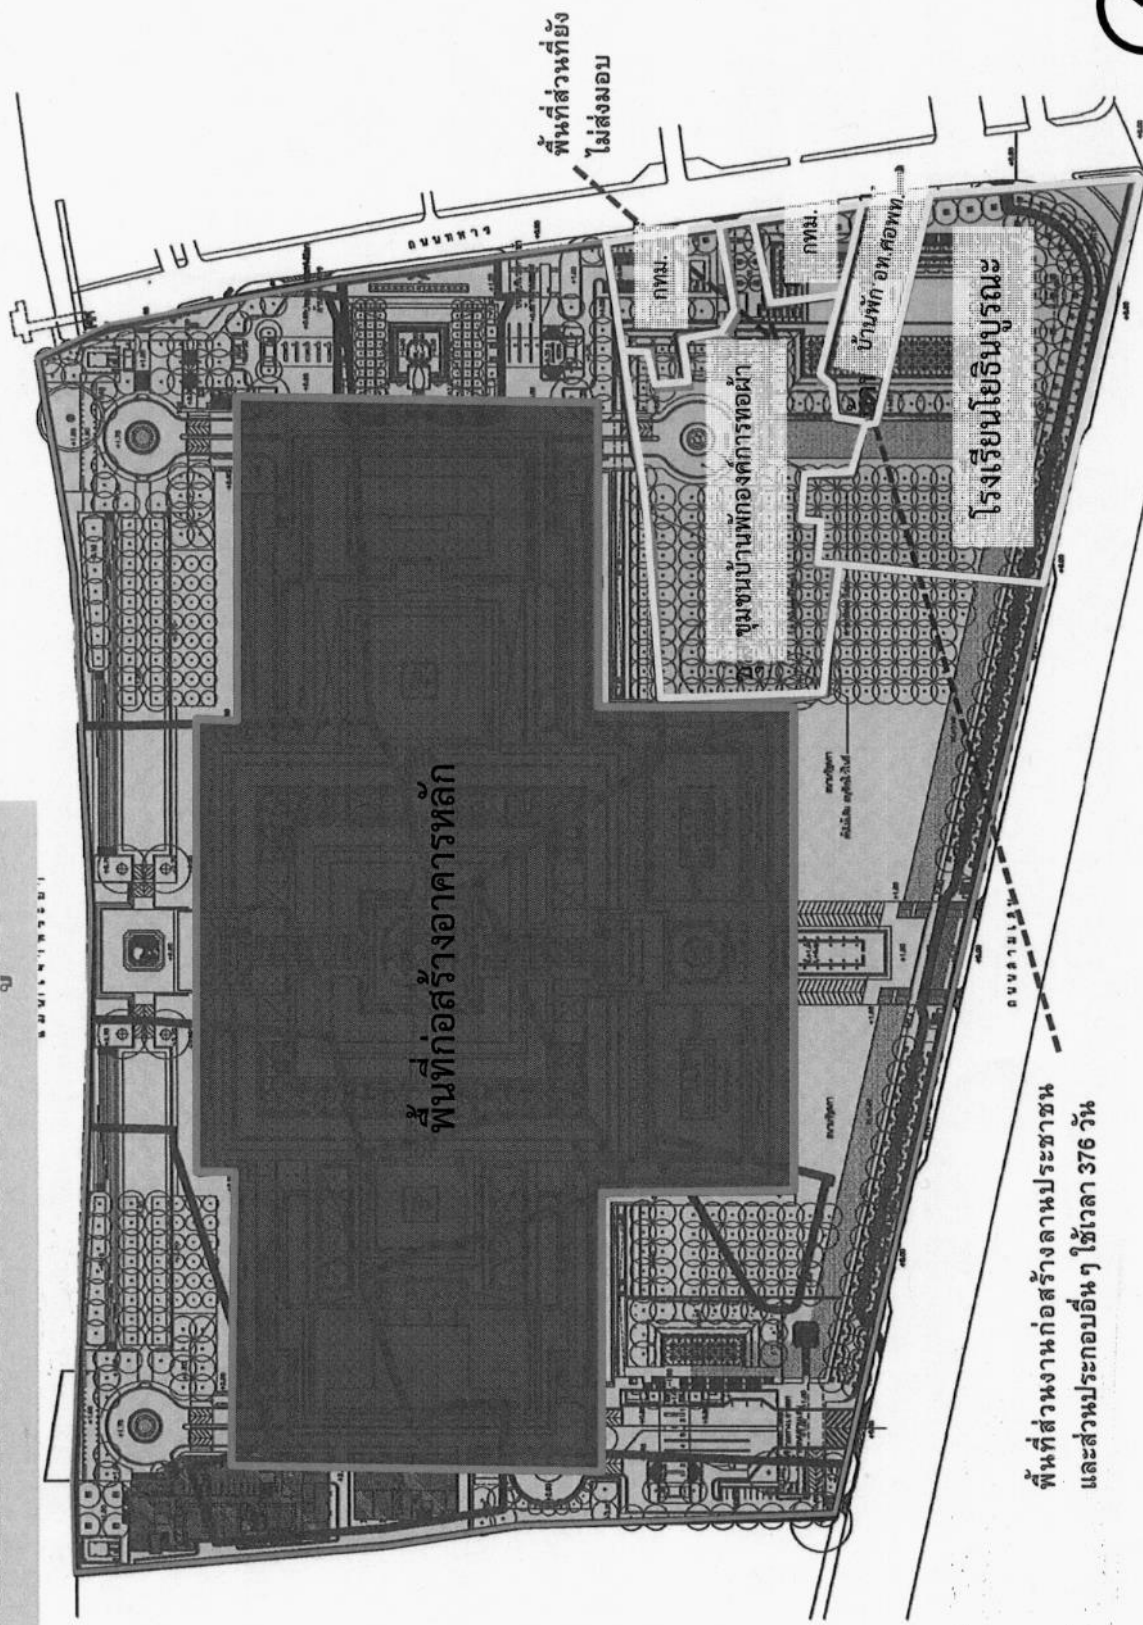


ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว จำนวน ๑๐๓-๓-๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558


ลำดับ	รายละเอียด	ความก้าวหน้าถึง พ.ย. 58	หมายเหตุ
4	ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)	4.2.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้เข้าเจรจากับชาวบ้านให้ย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้แทนของชาวบ้านว่ายินดีย้ายออกแต่ขอให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือค่าชดเชย	กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของ
	เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเชื่อมริม	4.2.2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือไปยังสำนักงานเขตดุสิต ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เจรจากับผู้รื้อถอนให้ย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็ว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิตแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเจรจาและดำเนินการทางกฎหมาย	กรม. ซึ่งหากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2559 บ้านที่รื้อถอนดังกล่าวก็จะต้องได้รับการชดเชยและออกจากพื้นที่



ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ผังความก้าวหน้าฐานราก

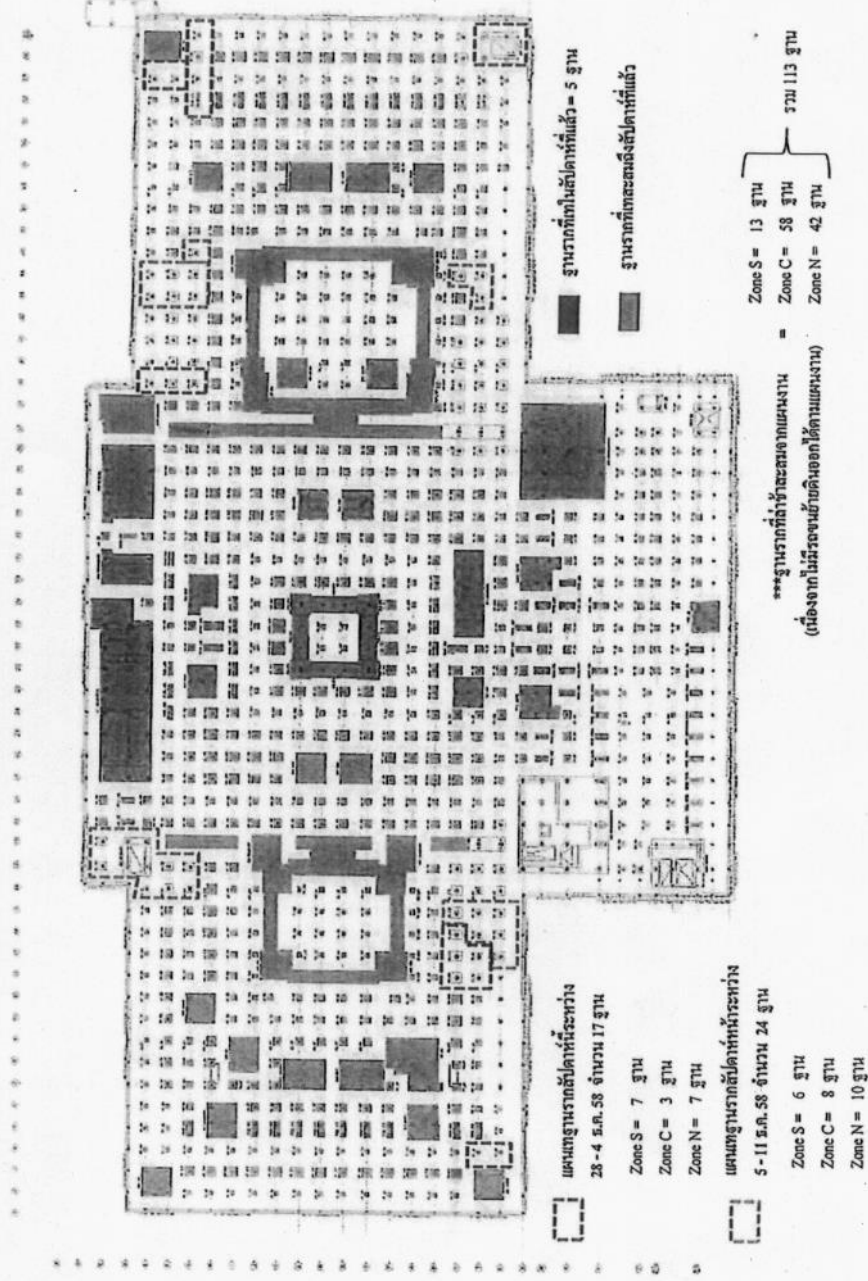

จัดทำฐานรากแล้วเสร็จ 775 ฐาน คงเหลือ 113 ฐาน





ผังความก้าวหน้างานพื้นที่ดิน ชั้น B2

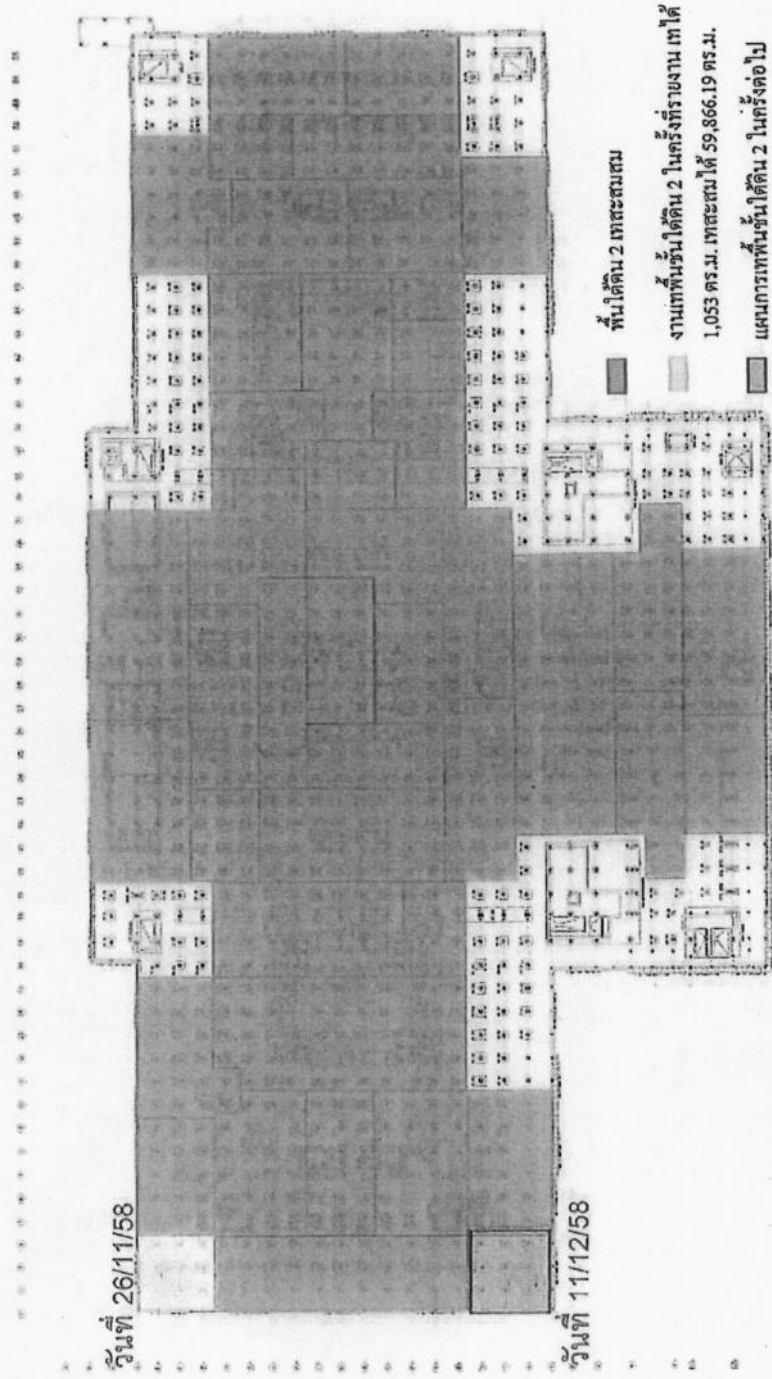

ปัญหาอุปสรรค : - ขนย้ายดินเข้า จึงส่งผลกระทบต่อเรื่องทำให้พื้นที่ดินชั้นกัน

พื้นที่แล้วเสร็จ 59,866 ตร.ม. คงเหลือ 20,134 ตร.ม.




ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

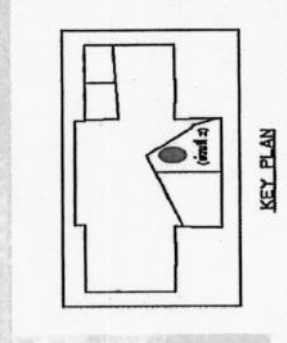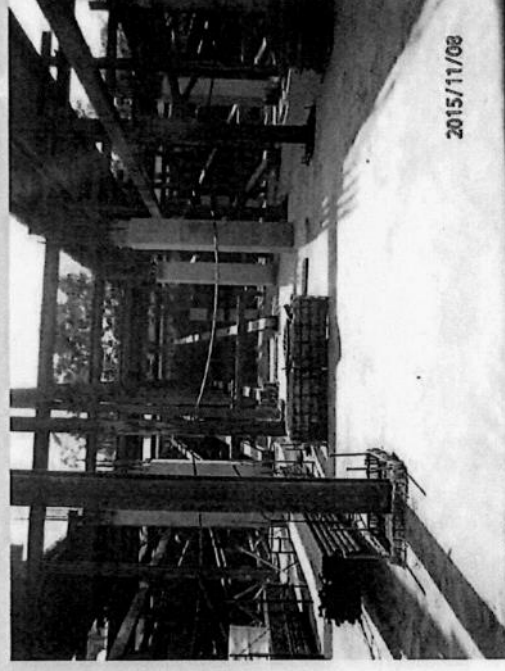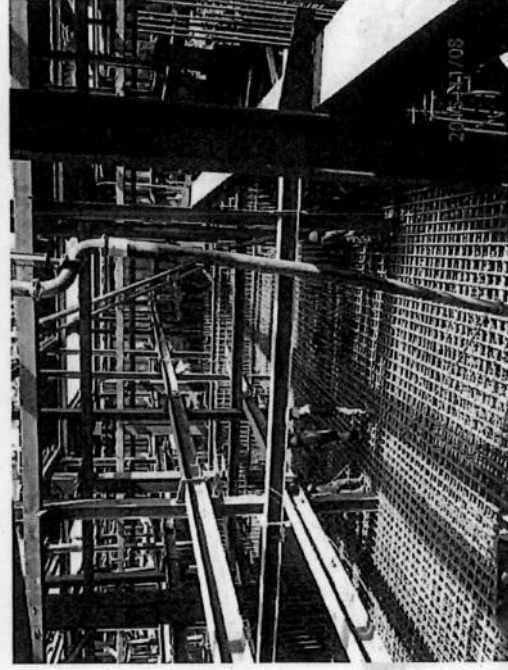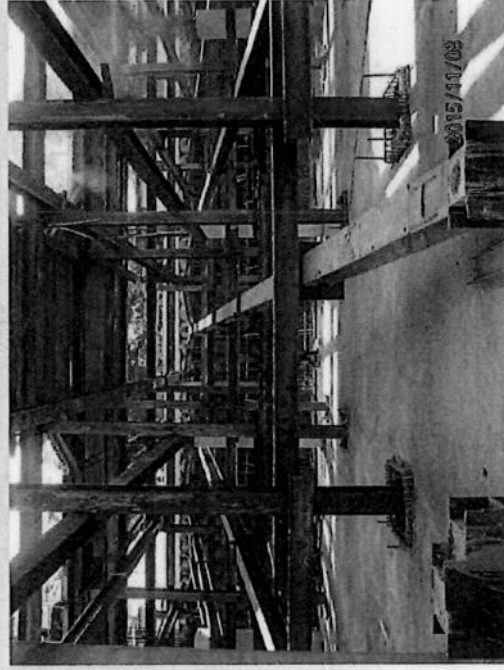

งานก่อสร้างส่วนชั้นใต้ดิน


คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

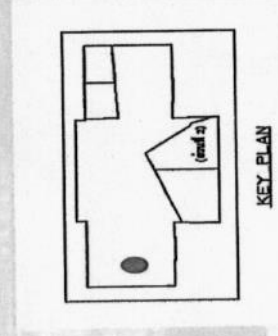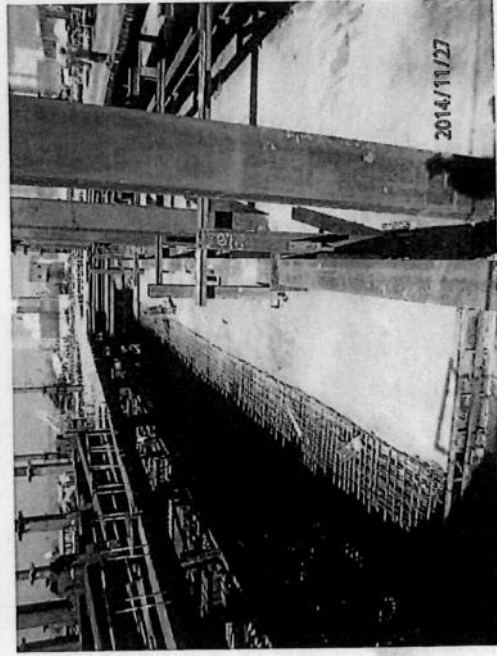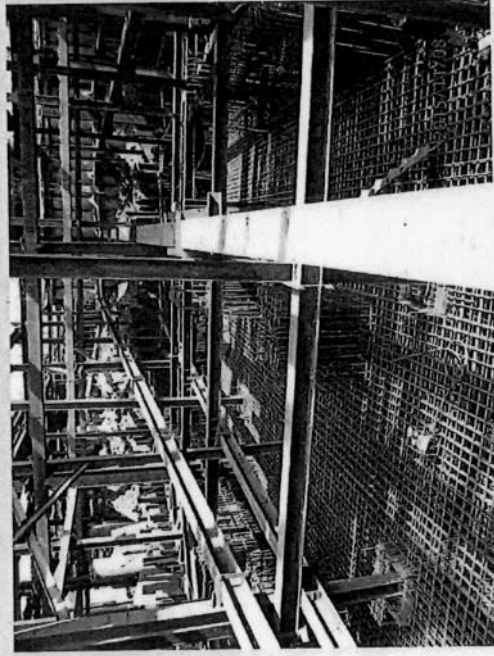


งานจัดทำพื้นที่ B2 และติดตั้งค้ำยันผนังกันดินชั่วคราว

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

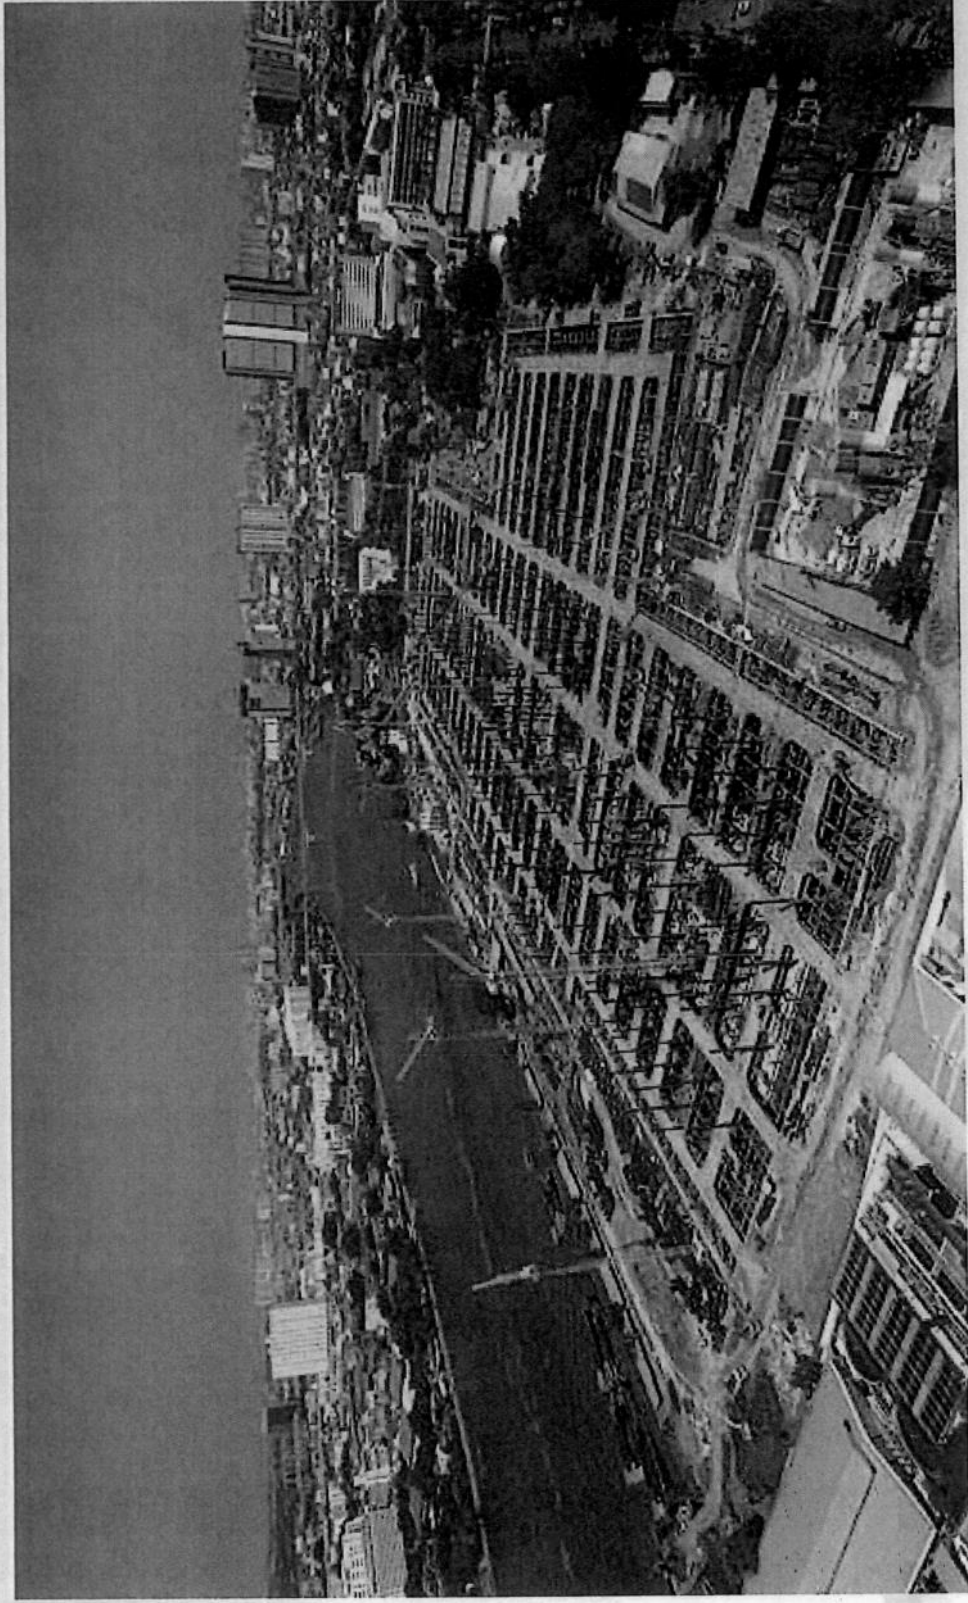

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

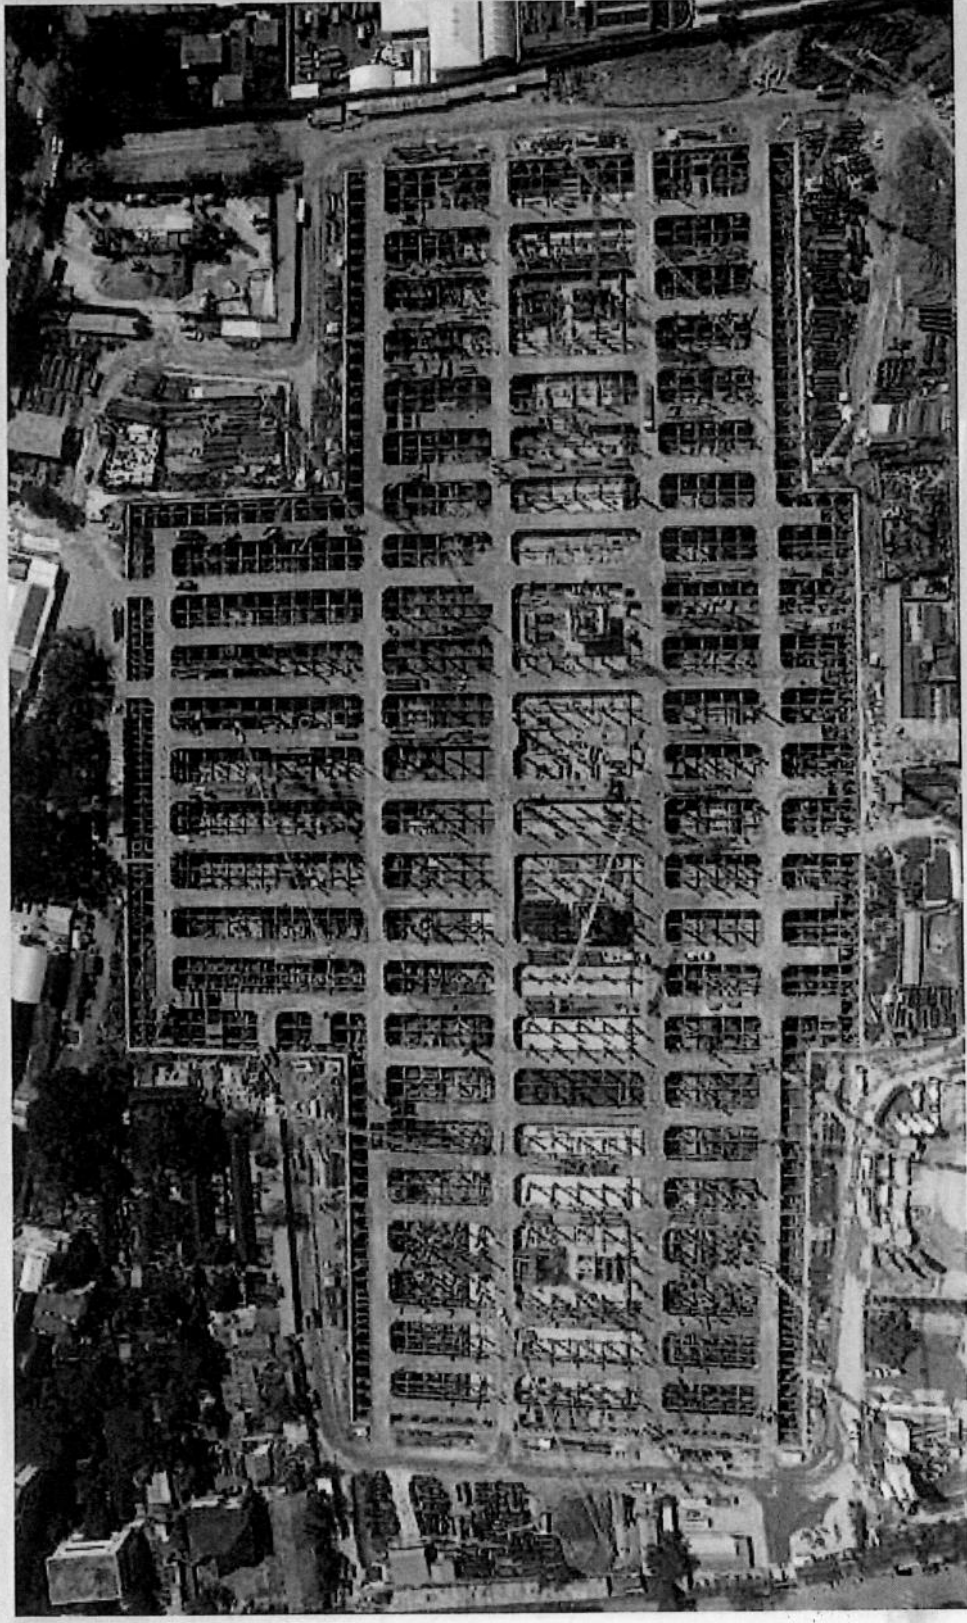

คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
