



ที่ กษ 0308 / ๒๕๕๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

๒๕ เมษายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายละเอียดประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์
จังหวัดระยอง จำนวน 100 ชุด

1. เรื่องเดิม

ลุ่มน้ำประแสร์ เป็นลุ่มน้ำใหญ่อันดับหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำมากกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร มีต้นน้ำจากเทือกเขาในจังหวัดชลบุรี ไหลผ่านอำเภอกันตังและไหลลงทะเลที่ปากน้ำประแสร์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดระยอง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การประมง นอกจากนี้ยังอำนวยประโยชน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าโครงการประแสร์มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาลุ่มน้ำจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งด้านการเพาะปลูก การประมง การบรรเทาอุทกภัย การท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ จึงลงมติอนุมัติให้เปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี (พ.ศ. 2542 - 2547) ซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543-2547 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ในวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ 4,186.52 ล้านบาทสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการ ประมาณ 137,000 ไร่ และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เป็น 8 ปี (พ.ศ. 2543-2550) เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยงบประมาณที่ใช้ยังคงเป็นไปตามวงเงินเดิม คือ 4,186.52 ล้านบาท

2. การดำเนินงาน

1) งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2546 รวมวงเงินภาระผูกพัน 907.50 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.12/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 อายุสัญญา 1,230 วัน เริ่มสัญญา 23 มกราคม 2544 สิ้นสุด 5 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถกักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 771.16 ล้านบาท

2) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 137,000 ไร่ ประกอบด้วย

2.1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ

มติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/8696 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2546 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โดยมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2548 รวมวงเงินภาระผูกพัน 338.84 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.11/2545 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 อายุสัญญา 900 วัน เริ่มสัญญา 26 สิงหาคม 2546 สิ้นสุด 29 กันยายน 2549 ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถสูบน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 331.70 ล้านบาท

2.2) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย

เป็นงานก่อสร้างคลองส่งน้ำาดาคอนกรีต ส่งน้ำโดยระบบแรงโน้มถ่วง ความยาวรวมทั้งสิ้น 23.723 กิโลเมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 54,000 ไร่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย โดยมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 รวมวงเงินภาระผูกพัน 304.50 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.2/2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 อายุสัญญา 720 วัน เริ่มสัญญา 1 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2549 ปัจจุบันงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 207.91 ล้านบาท

/ 2.3) งานก่อสร้าง ...

2.3) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา

เป็นงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เมตร จำนวน 2 แแถว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.40 เมตร จำนวน 1 แถว ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 25.824 กิโลเมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 83,000 ไร่ กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 2 สัญญา ประกอบด้วย

2.3.1) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 1

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 อนุมัติให้กรมชลประทาน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 1 โดยมีระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 รวมวงเงินภาระผูกพัน 852.60 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.3/2548(ฝพพ.3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 อายุสัญญา 750 วัน เริ่มสัญญา 30 เมษายน 2548 สิ้นสุด 19 พฤษภาคม 2550 วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 669.91 ล้านบาท

2.3.2) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 อนุมัติให้กรมชลประทาน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 โดยมีระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 รวมวงเงินภาระผูกพัน 1,108.50 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.4/2549(ฝพพ.3) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 อายุสัญญา 750 วัน เริ่มสัญญา 9 กันยายน 2549 สิ้นสุด 27 กันยายน 2551 วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 1,108.50 ล้านบาท

3. เหตุผลความจำเป็น

1) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2 อายุสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2551 (ปีงบประมาณ 2551) กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543 – 2550) เป็น 9 ปี (พ.ศ. 2543 – 2551) เพื่อให้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ครอบคลุมระยะเวลางานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2

2) เนื่องจากราษฎรในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองได้ยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อขอให้เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์จากการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ทุกกลุ่มน้ำหรือลำคลองย่อยทุกหมู่บ้าน โดยขอให้กรมชลประทานพิจารณาพื้นที่ส่งน้ำของระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวาเพิ่มเติมจากพื้นที่ส่งน้ำเดิมของโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเทียม ตำบลชุมแสง ตำบลป่าขุบ ในเขต

อำเภอวังจันทร์ ร้องขอ และให้พิจารณาข้อร้องขอของราษฎรเขตอำเภอแกลง ที่เสนอให้ส่งน้ำให้คลองวังหว่า คลองสองสสิ่ง ตำบลซากกระโดน กรมชลประทานจึงได้พิจารณาความเหมาะสมและอยู่ระหว่าง ดำเนินการออกแบบรายละเอียด โดยมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม ความยาวรวมประมาณ 30 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 732.90 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานได้เพิ่มขึ้นประมาณ 38,000 ไร่ โดยใช้ งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินเดิม คือ 4,186.52 ล้านบาท


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543-2550) เป็น 12 ปี (พ.ศ. 2543-2554) เพื่อให้ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ฟังขวา สัญญาที่ 2 และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม ทั้งนี้วงเงินค่าก่อสร้างโครงการยังคงเป็นไป ตามวงเงินเดิม คือ 4,186.52 ล้านบาท

4. ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ชลประทานของโครงการ ประแสร์ จังหวัดระยอง จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบการขอขยายระยะเวลา ดำเนินการก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543-2550) เป็น 12 ปี (พ.ศ. 2543- 2554) โดยวงเงินค่าก่อสร้างโครงการยังคงเป็น 4,186.52 ล้านบาท ตามวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ธีระ สุตะบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักโครงการขนาดใหญ่

โทร. 0-2241-1040

โทรสาร. 0-2243-0653




กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง
(ปี พ.ศ. 2543 – 2554)

โครงการประแสร์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สำนักโครงการขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

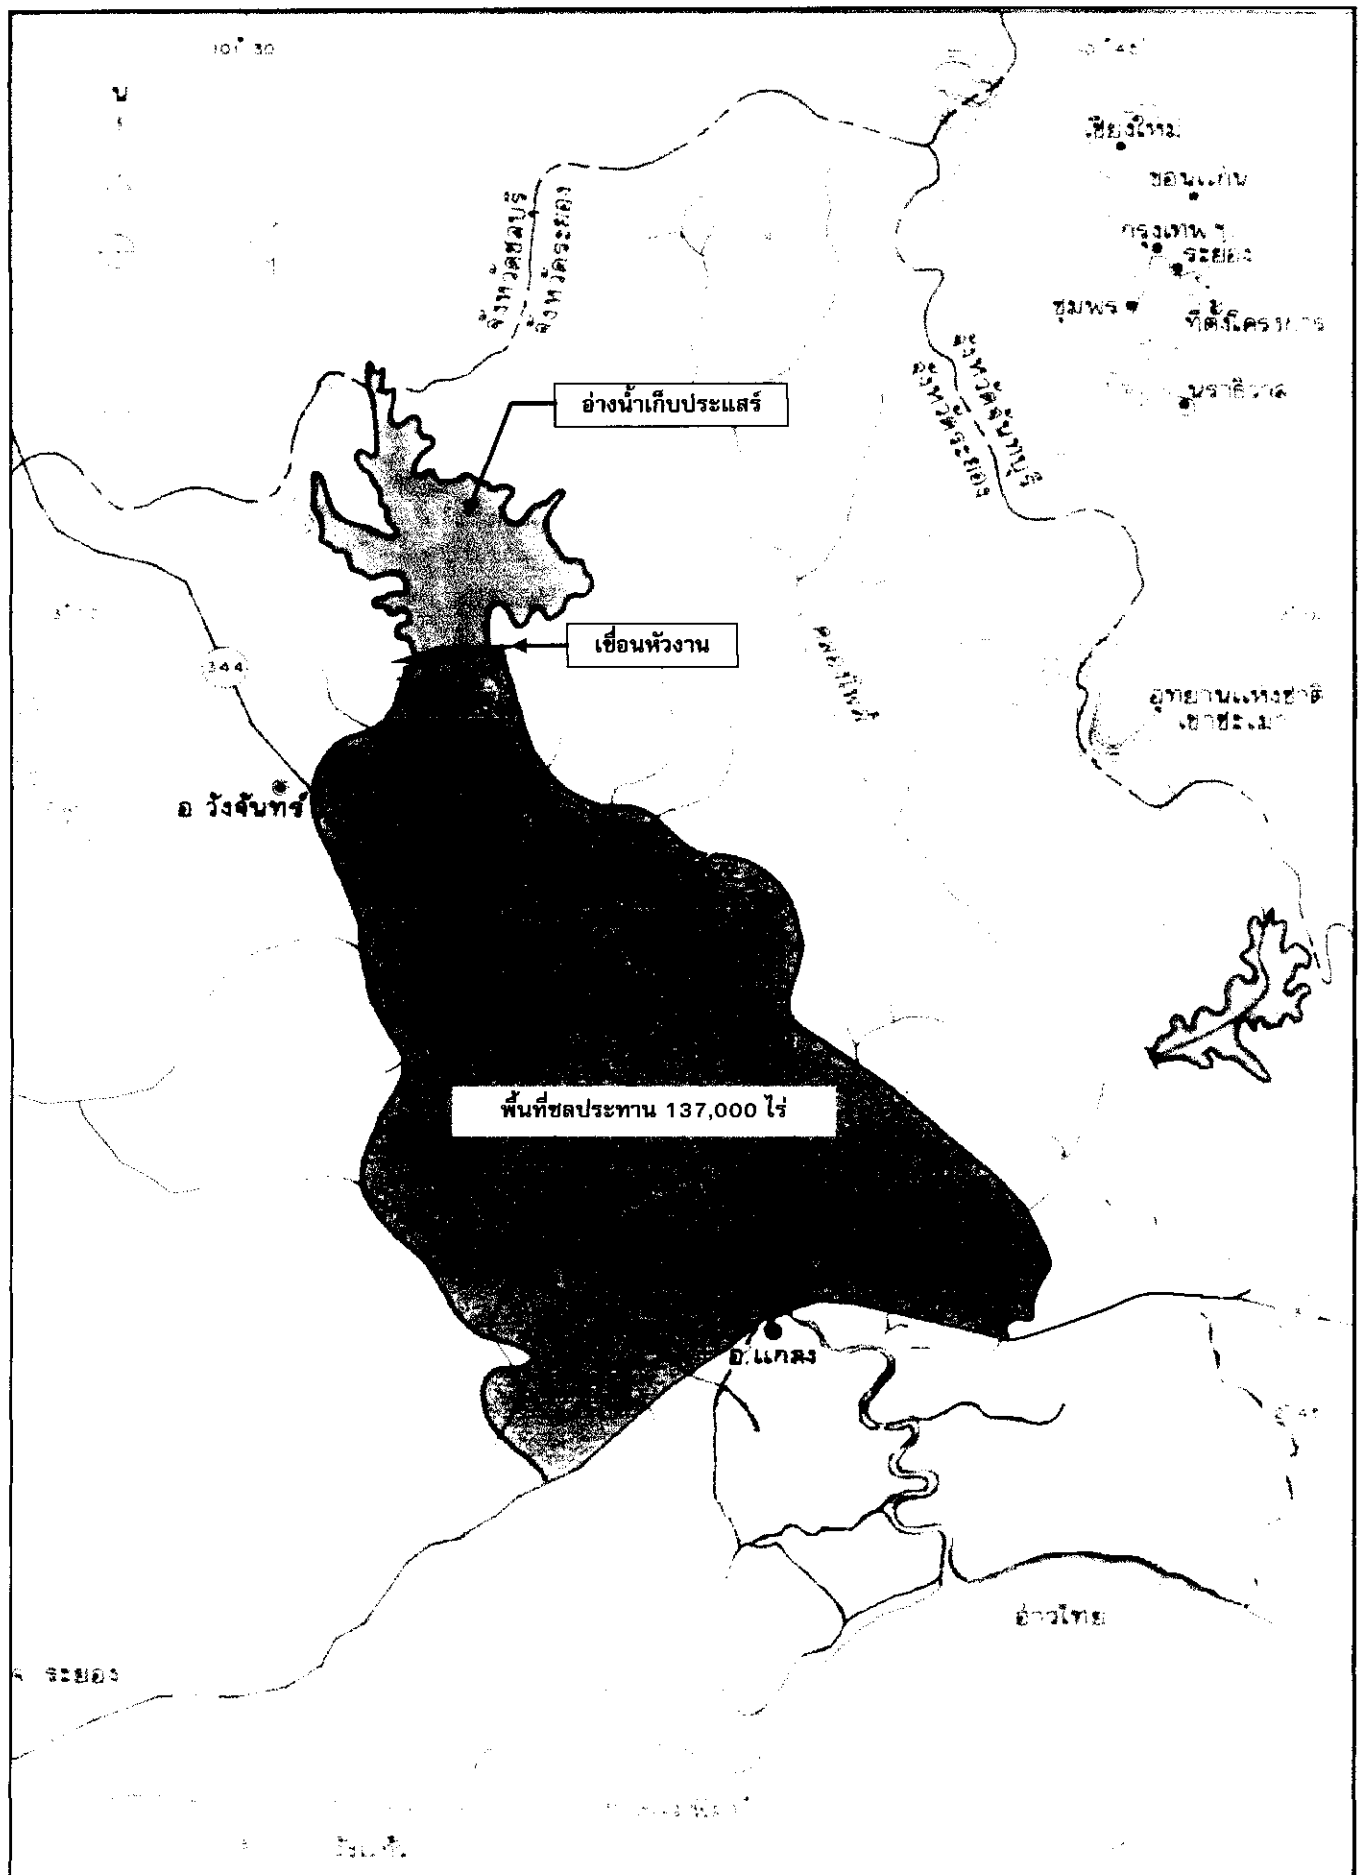

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

สารบัญ

	หน้า
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	
บทที่ 1	บททั่วไป
	1.1 ความเป็นมาโครงการ 1-1
	1.2 สภาพอุทกวิทยา 1-2
	1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1-2
	1.4 ลักษณะของโครงการ 1-2
	1.5 ประโยชน์ของโครงการ 1-4
	1.6 ผลกระทบของโครงการ 1-5
บทที่ 2	ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง
	2.1 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 2-1
	2.2 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง 2-3
	2.3 ภาพแสดงกิจกรรมงานก่อสร้างหลักในเขตพื้นที่โครงการประแสร์ 2-4
	2.4 ภาพแสดงพื้นที่ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม โครงการประแสร์ 2-5
	2.5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 2-6
ภาคผนวก 1	มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก 2	ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

บทที่ 1

บททั่วไป

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ลุ่มน้ำประแสร์ เป็นลุ่มน้ำใหญ่ลุ่มน้ำหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำมากกว่า 1,500 ตร.กม. มีต้นน้ำจากเทือกเขาในจังหวัดชลบุรี ไหลผ่านอำเภอวังจันทร์ และไหลลงทะเลที่ปากน้ำประแสร์ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก อุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การประปา นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน

แม่น้ำประแสร์และลำน้ำสาขาต่างๆ ที่ผ่านมามีการพัฒนาน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,597 มิลลิเมตร แม้จะมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการบ้านกร่ำ โครงการคลองโพธิ์ โครงการพังราด โครงการคลองระลอก และยังมีโครงการขาคูนาพิเศษ และโครงการบ้านหนองแขวน ซึ่งเป็นทำนบกั้นชั่วคราวก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำที่มีมากในฤดูฝนและไหลลงทะเลโดยไม่ได้ถูกนำไปใช้ แต่ในฤดูแล้งราษฎรต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะช่วยเหลือตัวเองโดยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลงของตัวเอง ก็ยังมีขนาดเล็กเกินไปไม่เพียงพอใช้ได้ตลอดในช่วงฤดูแล้ง เพราะการขาดแคลนเขื่อนกักเก็บน้ำ ตลอดจนฝายทดน้ำที่จะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำประแสร์ หรือลำน้ำสาขาต่างๆ ไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็นได้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าโครงการประแสร์มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาลุ่มน้ำจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งด้านการเพาะปลูก การประมง การบรรเทาอุทกภัย การท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ โครงการจึงลงมติอนุมัติให้เปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี พ.ศ.2542 – 2547 ซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543-2547 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ 4,186.52 ล้านบาท ส่งผลให้พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการ 137,000 ไร่

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เป็น 8 ปี (พ.ศ. 2543-2550) เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยงบประมาณที่ใช้ยังคงเป็นไปตามวงเงินเดิม คือ 4,186.52 ล้านบาท

1.2 สภาพอุทกวิทยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเหนือเขื่อน	603	ตารางกิโลเมตร
ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี	1,597	มิลลิเมตร
จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปี	110	วัน
อัตราการระเหยเฉลี่ยตลอดปี	1,821	มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำท่าไหลเข้าอ่างฯ เฉลี่ยตลอดปี	294.5	ล้าน ลูกบาศก์เมตร
อัตราการไหลในรอบ 1,000 ปี	623.2	ลูกบาศก์เมตร / วินาที

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำ และส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภोजันทร กิ่งอำเภอเขาชะเมาและอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อประโยชน์สำหรับการประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ และเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. เพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
5. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มในลำน้ำประแสร์
6. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ
7. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง

1.4 ลักษณะโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในเขตบริเวณบ้านแก่งหวาย ท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภोजันทร จังหวัดระยอง โดยห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ไปทางตะวันออก ณ เส้นรุ้ง $12^{\circ} - 55' - 43''$ เหนือ และเส้นแวงที่ $101^{\circ} - 34' - 10''$ ตะวันออก พิกัด 47PQQ777358 ของแผนที่มาตราส่วน 1 : 50000 5334 IV

ลักษณะโครงการ

เป็นเขื่อนดินทำหน้าที่เก็บกักน้ำ ความจุอ่างเก็บน้ำ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายโดยอาศัยระบบแรงโน้มถ่วง (GRAVITY) ความยาวทั้งสิ้น 23.723 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ 54,000 ไร่ และส่งน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.40 – 1.60 เมตร ความยาวทั้งสิ้น 25.824 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ 83,000 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้นประมาณ 137,000 ไร่

(1) เขื่อนหลัก (Main Dam)

- เป็นเขื่อนดินแบบ Zone Type ระดับสันเขื่อน +39 ม.รทก. ความสูง 24.00 เมตร ความยาว 2,500 เมตร

(2) เขื่อนปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam)

- เป็นเขื่อนดินแบบ Zone Type ระดับสันเขื่อน +39 ม.รทก. ความสูง 7.00 เมตร ความยาว 1,600 เมตร

(3) อาคารระบายน้ำล้น (Spillway)

- มีลักษณะเป็นฝายสันโค้ง รางเปิดไม่มีประตูบังคับน้ำ (Uncontrolled Overflow Ogee weir) ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด 296.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

(4) อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

- อาคารท่อน้ำลงน้ำเดิมตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำประแสร์มีหน้าที่ระบายน้ำในระหว่างก่อสร้าง และปล่อยน้ำลงลำน้ำเดิมด้านท้ายน้ำสำหรับรักษาสภาพลำน้ำประแสร์ เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็ม และช่วยระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำในกรณีมีอุทกภัย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ 3.00 เมตร ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด 85.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

(5) อาคารท่อน้ำฝั่งซ้าย (Irrigation Outlet)

- อาคารท่อน้ำฝั่งซ้ายตั้งอยู่บริเวณ Abutment ฝั่งซ้ายของเขื่อนหลัก มีหน้าที่ในการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ 1.50 เมตร ความสามารถในการระบายน้ำ 8.76 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับธรณีปลายท่อน้ำอยู่ที่ระดับ +24.00 ม.รทก. เพื่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายต่อไป

(6) ระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทานรวม 137,000 ไร่ แบ่งเป็น

- ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ส่งน้ำโดยระบบแรงโน้มถ่วงด้วยคลองคาคอนกรีตความยาวรวมทั้งสิ้น 23.723 กม. ขนาดความจุคลองประมาณ 8.76 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่
- ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ส่งน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เมตร 2 แถว และ 1.40 เมตร 1 แถว รวม 3 แถว ความยาวรวมทั้งสิ้น 25.824 กม. ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อส่งน้ำประมาณ 10.50 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 83,000 ไร่

(7) ระบบระบายน้ำ

- พื้นที่โครงการประเสริฐมีลักษณะเป็นลูกเนินสูงต่ำ มีความลาดชันค่อนข้างสูง มีลำน้ำสาขาของแม่น้ำประเสริฐไหลผ่านพื้นที่ ประกอบกับการเกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการปลูกไม้ผลและยางพารา ดังนั้นการระบายน้ำในพื้นที่ชลประทานจึงใช้ลำนํ้าธรรมชาติ โดยไม่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างระบบระบายน้ำ

1.5 ประโยชน์ของโครงการ

1. เป็นแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำและส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานที่จะเกิดขึ้นใหม่ในเขตอำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเมา และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. เป็นแหล่งส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลทางเกวียน เทศบาลทุ่งควายกิน เทศบาลสุนทรภู่ เทศบาลปากน้ำประแสร์ เป็นปริมาณ 21,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
3. ส่งน้ำให้พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งในบริเวณปากน้ำประแสร์ได้ประมาณ 7,200 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำ 114,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
4. ช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
5. ผลักดันน้ำเค็มที่หนุนเข้ามาในแม่น้ำประเสริฐในช่วงฤดูแล้ง
6. อ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่
7. เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
8. ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดระยองขยายตัวมากขึ้น

1.6 ผลกระทบของโครงการ

1. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 30,483 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 28,929 ไร่ ทำให้ต้องอพยพรายธูรจำนวนทั้งสิ้น 647 ราย
2. เส้นทางคมนาคมในพื้นที่อ่างเก็บน้ำจะถูกน้ำท่วม 35.20 กิโลเมตร
3. สูญเสียพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม 605 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่จะต้องสูญเสียน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่างเก็บน้ำ

บทที่ 2
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง

2.1 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

2.1.1 งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2546 รวมวงเงินภาระผูกพัน 907.50 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.12/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 อายุ สัญญา 1,230 วัน เริ่มสัญญา 23 มกราคม 2544 สิ้นสุด 5 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถกักเก็บน้ำได้ตาม วัตถุประสงค์ โดยใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 771.16 ล้านบาท

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ครอบคลุม พื้นที่ 137,000 ไร่ ประกอบด้วย งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบและงานก่อสร้างระบบส่ง น้ำฝักข้ายซึ่งทั้งสองงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะที่ยังมีงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝักข้ายอยู่ระหว่าง ดำเนินการ

1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ

มติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/8696 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2546 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2548 รวม วงเงินภาระผูกพัน 338.84 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.11/2545 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 อายุสัญญา 900 วัน เริ่มสัญญา 26 สิงหาคม 2546 สิ้นสุด 29 กันยายน 2549

ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถสูบน้ำได้ตาม วัตถุประสงค์ โดยใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 331.70 ล้านบาท

2) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย

ลักษณะงานเป็นงานก่อสร้างคลองส่งน้ำลาดคอนกรีต ส่งน้ำโดยระบบแรงโน้มถ่วง ความยาวรวมทั้งสิ้น 23.723 กิโลเมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 54,000 ไร่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย โดยมีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 รวมวงเงินภาระผูกพัน 304.50 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ. 2/2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 อายุสัญญา 720 วัน เริ่มสัญญา 1 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2549 ปัจจุบันงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 207.91 ล้านบาท

2.1.2 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ

1) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา

เป็นงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เมตร จำนวน 2 แถว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.40 เมตร จำนวน 1 แถว ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 25.824 กิโลเมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ 83,000 ไร่ กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 2 สัญญา ประกอบด้วย

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 1

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 1 โดยมีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 รวมวงเงินภาระผูกพัน 852.60 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.3/2548(ฝพพ.3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 อายุสัญญา 750 วัน เริ่มสัญญา 30 เมษายน 2548 สิ้นสุด 19 พฤษภาคม 2550 วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 669.91 ล้านบาท ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ได้ผลงาน 74.17 %

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่งขวา สัญญาที่ 2


คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่งขวา สัญญาที่ 2 โดยมีระยะเวลาก่อนหน้าผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 รวมวงเงินภาระผูกพัน 1,108.50 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ กจ.4/2549(ฝพพ.3) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 อายุสัญญา 750 วัน เริ่มสัญญา 9 กันยายน 2549 สิ้นสุด 27 กันยายน 2551 วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 1,108.50 ล้านบาท ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ได้ผลงาน 10.19 %

2.2 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง

1) เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่งขวา สัญญาที่ 2 อายุสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2551 (ปีงบประมาณ 2551) กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543 – 2550) เป็น 9 ปี (พ.ศ. 2543 – 2551) เพื่อให้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ครอบคลุมระยะเวลางานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่งขวา สัญญาที่ 2

2) เนื่องจากราษฎรในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองได้ยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อขอให้เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์จากการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ทุกกลุ่มน้ำหรือลำคลองย่อยทุกหมู่บ้าน โดยขอให้กรมชลประทานพิจารณาพื้นที่ส่งน้ำของระบบท่อส่งน้ำฝ่งขวาเพิ่มเติมจากพื้นที่ส่งน้ำเดิมของโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม ตำบลชุมแสง ตำบลป่ายุบ ในเขตอำเภอวังจันทร์ ร้องขอ และให้พิจารณาข้อร้องขอของราษฎรเขตอำเภอแกลง ที่เสนอให้ส่งน้ำให้คลองวังหว่า คลองสองสึง ตำบลซากกระโดน กรมชลประทานจึงได้พิจารณาความเหมาะสมและอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบรายละเอียด โดยมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม ความยาวรวมประมาณ 30 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 732.90 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานได้เพิ่มขึ้นประมาณ 38,000 ไร่ โดยใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินเดิม คือ 4,186.52 ล้านบาท

กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543-2550) เป็น 12 ปี (พ.ศ. 2543-2554) เพื่อให้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ครอบคลุมระยะเวลางานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำ ฝ่งขวา สัญญาที่ 2 และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม ทั้งนี้วงเงินค่าก่อสร้างโครงการยังคงเป็นไปตามวงเงินเดิม คือ 4,186.52 ล้านบาท

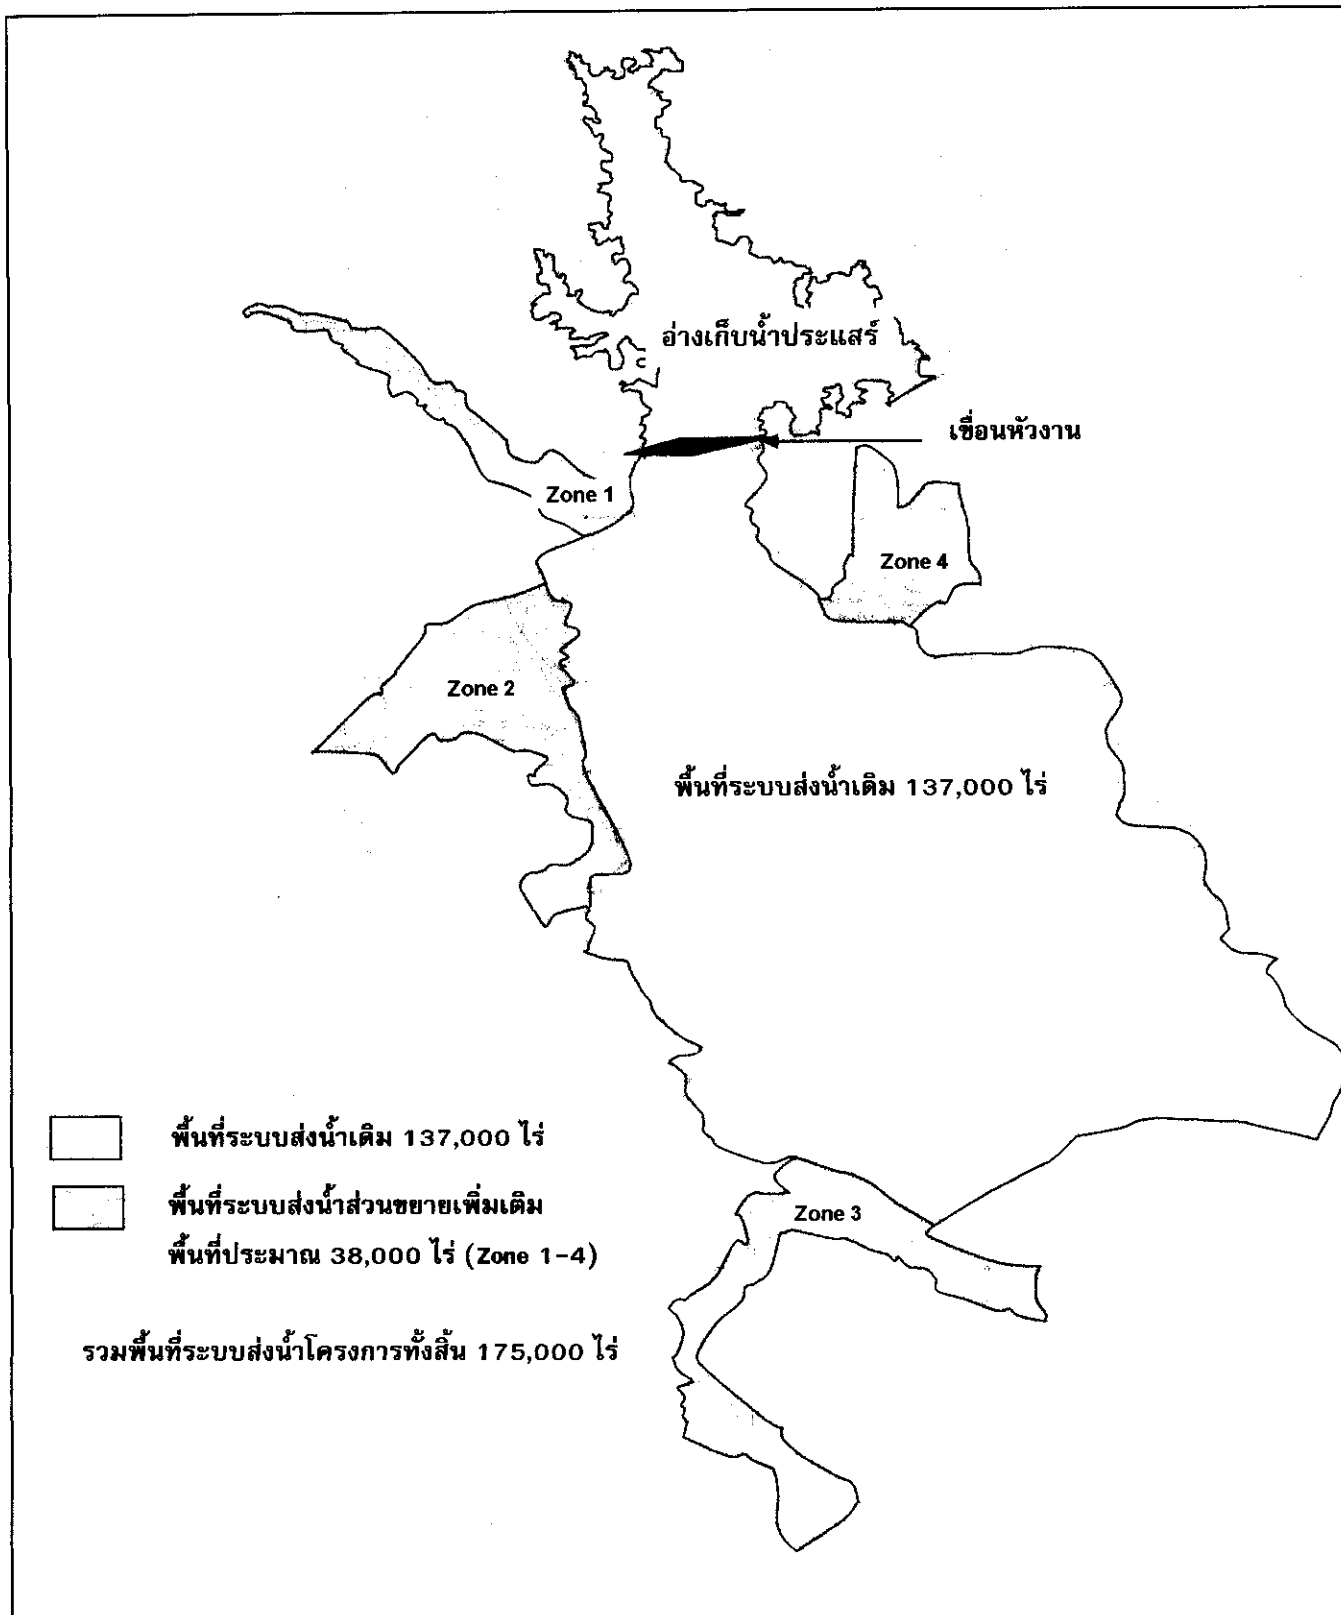

ภาพแสดงพื้นที่ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม โครงการประแสร์

แผนการใช้งบประมาณก่อสร้างโครงการประแสร์
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 12 ปี (2543 - 2554)

ราคาโครงการ 4,186,520,000 บาท
พื้นที่ชลประทาน 175,000 ไร่

โครงการ ประแสร์
จังหวัดระยอง

ลำดับ ที่	รายการ / งาน	งบประมาณ รวม(บาท)	ปีงบประมาณ (บาท)												หมายเหตุ
			ปี 2543	ปี 2544	ปี 2545	ปี 2546	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	
1	งบบุคลากร	123,983,800	-	-	-	11,582,000	10,423,800	13,000,000	13,000,000	15,195,600	15,195,600	15,195,600	15,195,600	15,195,600	
1.1	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,983,800	-	-	-	11,582,000	10,423,800	13,000,000	13,000,000	15,195,600	15,195,600	15,195,600	15,195,600	15,195,600	
1.2	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	งบดำเนินการ	17,028,500	462,500	694,100	543,700	513,200	527,700	1,111,500	1,251,000	1,611,300	2,578,400	2,578,400	2,578,400	2,578,300	
2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	11,899,400	381,300	304,900	259,400	207,500	207,500	881,300	881,300	1,204,600	1,892,900	1,892,900	1,892,900	1,892,900	
2.1.1	ค่าบริหาร	11,899,400	381,300	304,900	259,400	207,500	207,500	881,300	881,300	1,204,600	1,892,900	1,892,900	1,892,900	1,892,900	
2.1.2	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	5,129,100	81,200	389,200	284,300	305,700	320,200	230,200	369,700	406,700	685,500	685,500	685,500	685,400	
3	งบลงทุน	4,045,507,700	179,438,900	27,208,600	150,287,400	556,668,200	197,647,200	418,298,100	538,061,900	513,031,600	730,967,500	252,838,100	250,466,400	230,593,800	
3.1	ค่าครุภัณฑ์	3,137,900	1,842,900	-	-	-	-	1,295,000	-	-	-	-	-	-	
3.2	ค่าที่ดิน - สิ่งก่อสร้าง	4,042,369,800	177,596,000	27,208,600	150,287,400	556,668,200	197,647,200	417,003,100	538,061,900	513,031,600	730,967,500	252,838,100	250,466,400	230,593,800	
3.2.1	ค่าสิ่งก่อสร้าง	4,042,369,800	177,596,000	27,208,600	150,287,400	556,668,200	197,647,200	417,003,100	538,061,900	513,031,600	730,967,500	252,838,100	250,466,400	230,593,800	
3.2.1.1	ค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.1.2	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	150,009,100	12,596,000	2,000,000	-	68,816,700	-	65,596,400	-	-	-	-	-	1,000,000	
	(1) ที่ทำการและบ้านพักโรงเรียนชั่วคราว	6,046,100	6,046,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(2) ระบบไฟฟ้า - กระจายภายในบริเวณหัวงาน	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(3) ส้อมรีบบริเวณหัวงาน , ป้อนขามประตูทางเข้า	666,600	666,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(4) ถนนภายในบริเวณหัวงาน	2,398,000	2,398,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(5) ทางปรับพื้นที่บริเวณหัวงาน	3,485,300	3,485,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(6) งานก่อสร้างถนนรอบอ่าง	92,842,100	-	-	-	30,000,000	-	62,842,100	-	-	-	-	-	-	
	(7) ค่าขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าขยายเขตไฟฟ้าไปยังอาคารสถานีสูบน้ำ	39,228,900	-	-	-	36,474,600	-	2,754,300	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าขยายเขตไฟฟ้าไปยังอาคารท่อส่งลงลำน้ำเดิมและท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย	2,342,100	-	-	-	2,342,100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(8) ค่าปีนโครงการ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
3.2.1.3	ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง	383,800	-	-	-	-	-	-	107,000	276,800	-	-	-	-	
	(1) บูรณะสิ่งก่อสร้าง	227,000	-	-	-	-	-	-	107,000	120,000	-	-	-	-	
	(2) บูรณะถนน	156,800	-	-	-	-	-	-	-	156,800	-	-	-	-	
3.2.1.4	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,891,976,900	165,000,000	25,208,600	150,287,400	487,851,500	197,647,200	351,406,700	537,954,900	512,754,800	730,967,500	252,838,100	250,466,400	229,593,800	
	(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	789,704,500	165,000,000	25,208,600	103,637,400	438,607,700	57,250,800	-	-	-	-	-	-	-	
	(2) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ	2,369,374,100	-	-	46,650,000	49,243,800	140,396,400	351,406,700	537,954,900	512,754,800	730,967,500	-	-	-	
	(3) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำส่วนขยาย	732,898,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,838,100	250,466,400	229,593,800	
	รวมค่าก่อสร้าง	4,186,520,000	179,901,400	27,902,700	150,831,100	568,763,400	208,598,700	432,409,600	552,312,900	529,838,500	748,741,500	270,612,100	268,240,400	248,367,700	
	รวมค่าก่อสร้างสะสม	4,186,520,000	179,901,400	207,804,100	358,435,200	927,398,600	1,135,997,300	1,568,406,900	2,120,719,800	2,650,558,300	3,399,299,800	3,669,911,900	3,938,152,300	4,186,520,000	

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดำเนินการขอคณะกรรมการชดเชยระยะเวลาดำเนินการจากเดิม 8 ปี (พ.ศ. 2543-2550) เป็น 12 ปี (พ.ศ. 2543-2554) จึงจะทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานขึ้นอีกประมาณ 38,000 ไร่ รวมเป็น 175,000 ไร่

1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ นร 0205/5654 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2541
เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
2. หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0712.04/1243 ลงวันที่ 22 เมษายน 2541
เรื่องแจ้งข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
3. หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ค่วนมาก ที่ วว 0804/4546
ลงวันที่ 21 เมษายน 2541 เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0214.4/5288 ลงวันที่ 20 เมษายน 2541
เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
5. หนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนมาก ที่ นร 0412/7191 ลงวันที่ 20 เมษายน 2541
เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/7979 ลงวันที่ 7 เมษายน 2541
เรื่องการขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ นร 1003/1387
ลงวันที่ 3 เมษายน 2541 เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
8. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนมาก ที่ กค 0526.7/41842 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2540
เรื่องการขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
9. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ นร 1003/4789
ลงวันที่ 23 กันยายน 2540 เรื่องโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
10. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0214.4/14070 ลงวันที่ 18 กันยายน 2540
เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
11. หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0712.04/3735 ลงวันที่ 15 กันยายน 2540
เรื่องข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

12. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ค่วนมาก ที่ นร 0412/33772 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540
เรื่องขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
13. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่ วว 0802/7014
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2540 เรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
14. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/7297 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
เรื่องขอขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ)
15. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/5930 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
เรื่องขอขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ)
16. หนังสือสำนักงานงบประมาณที่ นร 0705/220 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2547
เรื่องขอขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ)
17. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค่วนที่สุด ที่
นร 1105/1005 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547 เรื่องขอขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ)

ที่ นร ๐๒๐๔/๕๖๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๗๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๒๔/๑๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่ กค ๐๕๒๖.๓/๓๕๑๔

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๔.๔/๕๒๔๘

ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คำนวณ

ที่ วว ๐๔๐๔/๕๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑

๔. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๓๐๒.๐๔/๑๒๔๓

ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ คำนวณที่ นร ๐๔๑๒/๓๑๔๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑

๖. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๘๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑

ตามที่ได้อธิบายเรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ไปเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้อธิบายความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า
โครงการประแสร์มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ จะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งด้านการเพาะปลูก การประมง การบรรเทา

/อุทกภัย ...

อุทกภัย การท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ แต่โดยที่โครงการดังกล่าวมีวงเงินลงทุนสูง นอกจากนี้ยังมีการผูกพันที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากติดต่อกันไปอีกหลายปี ประกอบกับกรมชลประทานมีการผูกพันงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้แล้วหลายโครงการ จึงลงมติอนุมัติให้เปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง และอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาตัดทอน ขะลอ หรือยกเลิกงาน/โครงการอื่น ๆ ที่มีลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนต่ำ หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว เพื่อรองรับภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดโครงการดังกล่าวตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณด้วย

อนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ตามข้อมูลจากผู้แทนกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติม โครงการนี้มีบริเวณพื้นที่ถูกเขตนชลประทาน (เขตน้ำท่วม) จำนวน ๗๒๓ แปลง รวม ๒๕,๕๔๗ ไร่ เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๑๕ ไร่ ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่มีเอกสารสิทธิ) จำนวน ๕๐๐ แปลง เนื้อที่ ๑๙,๓๕๕ ไร่ และที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (ไม่มีเอกสารสิทธิ) จำนวน ๒๑๖ แปลง เนื้อที่ ๑๐,๑๒๗ ไร่ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน กรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิในราคาไร่ละ ๘๕,๐๐๐ บาท และกรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกแปลง ประมาณการค่าชดเชย (ค่าที่ดินและค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและต้นผลไม้) รวมแล้วเป็นเงินประมาณ ๕,๑๓๐ ล้านบาท นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และสำนักงานงบประมาณ รับไปตรวจสอบและดำเนินการให้ละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตด้วย


จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ท่าน้ำถูกต้อง



(นายชลิต ดำรงศักดิ์)
ผส.พน.4

ขอแสดงความนับถือ



(นายเพศล เสงเจริญ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐๕๒๒๕๐๖ โทรสาร ๐๕๑๐๖๒๔

ที่	๑๕๕๐
วันที่	๑๖ มิ.ย. ๕๑
เวลา	๑๖.๐๗

เรียน ปลัดกระทรวงฯ
เพื่อโปรดดำเนินการ



(นายวิทยา คุญปณฺธิ์)

เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ศธ 0712.04/1140



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๒๑ เมษายน 2541

เรื่อง แจ้งข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการประเสริฐ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ความว่า ศธ 0205/3295 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ ศธ 0712.04/3735 ลงวันที่ 15 กันยายน 2540 ✓

ความหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันจะเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประเสริฐ จังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาดำเนินการต่อไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป ดังความ แจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาสภาพปัญหาผลกระทบด้านสาธารณสุข และมาตรการในการลดผลกระทบด้านสาธารณสุขแล้ว ยืนยันตามข้อคิดเห็นเดิมที่ได้เสนอให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีทราบแล้ว ความหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ ศธ 0712.04/3735 ลงวันที่ 15 กันยายน 2540 ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นายชลิต ดำรงศักดิ์)

ผส.พน.4

กรมอนามัย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร. 5904348

โทรสาร 5918187

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระวัฒน์ คีรวัสส์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ราชอาณาจักรไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง

ช.อิมพ

(นายอิมพ บุญจักษ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วนมาก

ที่ วา 0804/ 4546



กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

๒/ เมษายน 2541

เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือเลขที่การคณะกรรมการ ค่วนมาก ที่ นร 0205/3294 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางสรุปแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบ โครงการ
ประแสร์ จังหวัดระยอง ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วา 0804/7014 ✓
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการ
ประแสร์ จังหวัดระยอง และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาคำความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบการศึกษาของคณะกรรมการ ความละเอียด
แจ้งแล้วนี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเรียนว่า เนื่องจากโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เป็น
โครงการอ่างเก็บน้ำที่เข้าข่ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณารายงานตามที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
จัดทำขึ้น ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2540 วันที่ 24 เมษายน 2540 และมีมติเห็นชอบกับรายงาน
ดังกล่าวโดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ให้กรมชลประทานดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานแก้ไข
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการ รายละเอียดตามเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

2. เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวง แต่ราษฎรที่ครอบครองพื้นที่บางส่วนมิได้สมัครเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ฯ จึงอาจมีปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่าเช่า และ เป็นปัญหาต่อเนื้อที่ระหว่างผู้ที่อพยพเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้ที่อยู่เดิม ดังนั้น จึงให้กรมชลประทานรับไป ดำเนินการปรับแก้แผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับการอพยพราษฎรไปยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาทาง ปฏิบัติต่อราษฎรที่จะอพยพเข้าไป ทั้งในช่วงดำเนินการก่อสร้างและในอนาคต

3. ให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อ ประเมินการติดตามตรวจสอบต่อไป


กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบแล้ว รายละเอียด ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย (2)

ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีความเห็นว่า การอนุมัติเปิดโครงการประแสร์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยเฉพาะเรื่องแผนปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดให้กรมชลประทานปรับแผนการอพยพราษฎร ไปยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติต่อราษฎรที่จะอพยพเข้าไป ทั้งในช่วงดำเนินการ ก่อสร้างและในอนาคตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)
ผส.พ.น.4

ขอแสดงความนับถือ

(นายยี่หันธ์ มนะสิการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2723055, 2799703
โทรสาร. 2723055, 2713226

ที่ มท 0214.4/ 5288



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท 10200

26 เมษายน 2541

เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมากที่ นร. 0205/3293 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0214.4/14070 ลงวันที่ 18 กันยายน 2540 ✓

ตามที่ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นเรื่อง การขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วขอยืนยันความเห็นเดิมที่เห็นชอบกับการเปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยองเนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประปา การท่องเที่ยว และสามารถควบคุมปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ตลอดปี สำหรับราษฎรที่จะต้องอพยพจากพื้นที่ที่สามารถอพยพได้ทันทีเมื่อได้รับเงินชดเชยจากทางราชการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(สนั่น ขจรประศาสน์)

สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผน

โทร.โทรสาร 2227821

สำเนาถูกต้อง

007

(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)
ผส.พน.4

ด่วนมาก

ที่ นร 0412/ 7191

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

20 เมษายน 2541

เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/3296 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0412/33772 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 ✓

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันที่จะขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง โดยขอปรับเปลี่ยนปีงบประมาณดำเนินการ จากเดิมเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 สรุปได้ ดังนี้

1. ขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง โครงการประแสร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - 2547 งบประมาณโครงการ 4,186.52 ล้านบาท
 2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประแสร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - 2551 งบประมาณโครงการ 4,830.32 ล้านบาท
 3. ขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการให้แก่กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวงเงิน งบประมาณของแผนงานก่อสร้างและแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 9,016.84 ล้านบาท
- ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของราษฎรเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรสำหรับพื้นที่ในเขตโครงการได้ประมาณ 137,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการประปา การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันการรุกรานของน้ำเค็มในลำน้ำประแสร์ จึงจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน สมควรที่จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาเสนอความเห็นไว้แล้วตามหนังสือที่อ้างถึง 2

แต่โดยที่...

แต่โดยที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินการคลัง การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจำเป็นต้องประหยัดและควรเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับแผนที่ในปฏิญญาภายใต้ข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวงเงินลงทุนสูงในขณะที่มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากติดต่อกันไปอีกหลายปี ประกอบกับ กรมชลประทานมีภาระผูกพันงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้อยู่หลายโครงการด้วยกัน ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะต้องเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ตามแผนงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ก็สมควรที่จะปรับแผนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาตัดทอน ชะลอ หรือยกเลิกงาน/โครงการอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีลำดับ ความสำคัญและความเร่งด่วนต่ำ หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันลง เพื่อรองรับภาระผูกพัน งบประมาณแผ่นดินที่เพิ่มขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เปิดโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ

โทร. 2739892

โทรสาร 2739457

ควนทีลัด

ที่ กค 0526.7/9479



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

7 เมษายน 2541

เรื่อง การขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/3292
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0526.7/41842
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2540 ✓

ตามที่แจ้งว่า กระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง 2 เนื่องจาก
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ยื่นข้อขอให้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักเลขาธิการคณะ-
รัฐมนตรีจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 3 เมษายน 2541
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงหรือประเด็นปัญหาต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมไปจากเดิม
ดังนั้น จึงยังคงยืนยันตามความเห็นเดิมดังที่แจ้งถึงผู้จัดพิมพ์หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่อ้างถึง 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเกล้าฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา
ต่อไปด้วย จักขอขอบคุณ

ท่านนายกรัฐมนตรี

(นายชวลิต ดำรงศักดิ์)

พล.พณ.4

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง 1

ส่วนอนุมัติพิเศษ

โทร. 2739024 ต่อ 4463



3 เมษายน 2541

เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตัวนมาก ที่ นร 0205/3297
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2541
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ นร 1003/4739 ลงวันที่ 23 กันยายน 2540 ✓
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตัวนมาก ที่ นร 0205/ว(ส) 10808
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540


ตามที่หนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องขออนุมัติเปิดโครงการ
ประแสร์ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความ
เห็นว่า ข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าวทั้งหมด ยกเว้นระยะเวลาดำเนินการ
จากเดิมเริ่มในปีงบประมาณ 2541 เลื่อนเป็นปีงบประมาณ 2542 ทำให้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
เลื่อนจากปีงบประมาณ 2541 - 2546 เป็นปีงบประมาณ 2542 - 2547 และระยะเวลาดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลื่อนจากปีงบประมาณ
2541 - 2550 เป็นปีงบประมาณ 2542 - 2551 นั้น ส่วนข้อเสนออื่นๆ เป็นข้อเสนอเช่นเดียวกับที่ได้
เสนอมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในครั้งแรก ตามหนังสืออ้างถึง 3 และสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ตามหนังสืออ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเสนอว่าเพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการดำเนินโครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค
การป้องกันโรคตัวขนาน้ำเค็ม บรรเทาอุทกภัย และพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่โครงการมากที่สุด
จึงขอขอร้องยืนยันความเห็นตามที่ได้เสนอไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ วัฒนกิจธรรม)


เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองโครงการเศรษฐกิจ

โทร. 282 - 2811

กฎหมาย

ที่ กค 0526.7/41842



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท.

๒ ธันวาคม 2540

เรื่อง การขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/15108

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2540

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
เรื่อง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ดังนี้

1. ขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2541 - 2546 งบประมาณโครงการ 4,186.52 ล้านบาท

2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันภัยและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการประแสร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 - 2550 งบประมาณ
4,830.32 ล้านบาท

3. ให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการให้แก่
กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตร-
และสหกรณ์ ในวงเงินงบประมาณของแผนงานก่อสร้างและแผนปฏิบัติการป้องกันภัย
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 9,016.84 ล้านบาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
16 กันยายน 2540 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร
0205/ว 197 ลงวันที่ 19 กันยายน 2540 เรื่อง นโยบายและมาตรการในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ

/ภายใต้ ...

ภายใต้ข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมาตรการที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ มาตรการฟื้นฟูด้านการเงิน การสร้างวินัยทางการคลัง โดยการจัดหารายได้และความคุ้มครองรายจ่ายของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และสภาพปัญหาปัจจุบันด้านการคลังได้มีการปรับลดเงินงบประมาณและชะลอการจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้ดุลเงินสดเป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงไว้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2541 หรืออาจถึงปี พ.ศ. 2542 อย่างจริงจัง ดังนั้น สำหรับกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จำเป็นต้องผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2541 - 2550 ประมาณ 9,016.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงมาก ทำให้เป็นการกระทบกับเงินงบประมาณ ฉะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการคลังและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรชะลอการขอเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ดังกล่าวไปก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
จึงขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายนิมิตร นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

ส่วนอนุมัติพิเศษ

โทร. 2739024 ต่อ 4463



๕๓ กันยายน ๒๕๔๐

เรื่อง โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว(ล) 10808
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๔๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง โครงการประแสร์ จังหวัด
ระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดังนี้

1. เห็นควรสนับสนุนในหลักการโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เนื่องจาก


1.1 การดำเนินงานตามหลักการของโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง มีความสอด
คล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ทั้งในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำสนองความต้องการของประชาชนโดยให้มี
กลไกในการกำกับ ดูแล และประสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำในหลายระดับ และในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่ให้สมบูรณ์ ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อ
สนับสนุนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค และการสร้างฐานการผลิต ให้ได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง โดยการพัฒนาแหล่งน้ำดิบขนาดต่างๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ำและ
ระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่

1.2 โครงการมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ซึ่งมีแผนปฏิบัติการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการครอบคลุมการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการไว้อย่างครบถ้วน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว

2. สำนักงานฯ ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คือ เนื่องจากโครงการฯ นี้ ใช้เงินลงทุนสูงถึง 9,016.84 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการจึงควรมีการวางระบบการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่าต่อการลงทุนให้มากที่สุด ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับฐานะการเงิน การคลังของประเทศในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




(นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณบดี

ที่ มท 0214.4/ 14070



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอังสฤงศ์ กท 10200

18 กันยายน 2540

เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวนที่ นร 0205/ว (ล) 10808

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540

ตามที่ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นเรื่อง การขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับการเปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำ ประแสร์ จังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นโครงการที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กรรม อุตสาหกรรม การประปา การท่องเที่ยว และสามารถควบคุมปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้ง และในช่วง ฤดูฝนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ตลอดปี สำหรับราษฎรที่จะต้องอพยพจากพื้นที่ที่สามารถอพยพได้ทันทีเมื่อได้ รับเงินชดเชยจากทางราชการ ทั้งนี้ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว นั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงดำเนินการและในอนาคต อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายเสนาะ เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผน

โทร/โทรสาร 2227821



ที่ ศธ 0712.04/3735

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๑ 15 กันยายน 2540

เรื่อง - ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ค่วนมาก ที่ นร 0205/ว (ก) 10808
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งรายละเอียดของโครงการ
ประแสร์ไปกระทรวงสาธารณสุข เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น
ในรื่องนี้ได้รับพิจารณาแล้วมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ปัญหาสาธารณสุข ที่พบในเขตพื้นที่อำเภอวังจันทร์และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ซึ่งพื้นที่นี้รับประโยชน์จากโครงการประแสร์ พบปัญหาจากโรคไข้มาเลเรีย และโรคอุจจาระร่วงมี
อัตราป่วยก่อนข้างสูงกว่าอำเภออื่น และในเขตอำเภอวังจันทร์มีบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขไม่
เพียงพอ

2. ผลกระทบด้านสาธารณสุข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนประแสร์
คือ การเพิ่มขึ้นของโรคมาเลเรียในพื้นที่สวนยาง โรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ และโรคพยาธิใบไม้
ในตับ เนื่องจากพบหอยที่เป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ชลประทาน ส่วนโรคอุจจาระร่วงอาจลดลง เนื่องจากมีน้ำ
สะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ ทั้งนี้จะขึ้นกับสุขวิทยาส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

3. มาตรการในการลดผลกระทบด้านสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

3.1 ระยะก่อสร้าง จะเน้นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้มาเลเรียใน
กลุ่มคนงานก่อสร้าง จัดระบบการเฝ้าระวังโรคและการตรวจสุขภาพคนงานโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งการ
จัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณก่อสร้างให้ออกสู่สาธารณะ

3.2 ระยะดำเนินงาน จะเน้นการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาเลเรีย ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ โรคพยาธิใบไม้ในตับ เพื่อระวังคุณภาพน้ำและกำจัดของเสียในชุมชน การจัดระบบสุขภาพที่อยู่อาศัยให้อุทิศสู่ลักษณะ


4. มาตรการในการติดตามตรวจสอบทางด้านสาธารณสุข จะเน้นการติดตามและเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการ เก็บข้อมูลทางระบาดวิทยา ติดตามสำรวจทางด้านสาธารณสุข ในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำประแสร์และคลองสาขา

ข้อพิจารณา

พิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติการลดผลกระทบ ทางด้านสาธารณสุขจากการก่อสร้างเขื่อนประแสร์แล้ว เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ในการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบทางด้านสาธารณสุข สามารถรองรับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนประแสร์ และมีความเหมาะสมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ นงนุช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร. 5904348

โทรสาร 5918187

ความเรียง

ที่ นร 0412/ 33772

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400.

25 สิงหาคม 2540

เรื่อง ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0205/ว (ล) 10808 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขออนุมัติเปิดโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ดังนี้

1. ขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง โครงการประแสร์ ในปีงบประมาณ 2541 - 2546
งบประมาณโครงการ 4,186.52 ล้านบาท
2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการประแสร์ ในปีงบประมาณ 2541 - 2550 งบประมาณโครงการ 4,830.32 ล้านบาท
3. ขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการให้แก่กรมชลประทาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวงเงินงบประมาณ
ของแผนงานก่อสร้างและแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวม 9,016.84 ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

1. โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง เป็นโครงการซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสร็จแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยแล้ว โดยเมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำ
ให้กับพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 137,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการประปา

/การทอ้งเทียว...

การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันการรุกรานของน้ำเค็มในลำน้ำประแสร์ ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก จากผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2538 ใช้ค่าลงทุนทั้งสิ้น 6,214.58 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 17.57 ถึงแม้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับค่าลงทุนทั้งสิ้นของโครงการเพิ่มขึ้นและเสนอขออนุมัติเปิดโครงการในครั้งนี้อยู่ในวงเงิน 9,016.84 ล้านบาท ทำให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ลดลงเหลือเท่ากับร้อยละ 12.66 ก็ยังจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนพอสมควร จึงเห็นควรได้รับการสนับสนุน

2. โดยที่โครงการประแสร์มีวงเงินลงทุนสูง จึงขอเรียนข้อสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่สมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน ดำเนินการในรายละเอียด ดังต่อไปนี้


2.1 เนื่องจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ของโครงการโดยเฉพาะเมื่อมีการปรับค่าลงทุนเพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ อยู่ในเกณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก จึงเห็นสมควรที่กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเร่งรัดดำเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และระมัดระวังมิให้ค่าใช้จ่ายของโครงการและระยะเวลาดำเนินการขยายเพิ่มขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

2.2 รายการใดที่สามารถดำเนินการโดยวิธีการจ้างเหมาได้ ก็เห็นสมควรให้ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมาให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร หากจำเป็นต้องดำเนินการโดยการทำเอง ก็ควรให้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และจะเสียหายแก่ราชการ

2.3 ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบของโครงการประแสร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน เห็นควรให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ส่วนราชการนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้ชื่อโครงการเดียวกัน คือ โครงการประแสร์

3. สำหรับการจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบโครงการประแสร์ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 จำนวน 14.43 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2540 จำนวน 4.063 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2541 จำนวน 7.93 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 26.425 ล้านบาท ส่วนงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จักได้จัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนงานหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปิดโครงการแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริ สุขสงพอร)


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ

โทร. 2739882

โทรสาร 2739457

ว ๐๖๐๒/๗๐๑๔



สำนักงานนโยบายและแผนศึกษา
ขอรับพิจารณา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๑๘/วป๑๖ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมของรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณานำเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๔๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง โดยให้กรมชลประทานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรีบไปดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกี่ยวกับ
การอพยพราษฎรไปยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อมิให้เกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงานที่จะอพยพ
เข้าไป ทั้งในช่วงดำเนินการก่อสร้างและในอนาคต และให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

124 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี

โทรศัพท์ ๐๖๖-๒๖๖๖๖๖๖ โทรสาร ๐๖๖-๒๖๖๖๖๖๖

ที่ นร ๐๕๐๔/ ๗๒๙๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐^{16๐๗}

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (๕ โครงการ)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๒๐๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๔.๔/๕๕๓๐
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๕/๑๐๐๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๕/๒๒๐
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (๕ โครงการ)
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สำนักงบประมาณ ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕.๒ (ฝ่ายการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน
กรรมการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

๑. ประเด็นอภิปราย

๑.๑ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคลองสิียด ว่า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๖ ปี
(พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๒) ออกไปอีก ๓ ปี รวมเป็น ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๕) ในปัจจุบันยังมี

/ งานก่อสร้าง ...

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำตอนท่าลาด ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีปัญหาด้านการจัดหาที่ดิน รวมทั้งมีการแก้ไขและเพิ่มเติมอาคารในคลองส่งน้ำจำนวนมากให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน โดยงานก่อสร้างตามสัญญาคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงปี ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งโครงการ ๑๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๒)

๑.๒ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า การขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานบางโครงการ เนื่องจากใช้เวลานานทำให้สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้ต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น เช่น ภาคเอกชนได้มาประกอบธุรกิจในบริเวณรอบโครงการ การกระจายน้ำควรให้ทั่วถึงโดยส่งน้ำให้เกษตรกรเป็นเป้าหมายหลัก ดังนั้น การขอขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานควรคำนึงถึงพื้นที่โดยรอบของโครงการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายหลักก่อน

๑.๓ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เห็นชอบกับเหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในเขตจังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อประเมินผลโครงการ ฯ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ การจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบน้ำใต้ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและเศรษฐศาสตร์การเงิน และการประเมินด้านการประมง คาดว่ารายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรใช้รายงานผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๔ กระทรวงการคลังมีข้อสังเกตว่า ในการจัดทำโครงการก่อสร้างทุกโครงการ ส่วนราชการควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในโครงการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ การเตรียมแบบการก่อสร้าง การประสานงานจัดเตรียมพื้นที่ หรือการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการดำเนินโครงการล่าช้าหรือผู้รับจ้างทำงานส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า รวมถึงจะช่วยลดปัญหาในการที่ผู้รับจ้างนำสาเหตุความไม่พร้อมดังกล่าวมาตั้งเป็นเหตุผลในการขอลดหรือคืนค่าปรับจากการทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายด้วย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0504/7297

วันที่ 25 พฤษภาคม 2547

เรื่อง ขอยกยาระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ)

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ) คือ โครงการประแสร์ โครงการคลองสียัด โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ตามที่เสนอ โดยได้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาคำเนินการ และให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ที่ขอขยาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งกรมชลประทานทราบและดำเนินการต่อไป

2/2
3 เม.ย.

(นายบุญน้อม อุนเกษม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดำเนินการตามเสนอ

(นายบุญชู สัตตาสัตุนะ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

- 7 ส.ป. 2547

ที่ กษ 0201.10/ว 1603

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



7 มิ.ย. 47

(นายประพันธ์ พุทธากิบาล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขอยยาระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
(๔ โครงการ) ให้ทราบดังนี้

.....

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ
๔. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๘.๔/ ๕๕๓๐



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (๔ โครงการ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว (ล) ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กรณียการขอย้ายระยะเวลาขอสั่งสร้างโครงการขนาดใหญ่ ๔ โครงการ คือ โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง โครงการคลองสิียด จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่าสภาพปัญหาของโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ต้องมีการจัดหาที่ดินจากรายการ และมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินที่ใช้ไปจากเดิม และมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบบางรายการ โครงการคลองสิียด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาในการแก้ไขเพิ่มเติมแบบอาคารส่งน้ำจำนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก มีปัญหาพื้นที่ส่งน้ำเป็นคลองส่งน้ำเดิมซึ่งจะต้องส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรของระบบส่งน้ำเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ให้มีผลกระทบกับการทำเกษตรกรรม และโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี มีปัญหาเนื่องจากมีงานก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงไม่อาจดำเนินการให้ทันภายในระยะเวลาตามแผนงานของโครงการลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าปัญหาทั้ง ๔ โครงการ เป็นปัญหาอันเกิดจากส่วนราชการ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาขยายเวลาก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวได้


/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจริง และอยู่ในอำนาจที่คณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติได้

อนึ่ง กระทรวงการคลังมีข้อสังเกตว่า ในการจัดทำโครงการทุกโครงการ ส่วนราชการ ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในโครงการก่อสร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินโครงการ การเตรียมแบบการก่อสร้าง การประสานงานจัดเตรียมพื้นที่ หรือการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการดำเนินโครงการล่าช้าหรือผู้รับจ้างทำงาน ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า รวมถึงจะช่วยลดปัญหาในการที่ผู้รับจ้างนำสาเหตุความไม่พร้อม ดังกล่าวมาตั้งเป็นเหตุผลในการขอลดหรือคืนค่าปรับจากการทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นของกระทรวงการคลังต่อคณะกรรมการ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคลัง

(นายอมรศักดิ์ กิจหาณิชย์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙๐,

กรมบัญชีกลาง

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

โทร ๐๒ ๒๖๑๐๘๐๑๑

โทรสาร ๐๒ ๖๑๑๐๔๕

ที่ นร 0705/ ๒๒๐

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

๘ มีนาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (๔ โครงการ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0504/ว (ล) 2902

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับเรื่องที่ยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผนการดำเนินงานและการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗) เพิ่มขึ้นเป็น ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐) งบประมาณโครงการในวงเงินเดิม ๔,๑๘๖.๕๒ ล้านบาท

๒. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างโครงการคลองสี่ชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๖) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๒) งบประมาณโครงการในวงเงินเดิม ๔,๐๑๖ ล้านบาท

๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก จากเดิม ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐) งบประมาณโครงการในวงเงินเดิม ๑๐,๑๙๓ ล้านบาท

๔. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี จากเดิม ๑๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๙) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๑) งบประมาณโครงการในวงเงินเดิม ๗,๘๓๑ ล้านบาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง 4 โครงการ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาใช้ในแหล่งชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ปรับแผนการดำเนินงานและขยายระยะเวลาก่อสร้างของทั้ง 4 โครงการ ดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติ

2. สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายเวลาออกไปของทั้ง 4 โครงการ ดังกล่าวนั้น เห็นควรให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างต่อไป ภายในวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเดิมของแต่ละโครงการ

อนึ่ง สำนักงานประมาณใคร่ขอเรียนว่า การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจะมีผลต่อการขอและอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับบางโครงการ ดังนั้น กรมชลประทานจะต้องพิจารณาผลกระทบของการขยายระยะเวลาของสัญญา โดยมีให้ทางราชการเสียประโยชน์จากการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการผลิตและสร้างรายได้

โทร. 0 2273 9912 หรือ 0 2273 9448

โทรสาร 0 2273 9457



/๐ มีนาคม 2547

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว(ล) 2902 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ (4 โครงการ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

1. เห็นควรสนับสนุนการปรับแผนงาน และการขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ เนื่องจากโครงการเมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยให้ราษฎรในหลายพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตลอดปี และลดปัญหาอุทกภัย รวมทั้งบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ และเป็นการขยายพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำในโครงการไปสู่เกษตรกรในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับการขยายระยะเวลาของโครงการดังกล่าวไม่เป็นภาระของงบประมาณรายจ่าย

2. เพื่อให้โครงการทั้ง 4 โครงการมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็จตามกำหนด จึงควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการดังต่อไปนี้


2.1 ควรมีการจัดทำรายละเอียดการปรับแผนดำเนินโครงการ และการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเตรียมความพร้อมด้านที่ดิน รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าชดเชยแก่เกษตรกรในกรณีที่มีการใช้ที่ดินของเกษตรกรจากการขยายพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งในอนาคต

2.2 สำหรับโครงการก่อสร้างที่ยังมีการดำเนินการอยู่ ควรทำความเข้าใจกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการเรียกร้องค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น รวมทั้งควรมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตประกอบอย่างรอบคอบด้วย เช่น สภาวะเงินเฟ้อ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

2.3 จัดการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชน และ
ชุมชนในการขยายโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตรณณ์ ฝาสักานิช)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อำนาจศักดิ์



(นายอมรศักดิ์ กิจหาญชัย)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 810

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. 02-282-0811


โทรสาร. 02-281-1821

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2547




ภาพอ่างเก็บน้ำประแสร์

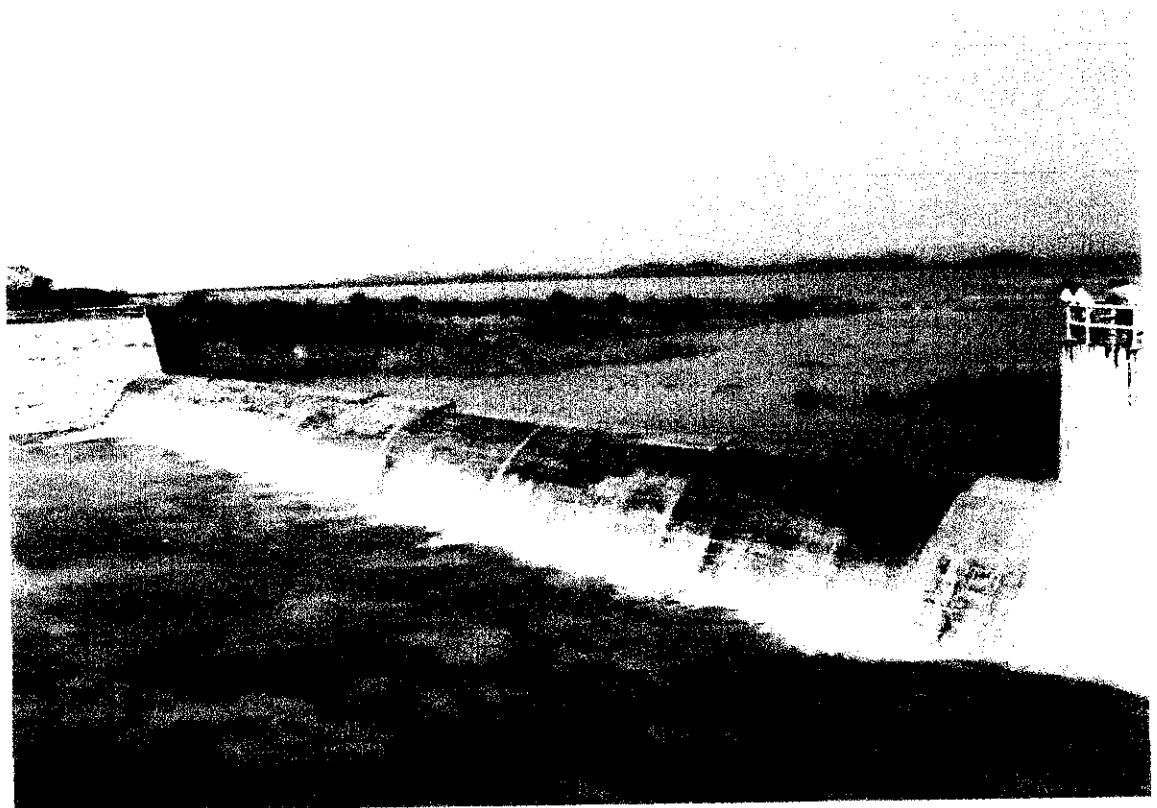


ภาพอ่างเก็บน้ำประแสร์

งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

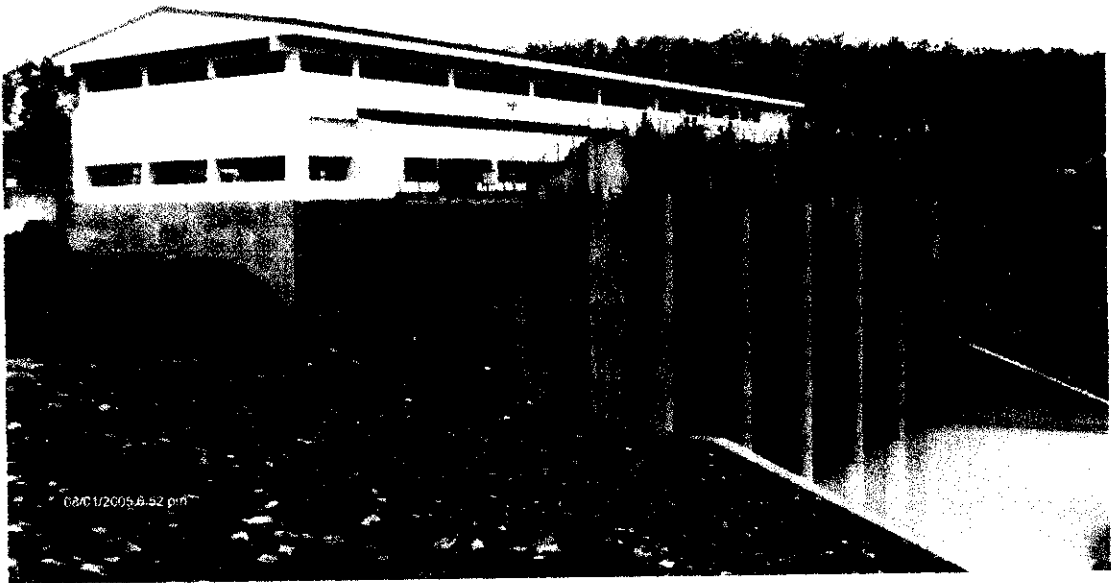


ภาพอาคารสถานีสูบน้ำ

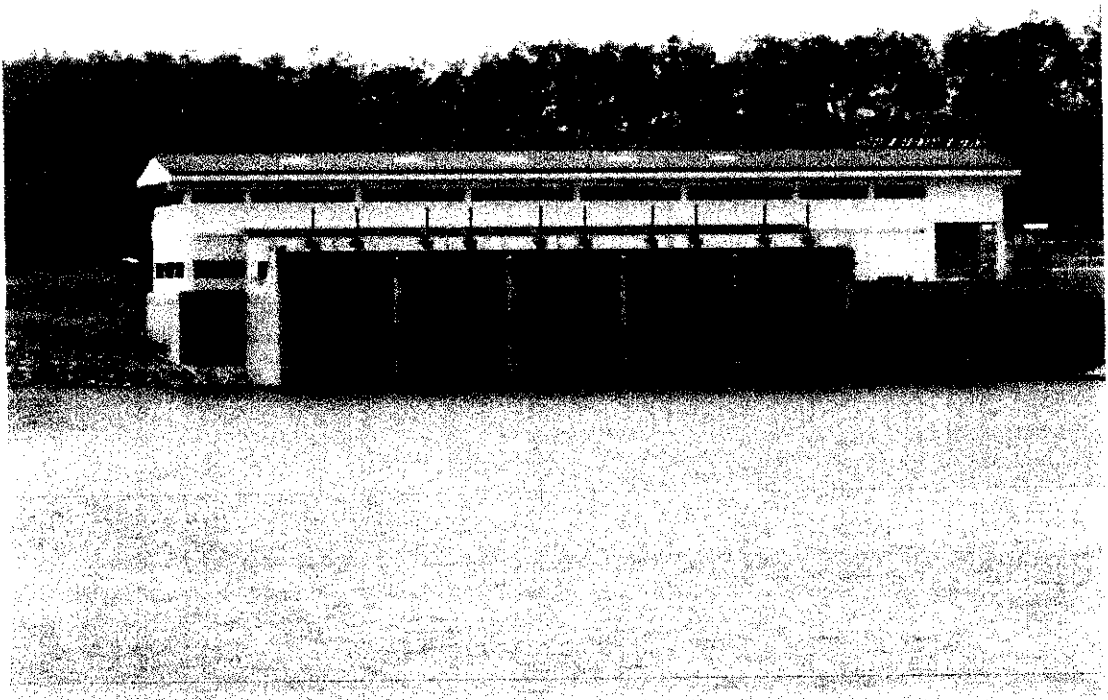


ภาพอาคารสถานีสูบน้ำ

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่งซ้าย (คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่งซ้ายและอาคารประกอบ)
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549

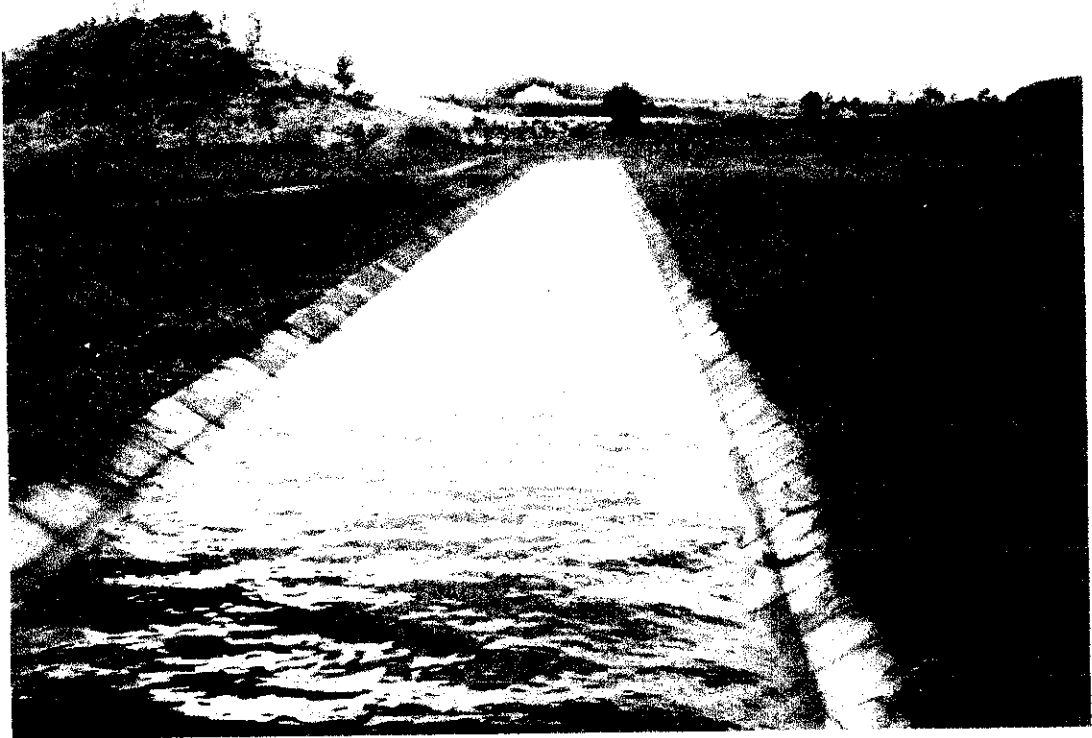

ภาพคลองส่งน้ำฝ่งซ้าย

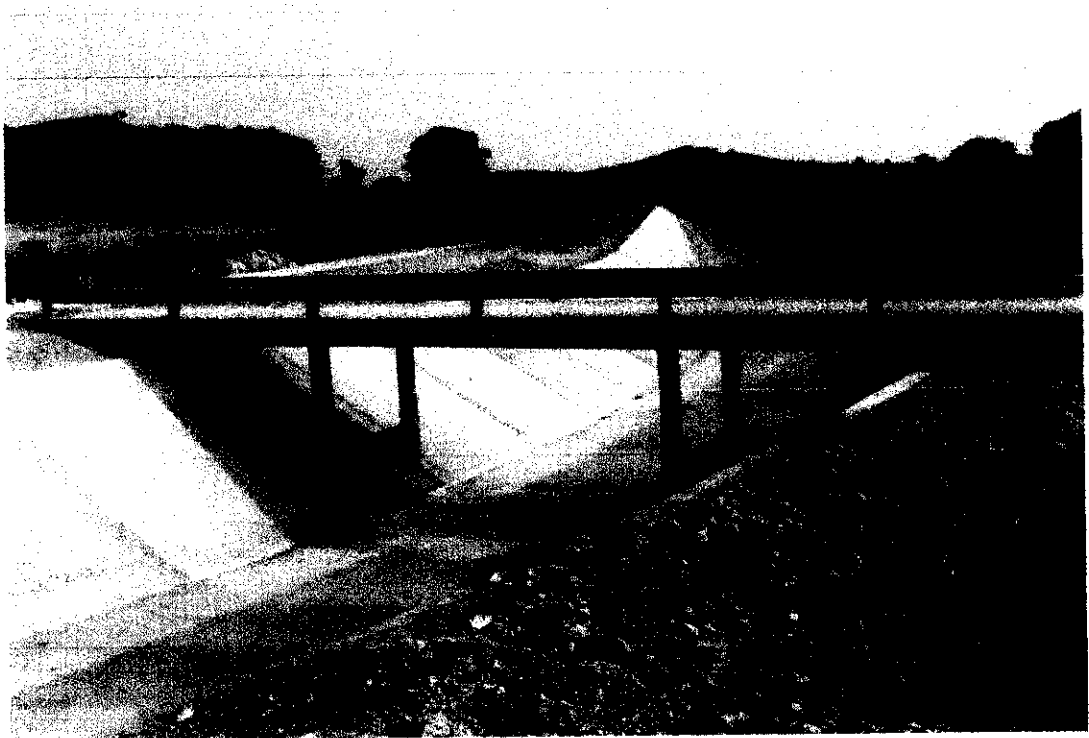

ภาพคลองส่งน้ำฝ่งซ้าย

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ท่อส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 1)

ความยาวรวมทั้งสิ้น 8.00 กิโลเมตร ตามสัญญาเลขที่ กจ.3/2548 (ฟพพ.3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548
วงเงินตามสัญญาทั้งสิ้น 669,908,805.- บาท อายุสัญญา 750 วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2548
และจะสิ้นสุดอายุสัญญา วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 ผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า เอส จี-บางแสน-บี.เอส.
(ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง)



ภาพงานก่อสร้างท่อส่งน้ำ



ภาพงานก่อสร้างท่อส่งน้ำ

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ท่อส่งน้ำฝั่งขวา สัญญาที่ 2)

ความยาวรวมทั้งสิ้น 17.824 กิโลเมตร ตามสัญญาเลขที่ กจ.4/2549 (ฝพพ.3) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549
วงเงินตามสัญญาทั้งสิ้น 1,108,500,000.- บาท อายุสัญญา 750 วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ 9 กันยายน 2549
และจะสิ้นสุดอายุสัญญา วันที่ 27 กันยายน 2551 ผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า SSP
(ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง)



ภาพงานวางป่าและล้มต้นไม้



ภาพงานวางป่าและล้มต้นไม้
