

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕

สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการ
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๒
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๑๘๔๔๓
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

29 ส.ค. 2555

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk55_08_18 : ณัฐยานัน)

รอง อกร. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๕
ผอ.สวค. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๕
ผอ. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๕
ผอ.กลุ่ม ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๕
นวก. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๕
ผู้พิมพ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ลง 2/394
24 ส.ค. 55

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10394 สด
วันที่ 27 ส.ค. 2555 14.30

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๐๑/๑๘๙๔๓ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อ
การวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) 24 ส.ค. 55

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความ
เสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๑ การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๘,๗๗๕.๗๔๕๙ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๐๘,๗๗๔.๘๐๑๔ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๒๔๗.๘๓๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS เป็นเงิน ๘๕,๙๙๓.๙๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๔๐ จากยอดจัดสรร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

28 ส.ค. 2555
จัดเข้าวาระ.....

๑.๒ ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ
๘๐ มีจำนวน ๙ กระทรวง ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๙ กระทรวง
- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๔๗ จังหวัด ส่วนจังหวัด
ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๖ จังหวัด

ข้อสังเกตจากสรุปรายงาน พบว่า ส่วนราชการฯ และจังหวัดบางแห่งมีสถานะผลการเบิกจ่าย
ไม่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรที่จะเร่งรัดให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดดังกล่าวดำเนินการบันทึก
ข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยของสำนักงานงบประมาณให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดเร่ง
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวแล้ว

๑.๓ การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งส่งคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งเงินคืนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นเงิน ๕,๒๐๙.๔๘๙๐
ล้านบาท และเงินที่ส่วนราชการฯ จะใช้จ่ายจริงน้อยกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป็นเงิน ๑๓๙.๐๐๖๐
ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะจัดสรรเพิ่มเติมได้อีก จำนวน ๕,๓๔๘.๔๘๕๐ ล้านบาท

- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินที่ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรวม
๖ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๓๑๓.๕๔๔๙ ล้านบาท (สำนักงานงบประมาณจัดสรรแล้ว ๔,๐๓๑.๕๘๓๗ ล้านบาท) ดังนั้น คงเหลือวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้อีก เป็นเงิน ๓๔.๙๕๐๑ ล้านบาท (๕,๓๔๘.๔๘๕๐ - ๕,๓๑๓.๕๔๔๙ ล้านบาท)

/๒. การจัดสรร...

บน. 4478
เข้า 14/8/55
๑. ๒๒ น
ออก

๒. การจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ อนุมัติ
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๑๘.๘๖๑๒ ล้านบาท

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรเงินกู้ฯ ให้ส่วนราชการ จำนวน ๒๑,๓๗๒.๑๐๕๘ ล้านบาท
คงเหลือ จำนวน ๗,๕๔๖.๗๕๕๔ ล้านบาท ได้แก่

- (๑) กระทรวงคมนาคม จำนวน ๓,๙๘๑.๙๘๘๐ ล้านบาท
- (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๓,๒๓๖.๖๙๔๐ ล้านบาท
- (๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓๑๐.๗๔๘๔ ล้านบาท
- (๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗.๑๒๕๐ ล้านบาท
- (๕) กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๐.๒๐๐๐ ล้านบาท

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ทราบ/เสนอกรม.ทราบ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)


นายกรัฐมนตรี

๒๗ ส.ค. ๕๕

๓ 1๖


สกล. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2555 ลงมติว่า

ทราบ 

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

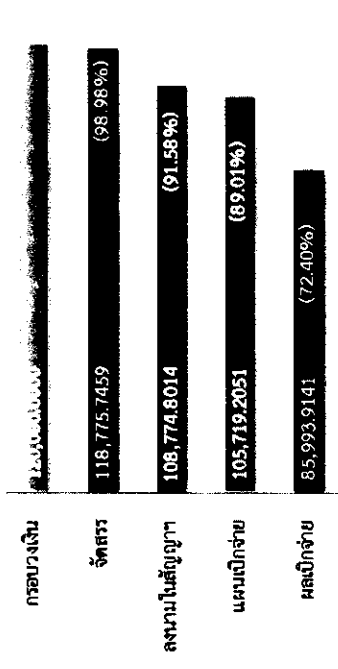

(ล้านบาท) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

■ ผลเบิกจ่าย ■ อนุมัติจ่าย ■ ลงนามในสัญญา ■ จัดสรร ■ กรอบวงเงิน

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

จัดสรรเพิ่มเติมได้ทั้งสิ้น	5,348.4950
ค.ม.อนุมัติเพิ่มเติม	5,313.5449 (99.35%)
จัดสรร	4,031.5837 (75.38%)
คงเหลือ	34.9501 (0.65%)

(ล้านบาท) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

□ คงเหลือ □ จัดสรร □ ค.ม.อนุมัติเพิ่มเติม จัดสรรเพิ่มเติมได้ทั้งสิ้น

สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	ผลการดำเนินงาน*		จัดสรร	ผลการดำเนินงาน*	
	เบิกจ่าย	ร้อยละ		เบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	118,775.75	85,993.91 72.40%			84.33%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41 100.00%			100.00%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,383.59	1,250.67 90.39%			98.54%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,740.35	7,786.45 61.12%			93.94%
กระทรวงศึกษาธิการ	5,981.45	3,520.58 58.86%			92.91%
กระทรวงแรงงาน	889.51	887.87 99.82%			91.08%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,468.98	2,388.38 96.74%			86.26%
กระทรวงสาธารณสุข	1,885.31	1,526.24 80.95%			84.03%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,283.24	5,659.69 77.71%			83.49%
รัฐวิสาหกิจ	26,114.45	24,343.69 93.22%			80.26%
กระทรวงมหาดไทย	30,490.31	23,800.54 78.06%			79.91%
กระทรวงกลาโหม	8,165.08	3,416.62 41.84%			75.28%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,168.29	254.48 21.78%			65.27%
กระทรวงอุตสาหกรรม	706.75	245.96 34.80%			57.10%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	18.20 7.84%			49.19%
กระทรวงคมนาคม	16,696.57	10,351.65 62.00%			41.29%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,985.28	506.60 25.52%			26.64%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	557.92	24.88 4.46%			16.67%
กระทรวงยุติธรรม	15.22	- 0.00%			0.00%

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผนผลการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องผู้ประสานงาน สำนักงานงบประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยาย ฟันฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (งบรายจ่าย)	ร้อยละ	เสร็จใน มิ.ย.**			เสร็จหลัง มิ.ย.**		
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship
				รายการ	ก้าวหน้า		รายการ	ก้าวหน้า	
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,674.5700	5,882.4578	67.81%	1,766	55.32%	7	100.00%	421	58.47%
ลำปาง	704.9897	488.3987	69.28%	252	79.85%	-	-	32	73.02%
พะเยา	106.6368	88.0479	82.57%	319	79.17%	-	-	61	89.52%
เชียงใหม่	1,528.5270	1,285.6603	84.11%	85	75.09%	5	100.00%	25	68.64%
ลำพูน	472.2440	374.1081	79.22%	24	69.23%	-	-	5	70.25%
อุดรดิตถ์	669.9005	299.8329	44.76%	82	64.09%	-	-	38	63.28%
แพร่	1,199.7916	891.6861	74.32%	55	51.37%	-	-	28	55.47%
แม่ฮ่องสอน	250.2245	101.8764	40.71%	90	49.58%	-	-	33	50.22%
เชียงราย	773.3582	522.7265	67.59%	163	48.65%	-	-	31	30.78%
ตาก	1,234.9182	842.3045	68.21%	143	43.34%	2	100.00%	50	61.64%
สุโขทัย	1,153.3428	724.7677	62.84%	219	40.10%	-	-	33	58.03%
น่าน	580.6366	263.0488	45.30%	365	32.31%	-	-	58	45.21%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการขยายผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

** ตามข้อมูลสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.prmocfood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 ส.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**		เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,454.3828	9,428.2480	65.23%	2,757	92.44%	25	97.19%	324	68.62%
กำแพงเพชร	1,848.4012	1,514.4690	81.93%	333	96.37%	4	100.00%	32	75.70%
ชัยนาท	2,059.0699	1,502.3007	72.96%	759	95.39%	3	100.00%	32	66.23%
พิจิตร	2,838.7620	1,783.5085	62.83%	488	91.11%	8	93.13%	80	67.87%
อุทัยธานี	957.2807	554.3383	57.91%	156	91.03%	4	100.00%	86	79.08%
นครสวรรค์	5,123.6802	3,210.4296	62.66%	708	90.61%	5	90.00%	54	54.08%
พิษณุโลก	1,627.1889	863.2019	53.05%	313	88.01%	1	100.00%	40	63.52%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดนี้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoctfood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบกลาง รายการैयाวา ฟีนฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 ส.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จสิ้น ส.ค.**		เสร็จสิ้น ส.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปลายน้ำ									
อ่างทอง	58,517.7628	35,772.7338	61.13%	8,034	87.07%	46	84.21%	1,573	53.61%
สุพรรณบุรี	2,968.6149	2,314.7973	77.98%	1,150	96.63%	3	93.33%	24	72.30%
ฉะเชิงเทรา	1,845.1391	1,468.6563	79.60%	365	94.42%	4	75.00%	24	65.74%
นครนายก	1,510.8207	1,174.0548	77.71%	399	93.69%	1	90.00%	130	86.58%
สมุทรปราการ	608.3352	487.1268	80.08%	255	93.11%	3	100.00%	13	54.31%
สิงห์บุรี	511.6192	312.1716	61.02%	43	91.87%	3	98.33%	5	78.75%
สระบุรี	2,135.9039	1,149.8169	53.83%	603	91.12%	1	100.00%	27	37.43%
ลพบุรี	1,813.3828	1,110.9940	61.27%	308	90.47%	1	95.00%	42	88.97%
นนทบุรี	3,242.5258	1,954.6687	60.28%	551	89.22%	4	20.00%	25	58.75%
ปราชินบุรี	4,029.3450	1,996.2480	49.54%	426	89.02%	6	85.00%	47	54.78%
นครปฐม	829.5848	548.0579	66.06%	284	88.82%	5	100.00%	59	71.72%
ปทุมธานี	3,808.5762	3,264.2061	85.71%	313	85.88%	1	100.00%	40	67.04%
พระนครศรีอยุธยา	8,553.5128	6,162.7246	72.05%	1,040	80.94%	2	60.00%	206	56.31%
กรุงเทพมหานคร	11,630.7461	5,455.2451	46.90%	1,879	80.32%	5	83.00%	745	37.86%
สมุทรสาคร	14,133.7560	7,875.1809	55.72%	358	74.80%	-	-	173	50.82%
	895.9003	498.7849	55.67%	60	74.12%	7	79.29%	13	77.13%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผน/ผลการैयाอยู่ประสบทุกภัย สำนักงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดนั้นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmodflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	6,751	35,126.2564	20,089.0916	57.19	● 87.47%
สมุทรสงคราม	1	27.6140	27.6140	100.00	● 100.00%
ชัยภูมิ	771	2,358.5796	2,212.9415	93.83	● 97.31%
ยโสธร	350	986.0827	861.1795	87.33	● 96.28%
พัทลุง	57	197.2704	171.5943	86.98	● 94.17%
สระแก้ว	99	390.5422	350.8632	89.84	● 93.43%
สุรินทร์	244	1,204.2323	893.5611	74.20	● 93.43%
สตูล	85	343.2213	270.4246	78.79	● 93.30%
กาฬสินธุ์	406	927.4429	718.3996	77.46	● 93.07%
ร้อยเอ็ด	473	1,885.3153	1,711.7853	90.80	● 91.42%
เพชรบูรณ์	258	930.6496	696.4241	74.83	● 91.22%
สงขลา	27	115.3206	52.2544	45.31	● 90.38%
ปัตตานี	34	149.2573	121.2739	81.25	● 89.76%
อุบลราชธานี	351	1,499.0801	1,105.8095	73.77	● 89.75%
มหาสารคาม	436	1,141.1625	950.5837	83.30	● 89.44%
ขอนแก่น	398	1,821.1535	1,407.0486	77.26	● 88.68%
นครราชสีมา	137	899.0799	628.2160	69.87	● 88.55%
พังงา	165	167.4904	97.5911	58.27	● 88.13%
สกลนคร	108	226.3566	160.8497	71.06	● 86.04%
สุราษฎร์ธานี	47	84.1269	52.0638	61.89	● 84.98%
นครพนม	198	1,025.3219	286.6723	27.96	● 84.93%

หมายเหตุ: ● สูงกว่าร้อยละ 80

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
ราชบุรี	24	79.1641	64.4253	81.38	● 84.85%
อุดรธานี	171	483.2903	401.4676	83.07	● 84.75%
หนองคาย	95	356.3825	226.2158	63.48	● 84.63%
อำนาจเจริญ	50	133.8092	85.6402	64.00	● 84.57%
ศรีสะเกษ	352	1,330.5625	1,139.5850	85.65	● 82.73%
ระยอง	59	118.3099	57.8426	48.89	● 82.11%
บุรีรัมย์	90	611.3383	431.3990	70.57	● 81.98%
ชลบุรี	57	244.3110	150.5957	61.64	● 81.70%
นุ่กดาหาร	153	340.1649	282.2118	82.96	78.47%
ตรัง	30	92.7491	63.5544	68.52	78.30%
ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	15.2572	46.82	76.99%
ส่วนกลาง	360	13,329.6069	3,394.2233	25.46	76.04%
เลย	355	602.7498	380.7830	63.17	75.39%
ยะลา	8	15.3160	10.1558	66.31	75.00%
จันทบุรี	37	138.3460	93.4306	67.53	74.92%
ปทุมธานี	82	142.1658	67.3393	47.37	70.11%
ระนอง	35	91.5037	44.5200	48.65	69.58%
ตราด	41	89.0086	60.1416	67.57	67.81%
หนองบัวลำภู	35	310.6646	269.8167	86.85	64.57%
นราธิวาส	30	91.4881	45.3796	49.60	63.20%
ภูเก็ต	28	113.4350	27.9567	24.65	43.70%

สรุปสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/กรม	กรอบวงเงิน ตามมติ ครม.	จัดสรร	คงเหลือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,795.0302	1,484.2818	310.7484
- กรมชลประทาน	1,782.4302	1,471.6818	310.7484
- กรมพัฒนาที่ดิน	12.6000	12.6000	-
กระทรวงคมนาคม	21,724.4430	17,742.4550	3,981.9880
- กรมเจ้าท่า	3,282.1560	22.1560	3,260.0000
- กรมทางหลวง	9,583.8000	9,036.0790	547.7210
- กรมทางหลวงชนบท	8,858.4870	8,684.2200	174.2670
กระทรวงมหาดไทย	1,220.0000	1,219.8000	0.2000
- กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,220.0000	1,219.8000	0.2000
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	942.6940	925.5690	17.1250
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	35.7600	35.3000	0.4600
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	463.2000	463.2000	-
- กรมป่าไม้	443.7340	427.0690	16.6650
กระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
รวมทั้งสิ้น	28,918.8612	21,372.1058	7,546.7554

หมายเหตุ - ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 วงเงิน 25,055.4310 ล้านบาท (942.6940+ 24,112.7370)
จัดสรร 20,954.9266 ล้านบาท คงเหลือ 4,100.5044 ล้านบาท
- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 วงเงิน 3,850.8302 ล้านบาท
จัดสรร 404.5792 ล้านบาท คงเหลือ 3,446.2510 ล้านบาท
- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 วงเงิน 12.6000 ล้านบาท
จัดสรร 12.6000 ล้านบาท (ตัดเงินจากกรมป่าไม้ให้กรมพัฒนาที่ดิน)
