

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการ
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๕
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๒๐๘๐๐
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ กันยายน ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk55_09_11 : ณัฐธยาน์)

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕
ผอ.สวค. ๑๕/๙ ก.ย. ๕๕
ผอ.ช. ๑๕/๙ ก.ย. ๕๕
ผอ.กลุ่ม ๑๕/๙ ก.ย. ๕๕
นวก. ๑๕/๙ ก.ย. ๕๕
ผู้พิมพ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11503
17-11-55

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๐๑/๒๐๕๐๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อ
การวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) 17.7.55

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

๑. โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความ
เสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๑.๑ การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๓๐.๑๗๔๑ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๐,๖๔๗.๙๙๕๒ ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๐๙.๒๖๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS เป็นเงิน ๙๒,๔๘๔.๐๔๙๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๗๐ จากยอดจัดสรร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

จัดเข้าวาระ..... 1 ก.ย. 2555

๑.๒ ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๙ กระทรวง ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๙ กระทรวง
- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๔๑ จังหวัด ส่วนจังหวัด ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓๒ จังหวัด

ข้อสังเกตจากสรุปรายงาน พบว่า ส่วนราชการฯ และจังหวัดบางแห่งมีสถานะผลการเบิกจ่าย
ไม่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรที่จะเร่งรัดให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดดังกล่าวดำเนินการบันทึก
ข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยของสำนักงานงบประมาณให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดเร่ง
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวแล้ว

๑.๓ การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งเงินคืนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นเงิน ๕,๔๙๙.๓๙๗๒
ล้านบาท และเงินที่ส่วนราชการฯ จะใช้จ่ายจริงน้อยกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป็นเงิน ๑๓๙.๐๐๖๐
ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะจัดสรรเพิ่มเติมได้ จำนวน ๕,๖๓๘.๔๐๓๒ ล้านบาท
- ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินที่ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณ
รวม ๗ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๑๓.๕๔๔๙ ล้านบาท (สำนักงานงบประมาณจัดสรรแล้ว ๔,๕๔๑.๘๕๐๑ ล้านบาท)

/ตั้งนั้น...

นร. 4950
เข้า 17/9/55
12.26 น.
ออก 17/9/55
16.02 น.

รต.นร. (1) 3138
17 ก.ย. 55

ดังนั้น คงเหลือวงเงินที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้อีก เป็นเงิน ๓๒๔.๘๕๘๓ ล้านบาท (๕,๖๓๘.๔๐๓๒ - ๕,๓๑๓.๕๔๔๙ ล้านบาท)

๒. การจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒


- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙,๘๓๖.๗๙๒๖ ล้านบาท

- สำนักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ฯ ให้ส่วนราชการ จำนวน ๒๑,๓๗๒.๑๐๕๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๘,๔๖๔.๖๘๖๘ ล้านบาท ได้แก่

- (๑) กระทรวงคมนาคม จำนวน ๓,๙๘๑.๙๘๘๐ ล้านบาท
- (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๓,๒๓๖.๖๙๔๐ ล้านบาท
- (๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๙๐๘.๕๘๙๓ ล้านบาท
- (๔) กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๒๘.๙๗๐๐ ล้านบาท
- (๕) กระทรวงกลาโหม จำนวน ๑๙.๘๕๐๐ ล้านบาท
- (๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗.๑๒๕๐ ล้านบาท
- (๗) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๗๑.๔๗๐๕ ล้านบาท

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ทราบ / เล่นนครม. ทราบ




(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

17 ก.ย. 2555

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



คธ.

๓๓ |
สค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555 ลงมติว่า


ทราบ 

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

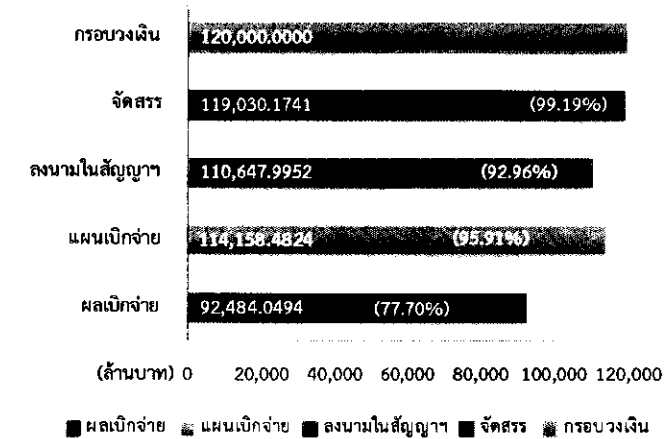

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

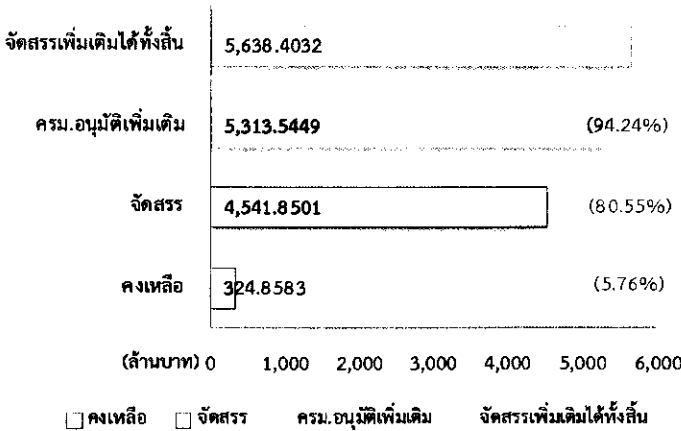

สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย*		ผลการดำเนินงาน**	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เฉลี่ย (ร้อยละ)	
รวมทั้งสิ้น	119,030.17	92,484.05	77.70%	●	82.75%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,265.06	92.47%	●	98.54%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,740.35	9,735.15	76.41%	●	94.68%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,014.34	3,927.63	65.30%	●	93.12%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,468.98	2,410.89	97.65%	●	91.16%
กระทรวงแรงงาน	889.51	887.87	99.82%	●	91.08%
กระทรวงสาธารณสุข	1,885.33	1,558.48	82.66%	●	87.29%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,283.24	5,907.33	81.11%	●	83.73%
กระทรวงกลาโหม	8,709.23	4,101.73	47.10%	●	81.46%
กระทรวงมหาดไทย	30,250.86	25,123.34	83.05%		74.05%
กระทรวงอุตสาหกรรม	706.75	287.12	40.63%		73.12%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	319.02	27.98%		65.19%
รัฐวิสาหกิจ	26,114.45	24,371.63	93.33%		60.30%
กระทรวงคมนาคม	16,696.57	11,979.34	71.75%		52.99%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,945.55	518.60	26.66%		39.63%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	557.92	61.21	10.97%		29.17%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	18.25	7.87%		3.23%
กระทรวงยุติธรรม	15.22	-	0.00%		0.00%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 ก.ย. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 ก.ย. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน มิ.ย.**				เสร็จถึง มิ.ย.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,892.4259	6,756.9143	75.99%	1,756	58.34%	11	100.00%	592	50.71%	17	86.88%
ลำปาง	709.1012	500.4375	70.57%	252	80.68%	-		32	71.41%	2	92.50%
พะเยา	106.6368	88.6790	83.16%	319	79.17%	-		61	96.00%	1	100.00%
เชียงใหม่	1,556.1715	1,310.3082	84.20%	85	75.71%	5	100.00%	25	66.53%	-	
ลำพูน	472.5506	408.7634	86.50%	24	73.75%	-		5	66.21%	4	100.00%
ตาก	1,239.4290	1,030.9691	83.18%	82	72.19%	1	100.00%	38	73.35%	2	100.00%
อุตรดิตถ์	670.1392	299.5819	44.70%	55	66.60%	-		28	60.15%	3	75.00%
แม่ฮ่องสอน	250.2245	101.8764	40.71%	90	53.22%	-		33	50.24%	-	
แพร่	1,355.9066	1,397.3952	103.06%	163	51.99%	1	100.00%	31	25.11%	1	65.00%
เชียงราย	773.3582	529.8566	68.51%	143	50.62%	-		50	30.85%	2	62.50%
สุโขทัย	1,153.5468	825.3863	71.55%	219	41.01%	3	100.00%	33	59.54%	-	
น่าน	605.3614	263.6608	43.55%	365	32.86%	1	100.00%	58	47.10%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

๘ สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 ก.ย. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**				เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,548.8689	10,078.0299	69.27%	2,756	● 92.89%	25	● 98.46%	377	62.72%	3	77.50%
กำแพงเพชร	1,849.1223	1,654.5433	89.48%	333	● 98.00%	4	● 100.00%	35	69.22%	-	
ชัยนาท	2,072.4500	1,703.7118	82.21%	758	● 95.89%	3	● 100.00%	49	51.22%	-	
พิจิตร	2,847.9096	1,948.8566	68.43%	488	● 91.42%	8	● 93.75%	83	73.60%	-	
อุทัยธานี	960.5723	563.6158	58.67%	156	● 91.03%	4	● 100.00%	91	75.84%	-	
นครสวรรค์	5,181.6332	3,262.3089	62.96%	707	● 90.78%	5	● 97.00%	74	43.32%	1	65.00%
พิษณุโลก	1,637.1815	944.9936	57.72%	314	● 88.20%	1	● 100.00%	45	55.48%	2	● 90.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 ก.ย. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ส.ค.**				เสร็จหลัง ส.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปลายน้ำ	62,293.2150	37,978.2371	60.97%	8,003	● 88.13%	46	● 91.04%	1,834	51.94%	-	-
อ่างทอง	3,048.7250	2,457.4893	80.61%	1,148	● 97.42%	3	● 100.00%	45	45.21%	-	-
สมุทรปราการ	608.0761	477.9131	78.59%	43	● 95.32%	3	● 98.33%	24	73.14%	-	-
สุพรรณบุรี	1,868.3094	1,514.1442	81.04%	364	● 94.85%	4	75.00%	36	48.42%	-	-
นครนายก	608.3352	525.7297	86.42%	254	● 94.65%	3	● 100.00%	14	64.71%	-	-
สิงห์บุรี	2,140.9195	1,339.3460	62.56%	601	● 93.84%	1	● 100.00%	42	31.07%	-	-
ฉะเชิงเทรา	1,585.6312	1,234.5729	77.86%	405	● 93.82%	1	● 100.00%	137	● 92.26%	-	-
สระบุรี	1,813.3828	1,137.5067	62.73%	307	● 90.98%	1	● 95.00%	43	● 89.84%	-	-
นนทบุรี	4,801.6616	2,051.2589	42.72%	427	● 89.68%	6	● 96.67%	58	53.07%	-	-
ลพบุรี	3,637.9926	2,003.2139	55.06%	549	● 89.55%	4	37.50%	103	21.51%	-	-
ปราจีนบุรี	832.2434	548.2979	65.88%	283	● 89.52%	5	● 100.00%	61	69.37%	-	-
นครปฐม	4,772.6044	3,498.0444	73.29%	313	● 86.54%	1	● 100.00%	52	57.63%	-	-
ปทุมธานี	9,241.1913	6,430.4925	69.59%	1,029	● 82.79%	2	● 80.00%	259	54.79%	-	-
พระนครศรีอยุธยา	11,684.6296	5,742.7185	49.15%	1,866	● 81.21%	5	● 92.00%	758	39.00%	-	-
กรุงเทพมหานคร	14,698.7667	8,519.7814	57.96%	354	76.22%	-	-	182	55.59%	-	-
สมุทรสาคร	950.7464	497.7278	52.35%	60	74.12%	7	● 100.00%	20	51.13%	-	-

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	7,287	36,127.6513	21,094.5867	58.39	● 83.83%
สมุทรสงคราม	1	27.6140	27.6140	100.00	● 100.00%
ชัยภูมิ	771	2,358.5796	2,242.7922	95.09	● 97.33%
ยโสธร	352	986.1979	864.7718	87.69	● 96.06%
กาฬสินธุ์	409	928.9306	794.8618	85.57	● 94.42%
สุรินทร์	244	1,204.2323	896.9986	74.49	● 93.50%
สตูล	93	370.8137	314.1295	84.71	● 92.78%
ร้อยเอ็ด	474	1,885.9152	1,741.0358	92.32	● 92.46%
เพชรบูรณ์	259	942.7996	721.0067	76.48	● 92.31%
เลย	385	694.8703	479.7042	69.04	● 91.99%
สระแก้ว	101	391.7946	350.8632	89.55	● 91.58%
อุบลราชธานี	351	1,499.0801	1,183.1874	78.93	● 90.57%
มหาสารคาม	436	1,141.1625	962.3802	84.33	● 89.90%
ปัตตานี	35	150.2323	122.7107	81.68	● 89.04%
ขอนแก่น	402	1,821.7978	1,469.9613	80.69	● 88.44%
พังงา	167	167.9104	101.6468	60.54	● 87.38%
สกลนคร	109	226.3988	164.3348	72.59	● 87.05%
นครพนม	215	1,121.0444	345.2358	30.80	● 85.48%
ตรัง	30	92.7491	64.6153	69.67	● 83.57%
ระยอง	59	118.3099	66.1683	55.93	● 82.14%
บุรีรัมย์	91	612.0049	431.7118	70.54	● 81.56%

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
มุกดาหาร	154	340.3249	293.6030	86.27	● 81.29%
ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	15.3973	47.25	● 80.77%
ชลบุรี	60	244.4589	151.5457	61.99	79.93%
สงขลา	31	312.1488	50.5506	16.19	79.04%
สุราษฎร์ธานี	51	122.0728	52.0638	42.65	78.32%
ศรีสะเกษ	384	1,343.6794	1,147.5269	85.40	78.19%
อุดรธานี	194	562.7185	418.2936	74.33	76.34%
ราชบุรี	27	86.9690	64.4253	74.08	75.42%
นครราชสีมา	166	951.7399	636.6293	66.89	73.61%
ส่วนกลาง	392	13,343.0040	3,731.3575	27.96	72.07%
จันทบุรี	40	139.3567	96.0982	68.96	71.39%
ระนอง	36	91.7763	45.1033	49.14	70.38%
หนองคาย	120	406.1731	260.6927	64.18	70.26%
ตราด	44	90.2773	60.1962	66.68	65.28%
นราธิวาส	33	190.0357	45.3796	23.88	57.58%
หนองบัวลำภู	44	351.2146	270.8587	77.12	54.55%
อำนาจเจริญ	79	214.6092	85.6402	39.91	53.52%
ภูเก็ต	29	114.1505	29.1074	25.50	53.19%
ยะลา	14	22.4329	10.1558	45.27	42.86%
พัทลุง	152	253.8711	203.7332	80.25	36.98%
บึงกาฬ	238	171.4880	80.4979	46.94	26.58%

หมายเหตุ: ● สูงกว่าร้อยละ 80

**สรุปสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/กรม	กรอบวงเงิน ตามมติ ครม.	จัดสรร	คงเหลือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,392.8711	1,484.2818	908.5893
- กรมชลประทาน	2,380.2711	1,471.6818	908.5893
- กรมพัฒนาที่ดิน	12.6000	12.6000	-
กระทรวงคมนาคม	21,724.4430	17,742.4550	3,981.9880
- กรมเจ้าท่า	3,282.1560	22.1560	3,260.0000
- กรมทางหลวง	9,583.8000	9,036.0790	547.7210
- กรมทางหลวงชนบท	8,858.4870	8,684.2200	174.2670
กระทรวงมหาดไทย	1,348.7700	1,219.8000	128.9700
- กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,220.0000	1,219.8000	0.2000
- กรุงเทพมหานคร	128.7700	-	128.7700
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	942.6940	925.5690	17.1250
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	35.7600	35.3000	0.4600
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	463.2000	463.2000	-
- กรมป่าไม้	443.7340	427.0690	16.6650
กระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
กระทรวงกลาโหม	19.8500	-	19.8500
- กองทัพอากาศ	19.8500	-	19.8500
กระทรวงศึกษาธิการ	171.4705	-	171.4705
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	171.4705	-	171.4705
รวมทั้งสิ้น	29,836.7926	21,372.1058	8,464.6868

หมายเหตุ - ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 วงเงิน 25,055.4310 ล้านบาท (942.6940+ 24,112.7370)

จัดสรร 20,954.9266 ล้านบาท คงเหลือ 4,100.5044 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 วงเงิน 3,850.8302 ล้านบาท

จัดสรร 404.5792 ล้านบาท คงเหลือ 3,446.2510 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 วงเงิน 12.6000 ล้านบาท

จัดสรร 12.6000 ล้านบาท (ตัดเงินจากกรมป่าไม้ให้กรมพัฒนาที่ดิน)

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 วงเงิน 148.6200 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 วงเงิน 769.3114 ล้านบาท
