

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการ
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๖
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๒๓๒๑๔
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

สมัคร

(นายสมชาย พุฒิกัลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th (nk55_09_02 : ๓๓๓๓๓)

รอง ลคร. ๑๓๓๓ ๒๕
ผอ.สวค. ๑๓๓๓ ๒๕
ผช. ๑๓๓๓ ๒๕
ผอ.กค. ๑๓๓๓ ๒๕
นวก. ๑๓๓๓ ๒๕
ผู้พิมพ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
12250 2301
รับที่.....
วันที่ 1 ต.ค. 2555 1220

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๐๑/๒๓๒๑๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

ลำดับ 2/395
1๓๐๕5

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อ
การวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

28 ก.ย. 55

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

๑. โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความ
เสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๑.๑ การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๘,๘๗๒.๗๘๔๗ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๓,๐๒๕.๔๗๑๖ ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๒๘๒.๗๔๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS เป็นเงิน ๙๗,๖๖๓.๗๕๒๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๑๖ จากยอดจัดสรร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

จัดเข้าวาระ..... 2 ต.ค. 2555

๑.๒ ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๙ กระทรวง ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๙ กระทรวง
- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๔๙ จังหวัด ส่วนจังหวัด ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๔ จังหวัด

ข้อสังเกตจากสรุปรายงาน พบว่า ส่วนราชการฯ และจังหวัดบางแห่งมีสถานะผลการเบิกจ่าย
ไม่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรที่จะเร่งรัดให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดดังกล่าวดำเนินการบันทึก
ข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยของสำนักงานงบประมาณให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดเร่ง
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวแล้ว

๑.๓ การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งเงินคืนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นเงิน ๕,๘๒๔.๐๘๒๔ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินที่ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณ รวม ๗ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๑๓.๕๔๔๔ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้อีก เป็นเงิน ๖๔๙.๕๔๓๕ ล้านบาท

/การจัดสรร...

นร. 5169
เข้า ๑๐/๑/๕๕
13.16น.
ออก 1/10/55
15.32 น.

ร.ต.นร. (1) 3319
28 ก.ย. 55

๒. การจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙,๘๓๖.๗๙๒๖ ล้านบาท

- สำนักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ฯ ให้ส่วนราชการ จำนวน ๒๒,๐๖๑.๗๓๔๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๗,๗๗๕.๐๕๗๘ ล้านบาท ได้แก่

- (๑) กระทรวงคมนาคม จำนวน ๔,๐๐๔.๑๔๔๐ ล้านบาท
- (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๓,๒๓๖.๖๙๔๐ ล้านบาท
- (๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๙๖.๘๐๔๓ ล้านบาท
- (๔) กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๒๘.๙๗๐๐ ล้านบาท
- (๕) กระทรวงกลาโหม จำนวน ๑๙.๘๕๐๐ ล้านบาท
- (๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗.๑๒๕๐ ล้านบาท
- (๗) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๗๑.๔๗๐๕ ล้านบาท


จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทราบ/เสนอ ครม.ทราบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)


นายกรัฐมนตรี

๑ ๙ ๑. ๕๕

กรมวิทย์ นรช.

เพื่อไม่ดทาบ

๙๙ ๙๙๐ ๓๙๙. ๙๙๙



ท 31

สค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ ๒ ๓.๕. ๒๕๕๕ ลงมติว่า

ทราบ



สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายไฟฟ้า (120,000 ลบ.)


สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

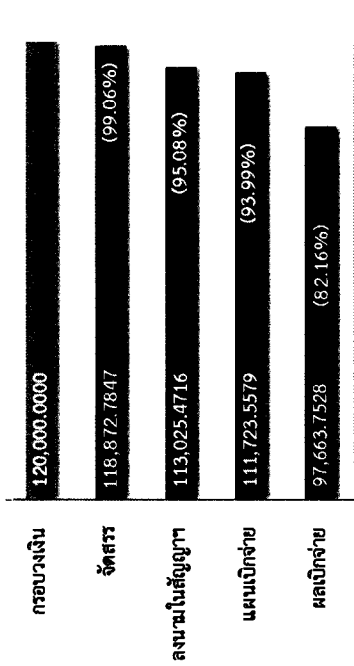

(ล้านบาท) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

■ ผลเบิกจ่าย ■ แผนเบิกจ่าย ■ ลงนามในสัญญา ■ จัดสรร ■ กรอบวงเงิน

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

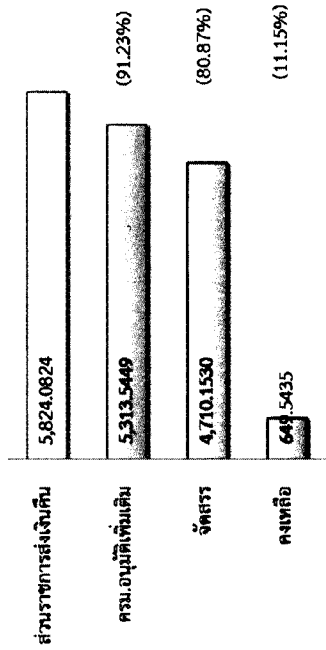

(ล้านบาท) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

☐ คงเหลือ ☐ จัดสรร ☐ กรมธนุฑิตเพิ่มเติม ☐ ส่วนราชการส่งเงินคืน

สรุปจำแนกตามกระทรวง

รวมทั้งสิ้น	118,872.78	97,663.75	82.16%	●	85.62%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,271.61	92.95%	●	98.55%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,674.68	10,643.95	83.98%	●	96.58%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,459.19	2,415.06	98.21%	●	96.18%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,182.64	4,285.65	69.32%	●	92.84%
กระทรวงแรงงาน	889.39	887.63	99.80%	●	88.99%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,283.24	6,099.48	83.75%	●	88.57%
กระทรวงสาธารณสุข	1,829.75	1,591.72	86.99%	●	87.17%
กระทรวงกลาโหม	8,708.86	5,178.59	59.46%	●	86.83%
กระทรวงมหาดไทย	30,180.53	26,482.75	87.75%		79.34%
กระทรวงอุตสาหกรรม	706.75	311.27	44.04%		73.26%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	379.81	33.31%		68.49%
กระทรวงคมนาคม	16,681.69	13,214.51	79.22%		59.45%
รัฐวิสาหกิจ	26,012.28	24,293.51	93.39%		57.02%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	19.59	8.44%		43.23%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	511.81	26.40%		39.63%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	557.92	65.41	11.72%		29.17%
กระทรวงยุติธรรม	15.22	-	0.00%		0.00%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 26 ก.ย. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงาน สำนักรับประมาณ

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,891.7540	7,273.7113	81.80%	1,717	61.73%	11	100.00%	627	58.92%	17	93.23%
พะเยา	106.6368	102.6684	96.28%	252	90.48%	-	-	32	100.00%	1	100.00%
ลำปาง	709.1014	519.2607	73.23%	319	82.00%	-	-	61	81.01%	2	100.00%
อุตรดิตถ์	670.1392	420.6245	62.77%	85	81.83%	-	-	25	70.74%	3	78.33%
ลำพูน	472.5189	422.6367	89.44%	24	80.63%	-	-	5	75.25%	4	100.00%
เชียงใหม่	1,556.1715	1,327.2986	85.29%	82	78.87%	5	100.00%	38	75.35%	-	-
ตาก	1,239.0833	1,068.5213	86.23%	55	74.72%	1	100.00%	28	80.91%	2	100.00%
แม่ฮ่องสอน	250.0939	103.1539	41.25%	90	57.39%	-	-	33	54.09%	-	-
แพร่	1,355.9066	1,419.5458	104.69%	163	53.60%	1	100.00%	31	27.67%	1	80.00%
เชียงราย	773.3582	556.0058	71.89%	143	52.43%	-	-	50	41.61%	2	87.50%
สุโขทัย	1,153.3935	1,008.7990	87.46%	219	48.64%	3	100.00%	33	78.22%	-	-
น่าน	605.3508	325.1966	53.72%	365	33.20%	1	100.00%	58	57.43%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการขยายผู้ประสบเหตุภัย สำนักงานประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoctlood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงบ)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**		เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า***
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,546.2211	10,834.3604	74.48%	2,730	● 94.32%	25	● 99.48%	398	73.26%
กำแพงเพชร	1,849.0054	1,658.3493	89.69%	329	● 98.46%	4	● 100.00%	38	71.65%
ชัยนาท	2,072.2524	1,731.5903	83.56%	753	● 96.13%	3	● 100.00%	53	62.63%
นครสวรรค์	5,181.6332	3,678.1146	70.98%	703	● 94.91%	5	● 100.00%	78	59.24%
อุทัยธานี	958.5848	614.8882	64.15%	152	● 92.44%	4	● 100.00%	93	88.18%
พิจิตร	2,847.7119	1,995.5988	70.08%	484	● 92.08%	8	● 96.88%	87	80.64%
พิษณุโลก	1,637.0334	1,155.8192	70.60%	309	● 88.62%	1	● 100.00%	49	66.88%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการขยายผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmodflood.com โดยคำนวณจากค่าเสียความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปายน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงบ)	ร้อยละ	เสร็จสิ้น ส.ค.**		เสร็จหลัง ส.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปายน้ำ	62,349.6780	39,699.6395	63.67%	7,961	● 89.74%	46	● 94.25%	1,868	56.05%
	3,048.0230	2,367.6743	77.68%	1,143	● 97.78%	3	● 100.00%	49	52.34%
	607.2822	554.0813	91.24%	250	● 97.17%	3	● 100.00%	17	70.91%
	1,585.4830	1,407.0708	88.75%	403	● 97.13%	1	● 100.00%	138	● 92.78%
	1,868.2493	1,537.7647	82.31%	359	● 96.49%	4	● 100.00%	40	56.81%
	591.7770	477.7531	80.73%	37	● 96.31%	3	● 98.33%	28	74.48%
	2,140.8701	1,373.0897	64.14%	596	● 94.68%	1	● 100.00%	46	45.77%
	1,813.3828	1,148.0128	63.31%	303	● 92.00%	1	● 95.00%	47	● 90.50%
	3,637.9926	2,097.3567	57.65%	545	● 91.31%	4	37.50%	107	25.58%
	832.0953	548.8978	65.97%	279	● 90.94%	5	● 100.00%	64	70.57%
	4,801.6615	2,084.3834	43.41%	425	● 90.05%	6	● 96.67%	60	56.22%
	4,771.1503	3,540.2514	74.20%	309	● 87.96%	1	● 100.00%	56	61.69%
	9,240.9488	6,887.0481	74.53%	1,022	● 87.62%	2	● 100.00%	266	69.01%
	11,684.6296	5,880.1258	50.32%	1,885	● 81.60%	5	● 92.00%	739	38.97%
	949.1085	499.2742	52.60%	56	● 80.56%	7	● 100.00%	23	59.68%
	14,777.0241	9,296.8553	62.91%	349	79.93%	-		188	61.26%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากรายงานแผน/ผลการขยายผู้ประสบภัยภัย สำนักงานประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoctfood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ				จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	7,365	33,760.9475	22,031.9133	65.26	● 87.88%	สุราษฎร์ธานี	52	125.5031	61.9934	49.40	● 84.65%
สมุทรสงคราม	1	27.6140	27.6140	100.00	● 100.00%	ระยอง	59	117.6017	69.2091	58.85	● 83.99%
ชัยภูมิ	771	2,358.3230	2,251.0812	95.45	● 97.40%	ชลบุรี	60	244.4588	173.4648	70.96	● 82.18%
ยโสธร	352	986.1980	893.7097	90.62	● 97.10%	บุรีรัมย์	91	612.0050	433.0941	70.77	● 82.04%
มหาสารคาม	434	1,140.2810	976.6864	85.65	● 97.08%	ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	15.3973	47.25	● 80.77%
สุรินทร์	243	1,202.5397	1,083.7223	90.12	● 95.61%	อุดรธานี	194	562.7185	421.1436	74.84	76.57%
ร้อยเอ็ด	472	1,884.7998	1,782.6539	94.58	● 95.11%	ราชบุรี	27	86.9690	64.4478	74.10	75.56%
กาฬสินธุ์	409	928.9307	795.1042	85.59	● 95.08%	ส่วนกลาง	395	10,941.1493	3,905.5708	35.70	75.15%
สตูล	95	371.8291	314.7345	84.64	● 94.73%	มุกดาหาร	154	340.3249	256.3804	75.33	74.82%
เลย	385	694.8703	533.5221	76.78	● 94.03%	ปัตตานี	42	152.1097	128.9047	84.74	72.72%
ศรีสะเกษ	434	1,373.3845	1,251.3162	91.11	● 93.19%	หนองคาย	120	406.1732	268.5665	66.12	72.61%
เพชรบูรณ์	259	942.7996	732.5340	77.70	● 92.72%	จันทบุรี	40	139.3567	97.1982	69.75	71.71%
สระแก้ว	101	391.7946	352.7442	90.03	● 92.36%	ระนอง	36	91.7763	73.4861	80.07	70.38%
อุบลราชธานี	351	1,497.5091	1,211.4513	80.90	● 91.66%	ตราด	43	80.5999	69.2722	85.95	69.51%
นครราชสีมา	166	951.7398	709.2518	74.52	● 91.08%	นราธิวาส	34	191.5921	46.6013	24.32	58.82%
สกลนคร	109	226.3988	185.6845	82.02	● 89.67%	อำนาจเจริญ	79	214.6092	88.2567	41.12	54.81%
พังงา	167	167.9104	107.9345	64.28	● 89.56%	ภูเก็ต	29	114.1505	29.2121	25.59	54.72%
ขอนแก่น	401	1,820.8593	1,500.7025	82.42	● 89.50%	หนองบัวลำภู	44	351.2146	270.8587	77.12	54.55%
ดง	30	92.7492	77.8109	83.89	● 88.30%	สงขลา	44	321.3010	86.6178	26.96	53.86%
บึงกาฬ	238	171.4880	113.0516	65.92	● 87.12%	พัทลุง	153	253.8809	202.7617	79.86	36.24%
นครพนม	215	1,121.0444	358.0106	31.94	● 86.61%	ยะลา	21	27.6782	10.1558	36.69	28.57%

สรุปสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/กรม	กรอบวงเงิน ความเคิ ความ	จัดสรร	คงเหลือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,392.8711	2,196.0668	196.8043
- กรมชลประทาน	2,380.2711	2,183.4668	196.8043
- กรมพัฒนาที่ดิน	12.6000	12.6000	-
กระทรวงคมนาคม	21,724.4430	17,720.2990	4,004.1440
- กรมเจ้าท่า	3,282.1560	-	3,282.1560
- กรมทางหลวง	9,583.8000	9,036.0790	547.7210
- กรมทางหลวงชนบท	8,858.4870	8,684.2200	174.2670
กระทรวงมหาดไทย	1,348.7700	1,219.8000	128.9700
- กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,220.0000	1,219.8000	0.2000
- กรุงเทพมหานคร	128.7700	-	128.7700
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	942.6940	925.5690	17.1250
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	35.7600	35.3000	0.4600
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	463.2000	463.2000	-
- กรมป่าไม้	443.7340	427.0690	16.6650
กระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
กระทรวงกลาโหม	19.8500	-	19.8500
- กองทัพอากาศ	19.8500	-	19.8500
กระทรวงศึกษาธิการ	171.4705	-	171.4705
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	171.4705	-	171.4705
รวมทั้งสิ้น	29,836.7926	22,061.7348	7,775.0578

หมายเหตุ - ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 วงเงิน 25,055.4310 ล้านบาท (942.6940+ 24,112.7370)

จัดสรร 20,932.7706 ล้านบาท คงเหลือ 4,122.6604 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 วงเงิน 3,850.8302 ล้านบาท

จัดสรร 519.2242 ล้านบาท คงเหลือ 3,331.6060 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 วงเงิน 12.6000 ล้านบาท

จัดสรร 12.6000 ล้านบาท (ตัดเงินจากกรมป่าไม้ให้กรมพัฒนาที่ดิน)

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 วงเงิน 148.6200 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 วงเงิน 769.3114 ล้านบาท

จัดสรร 597.1400 ล้านบาท คงเหลือ 172.1714 ล้านบาท
