

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการ
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๕
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๓๓๐
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ ตุลาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๙ ๖ ต.ค. ๒๕๕๕

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk55_10_08 : ณัฐยานี)

ชง คร. ๑ 15 ต ๕๕
ผอ.สว. ๑ 15 ต ๕๕
ผช. ๑ 15 ต ๕๕
ผอ.กลุ่ม ๑ 15 ต ๕๕
นวด. ๑ 15 ต ๕๕
ผู้พิมพ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 13257 ส.ร.
วันที่ 12 ต.ค. 2555
วันที่ เวลา 14.30

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/ ๓๓๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ภค ๒/418

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

12 ต.ค. 55

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อ

การวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

จัดเข้าวาระ 15 ต.ค. 2555

๑. โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๑.๑ การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๘,๗๐๕.๖๑๗๖ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๓,๕๐๓.๓๓๒๒ ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓๘.๐๗๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๘๗.๖๑๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๒ จากยอดจัดสรร

๑.๒ ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๑๐ กระทรวง ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๘ กระทรวง
- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๕๐ จังหวัด ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๓ จังหวัด

ข้อสังเกตจากสรุปรายงาน พบว่า ส่วนราชการฯ และจังหวัดบางแห่งมีสถานะผลการเบิกจ่ายไม่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรที่จะเร่งรัดให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดดังกล่าวดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยของสำนักงานงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดเร่งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวแล้ว

๑.๓ การสงคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืน

- ส่วนราชการฯ สงคืนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๑๐.๔๕๐๓ ล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสงคืนทั้งสิ้น ๕,๗๒๙.๕๙๘๕ ล้านบาท คงเหลือเงินสงคืนที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติจำนวน ๒๘๐.๘๕๑๘ ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือจากการพิจารณาจัดสรรต่ำกว่ากรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒๕๙.๙๔๐๐ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่จะอนุมัติเพิ่มเติมได้อีกทั้งสิ้น ๕๔๐.๗๙๑๘ ล้านบาท

นร. ๖456
เข้า ๒/10/55
13.32.๙
ออก 12/10/55
14.00.๙

/๒. การจัดสรร...

ร.ม.ต.นร. 1/ ๙๙
12 ต.ค. 55 (10.๐๐๙)

๒. การจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒


- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙,๘๓๖.๗๙๒๖ ล้านบาท

- สำนักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ฯ ให้ส่วนราชการ จำนวน ๒๒,๐๖๑.๗๓๔๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๗,๗๗๕.๐๕๗๘ ล้านบาท ได้แก่

- (๑) กระทรวงคมนาคม จำนวน ๔,๐๐๔.๑๔๔๐ ล้านบาท
- (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๓,๒๓๖.๖๙๔๐ ล้านบาท
- (๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๙๖.๘๐๔๓ ล้านบาท
- (๔) กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๒๘.๙๗๐๐ ล้านบาท
- (๕) กระทรวงกลาโหม จำนวน ๑๙.๘๕๐๐ ล้านบาท
- (๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗.๑๒๕๐ ล้านบาท
- (๗) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๗๑.๔๗๐๕ ล้านบาท

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

เสนอ ดร. ทราบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

๑๒ พ.ค. ๕๕


(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กราบเรียน นาย

เสนอ นาย

๑๓-๑๕๐๐๐๐ - นาย


๑๐๐๖.

ท 16

สค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2555 ลงมติว่า

ทราบ



สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายไฟฟ้า (120,000 ลบ.)


สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

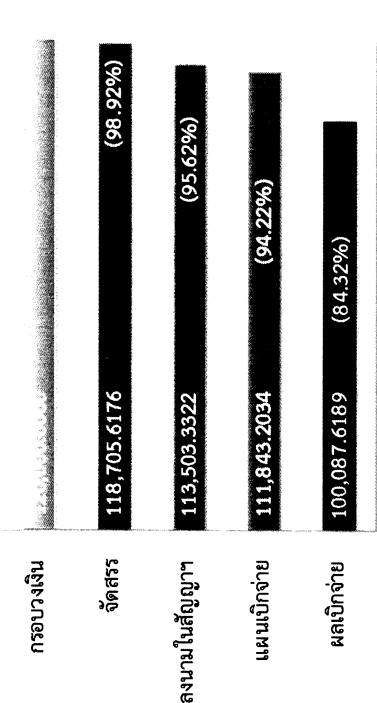

(ล้านบาท) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

■ ผลเบิกจ่าย ■ แผนเบิกจ่าย ■ ลงนามในสัญญา ■ จัดสรร ■ กรอบวงเงิน

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

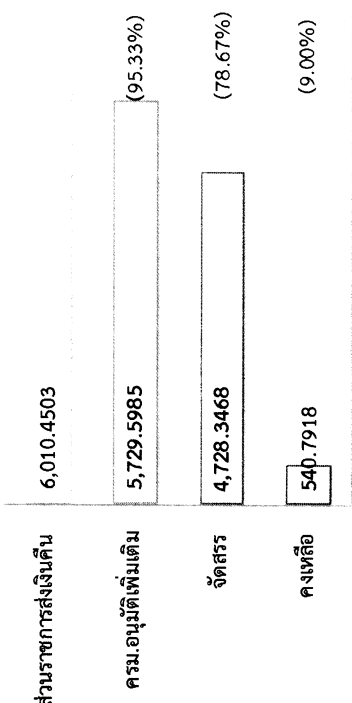

(ล้านบาท) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

☐ คงเหลือ ☐ จัดสรร ☐ กรม.อนุมัติเพิ่มเติม ☐ ส่วนราชการส่งคืน

สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย*		ผลการดำเนินงาน*	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	เฉลี่ย	(ร้อยละ)
รวมทั้งสิ้น	118,705.62	100,087.62	84.32%	○	86.41%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	○	100.00%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,272.38	93.00%	○	98.55%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,414.17	98.52%	○	97.58%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,651.28	10,862.29	85.86%	○	96.64%
กระทรวงกลาโหม	8,705.06	6,215.16	71.40%	○	94.07%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,155.62	4,480.38	72.79%	○	93.49%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	○	89.72%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,256.25	6,161.08	84.91%	○	89.26%
กระทรวงสาธารณสุข	1,828.21	1,596.27	87.31%	○	87.17%
กระทรวงมหาดไทย	30,108.02	26,843.82	89.16%	○	80.13%

กระทรวงอุตสาหกรรม	691.16	329.04	47.61%		74.03%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	399.77	35.06%		68.57%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	13,631.64	81.73%		63.00%
รัฐวิสาหกิจ	26,030.48	24,345.95	93.53%		57.22%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	21.29	9.18%		51.29%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	533.96	27.54%		48.44%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	81.37	14.62%		29.17%
กระทรวงยุติธรรม	15.22	-	0.00%		0.24%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 10 ต.ค. 2555

** ข้อมูลจากระบบงานแผนผลการปฏิบัติงานผู้ประสานงาน

สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการดำเนินโครงการขยายพื้นที่ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 ต.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน มิ.ย.**		เสร็จหลัง มิ.ย.**			
				ภาพรวม		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,891.7540	7,399.8863	83.22%	1,715	62.18%	11	100.00%	629	63.24%
พะเยา	106.6368	102.6684	96.28%	252	90.48%	-		32	100.00%
อุตรดิตถ์	670.1392	438.6098	65.45%	319	85.48%	-		61	70.74%
ลำปาง	709.1014	519.5304	73.27%	85	82.34%	-		25	81.86%
ลำพูน	472.5189	424.1958	89.77%	24	80.63%	-		5	75.25%
เชียงใหม่	1,556.1715	1,332.1486	85.60%	82	78.87%	5	100.00%	38	76.65%
ตาก	1,239.0833	1,102.9191	89.01%	55	77.68%	1	100.00%	28	83.22%
แม่ฮ่องสอน	250.0939	103.1539	41.25%	90	57.39%	-		33	54.09%
แพร่	1,355.9066	1,471.5840	108.53%	163	53.60%	1	100.00%	31	40.67%
เชียงราย	773.3582	560.1561	72.43%	143	52.43%	-		50	42.44%
สุโขทัย	1,153.3935	1,009.6790	87.54%	219	49.11%	3	100.00%	33	80.39%
น่าน	605.3508	335.2410	55.38%	365	33.20%	1	100.00%	58	58.31%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการขยายผู้ประสบทุกข์ภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmodflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยาย ฟันฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 ต.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**		เสร็จหลัง ก.ค.**			
		(กรมรายงาน)		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,546.2211	11,722.0729	80.59%	2,720	95.40%	25	99.48%	408	74.78%
กำแพงเพชร	1,849.0054	1,666.6278	90.14%	329	98.46%	4	100.00%	38	71.65%
นครสวรรค์	5,181.6332	4,367.2100	84.28%	695	98.20%	5	100.00%	86	65.78%
ชัยนาท	2,072.2524	1,735.2598	83.74%	753	96.13%	3	100.00%	53	62.67%
อุทัยธานี	958.5848	699.6552	72.99%	152	94.37%	4	100.00%	93	88.30%
พิจิตร	2,847.7119	2,087.8649	73.32%	483	92.61%	8	96.88%	88	82.05%
พิษณุโลก	1,637.0334	1,165.4552	71.19%	308	88.93%	1	100.00%	50	67.54%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผน/ผลการขยายผู้ประสบทุกข์ สำนักรงประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoctfood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยาย ฟันฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปลายทาง

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 ต.ค. 2555					
	จัดสรร	*เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จใน ส.ค.**		เสร็จหลัง ส.ค.**			
		(กรมรายงาน)		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า
กลุ่มจังหวัดปลายทาง	62,340.9784	41,970.4682	67.32%	46	90.19%	1,866	58.10%	-	-
อ่างทอง	3,048.0230	2,517.2851	82.59%	3	97.96%	49	72.74%	-	-
นครนายก	607.2822	554.0813	91.24%	3	97.86%	19	72.92%	-	-
ฉะเชิงเทรา	1,585.4830	1,407.8601	88.80%	1	97.45%	126	92.09%	-	-
สุพรรณบุรี	1,868.2493	1,537.7647	82.31%	4	96.49%	40	56.81%	-	-
สมุทรปราการ	591.7770	557.9219	94.28%	3	96.31%	28	74.48%	-	-
ปราจีนบุรี	823.5953	741.3480	90.01%	5	95.51%	64	83.54%	-	-
สิงห์บุรี	2,140.8701	1,372.9508	64.13%	1	94.67%	47	45.63%	-	-
สระบุรี	1,813.3828	1,156.7398	63.79%	1	92.60%	48	90.57%	-	-
ลพบุรี	3,637.9926	2,098.7389	57.69%	4	91.48%	108	26.27%	-	-
นนทบุรี	4,801.6615	2,096.7100	43.67%	6	90.26%	61	57.02%	-	-
นครปฐม	4,771.1503	3,550.0713	74.41%	1	88.48%	58	63.09%	-	-
ปทุมธานี	9,240.9488	7,032.0329	76.10%	2	87.93%	268	70.96%	-	-
พระนครศรีอยุธยา	11,684.6296	6,146.9590	52.61%	5	81.90%	736	39.35%	-	-
สมุทรสาคร	949.1085	525.7605	55.40%	7	81.63%	24	61.36%	-	-
กรุงเทพมหานคร	14,776.8245	10,674.2438	72.24%	-	80.62%	190	69.18%	-	-

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณ/ผลการใช้จ่ายผู้ประสบเหตุภัย สำนักรงประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoctlood.com โดยคำนวณจากค่าเสียความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขยายไฟฟ้า (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	7,365	33,760.9475	22,525.3662	66.72	88.35%
สมุทรสงคราม	1	27.6140	27.6140	100.00	100.00%
ชัยภูมิ	771	2,358.3230	2,284.7085	96.88	97.52%
ยโสธร	352	986.1980	893.7097	90.62	97.10%
มหาสารคาม	434	1,140.2810	976.6864	85.65	97.06%
สุรินทร์	243	1,202.5397	1,170.1041	97.30	95.64%
กาฬสินธุ์	409	928.9307	830.6462	89.42	95.57%
ร้อยเอ็ด	472	1,884.7998	1,784.7914	94.69	95.53%
เลย	385	694.8703	571.6995	82.27	95.36%
สกล	95	371.8291	315.7301	84.91	94.83%
อุบลราชธานี	351	1,497.5091	1,320.7991	88.20	93.94%
ศรีสะเกษ	434	1,373.3845	1,251.3162	91.11	93.19%
เพชรบูรณ์	259	942.7996	732.5340	77.70	92.79%
สระแก้ว	101	391.7946	352.7442	90.03	92.36%
นครราชสีมา	166	951.7398	731.4318	76.85	91.24%
สกลนคร	109	226.3988	185.9711	82.14	90.79%
ขอนแก่น	401	1,820.8593	1,511.5658	83.01	89.72%
พังงา	167	167.9104	107.9345	64.28	89.56%
ตรัง	30	92.7492	77.8109	83.89	88.30%
บึงกาฬ	238	171.4880	114.1415	66.56	87.13%
นครพนม	215	1,121.0444	359.8850	32.10	86.96%

หมายเหตุ: * สูงกว่าร้อยละ 80

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
สุราษฎร์ธานี	52	125.5031	63.3970	50.51	85.27%
ชลบุรี	60	244.4588	190.0946	77.76	84.25%
ระยอง	59	117.6017	69.2091	58.85	83.99%
บุรีรัมย์	91	612.0050	433.0941	70.77	82.05%
ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	15.3973	47.25	80.77%
อุดรธานี	194	562.7185	436.7525	77.61	78.28%
จันทบุรี	40	139.3567	117.5704	84.37	76.71%
มุกดาหาร	154	340.3249	252.5284	74.20	75.66%
ราชบุรี	27	86.9690	64.4478	74.10	75.56%
สว่นกลาง	395	10,941.1493	3,981.0924	36.39	75.38%
หนองคาย	120	406.1732	283.2239	69.73	74.62%
ระนอง	36	91.7763	74.1517	80.80	73.08%
ปัตตานี	42	152.1097	129.5109	85.14	73.03%
ตราด	43	80.5999	70.5229	87.50	71.83%
นราธิวาส	34	191.5921	46.6013	24.32	58.82%
อำนาจเจริญ	79	214.6092	88.2567	41.12	54.81%
ภูเก็ต	29	114.1505	29.2121	25.59	54.72%
สงขลา	44	321.3010	91.1653	28.37	54.55%
หนองบัวลำภู	44	351.2146	270.8587	77.12	54.55%
พัทลุง	153	253.8809	206.2994	81.26	36.40%
ยะลา	21	27.6782	10.1558	36.69	28.57%

สรุปสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้การใช้จ่ายเงินกู้
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/กรม	กรอบวงเงิน ตามมติ ครม.	จัดสรร	คงเหลือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,392.8711	2,196.0668	196.8043
- กรมชลประทาน	2,380.2711	2,183.4668	196.8043
- กรมพัฒนาที่ดิน	12.6000	12.6000	-
กระทรวงคมนาคม	21,724.4430	17,720.2990	4,004.1440
- กรมเจ้าท่า	3,282.1560	-	3,282.1560
- กรมทางหลวง	9,583.8000	9,036.0790	547.7210
- กรมทางหลวงชนบท	8,858.4870	8,684.2200	174.2670
กระทรวงมหาดไทย	1,348.7700	1,219.8000	128.9700
- กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,220.0000	1,219.8000	0.2000
- กรุงเทพมหานคร	128.7700	-	128.7700
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	942.6940	925.5690	17.1250
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	35.7600	35.3000	0.4600
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	463.2000	463.2000	-
- กรมป่าไม้	443.7340	427.0690	16.6650
กระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	3,236.6940	-	3,236.6940
กระทรวงกลาโหม	19.8500	-	19.8500
- กองทัพอากาศ	19.8500	-	19.8500
กระทรวงศึกษาธิการ	171.4705	-	171.4705
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	171.4705	-	171.4705
รวมทั้งสิ้น	29,836.7926	22,061.7348	7,775.0578

หมายเหตุ - ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 วงเงิน 25,055.4310 ล้านบาท (942.6940+ 24,112.7370)

จัดสรร 20,932.7706 ล้านบาท คงเหลือ 4,122.6604 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 วงเงิน 3,850.8302 ล้านบาท

จัดสรร 519.2242 ล้านบาท คงเหลือ 3,331.6060 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 วงเงิน 12.6000 ล้านบาท

จัดสรร 12.6000 ล้านบาท (ตัดเงินจากกรมป่าไม้ให้กรมพัฒนาที่ดิน)

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 วงเงิน 148.6200 ล้านบาท

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 วงเงิน 769.3114 ล้านบาท

จัดสรร 597.1400 ล้านบาท คงเหลือ 172.1714 ล้านบาท
