

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๙
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๓๑๒๓
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(va_13 : อนุรักษ์)

๑๑ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๒ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๓ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๔ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๕ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๖ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๗ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๘ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๑๙ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕
๒๐ ธ. ๕๕ ๑๙ ธ. ๕๕



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เรื่องเพื่อ ทราบจร

เรื่องที่.....๑

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/ ๓๐๒๓

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ส.๑๖๔

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

๑๕๓๕

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ฯพณฯ

๑๓ ธ.ค. ๕๕

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๕๙๓.๐๖๖๔ ล้านบาท

- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๔,๒๕๖.๐๗๙๖ ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๑๑,๓๓๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐

- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน

๑๐๕,๕๘๘.๓๙๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๙ จากยอดจัดสรรสุทธิ

จัดเข้าวาระ..... 18 S.A. 2555

๒. ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ

๘๐ มีจำนวน ๑๓ กระทรวง ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๕ กระทรวง

- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๕๖ จังหวัด ต่ำกว่าร้อยละ

๘๐ จำนวน ๑๙ จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๓. การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินที่แจ้งสงคืน

- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินสงคืน จำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๗๐.๒๓๖๖ ล้านบาท สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน ๕,๖๑๔.๘๘๘๗ ล้านบาท ทั้งนี้ มีส่วนราชการฯ ยังไม่ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ/รายการ วงเงิน ๒๖๒.๙๓๗๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างส่วนราชการฯ พิจารณาขอขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

ส.๑๖๔

ส.๑๖๔

เมื่อวันที่ 18 S.A. 2555 ลงมติว่า

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

อนุมัติ

ทราบ / เสนอครม. เพื่อทราบ

๕๕

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

18 S.A. 2555

ทราบ

ทราบ

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. เป็นวาระ

ทราบจร ในวันที่ 18 ธ.ค. ๕๕

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

นางอัมมวดี แสง

เพื่อโปรดเกล้าฯ

๑๖.๕๐๐๖

(นายอาทณ กิตติอาทณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


๑๖.๕๐๐๖

นร. ๖๕๙๐
เข้า ๑๓/๑๒/๕๕
๑๔.๐๔๔๗ น
ออก


ม.๑๖๔
๑๓/๑๒/๕๕
๑๕.๓๐๒๓

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

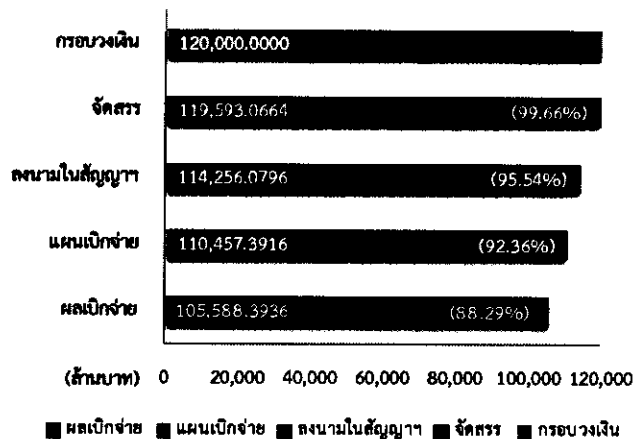

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

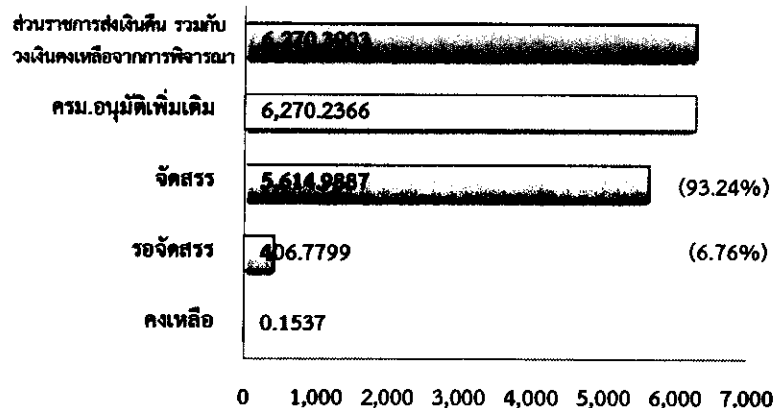

หมายเหตุ : * ส่วนราชการส่งเงินคืน 6,010.4503 ล้านบาท วงเงินคงเหลือจากการพิจารณา 259.9400 ล้านบาท

สรุปจำแนกตามกระทรวง

รวมทั้งสิ้น	119,593.07	105,588.39	88.29%	●	87.27%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,316.70	96.24%	●	98.80%
กระทรวงสาธารณสุข	1,841.11	1,645.04	89.35%	●	97.29%
กระทรวงกลาโหม	8,845.31	6,881.15	77.79%	●	95.74%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,887.84	12,138.53	94.19%	●	96.50%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,256.25	6,240.82	86.01%	●	92.13%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,449.83	99.98%	●	91.97%
กระทรวงอุตสาหกรรม	691.16	388.79	56.25%	●	81.34%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	●	88.46%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	14,845.88	89.01%	●	87.68%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,287.32	4,914.34	78.16%	●	86.88%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	510.26	44.75%	●	81.75%
กระทรวงมหาดไทย	30,359.52	27,613.09	90.95%	●	81.13%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	300.64	54.03%	●	68.33%
รัฐวิสาหกิจ	26,115.77	24,568.86	94.08%	●	66.91%
สำนักนายกรัฐมนตรี	232.05	35.68	15.38%	●	63.23%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	830.05	42.81%	●	61.66%
กระทรวงยุติธรรม	44.45	9.71	21.84%	●	37.36%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2555

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,992.8444	7,566.3189	84.14%	1,726	63.45%	11	100.00%	643	74.41%	17	97.71%
พะเยา	106.6368	103.4639	97.02%	252	90.48%	-	-	32	100.00%	1	100.00%
อุตรดิตถ์	753.8269	569.8800	75.60%	319	88.21%	-	-	61	85.98%	3	86.67%
ลำปาง	710.3777	569.7945	80.21%	85	82.72%	-	-	25	84.62%	2	100.00%
เชียงใหม่	1,559.2131	1,421.1615	91.15%	24	80.50%	5	100.00%	5	91.59%	-	-
แม่ฮ่องสอน	250.2245	200.7974	80.25%	82	80.04%	-	-	38	69.68%	-	-
ตาก	1,239.7752	1,140.1533	91.96%	55	79.80%	1	100.00%	28	93.74%	2	100.00%
ลำพูน	474.8500	483.7977	101.88%	90	79.70%	-	-	33	89.19%	4	100.00%
แพร่	1,355.9066	992.6246	73.21%	163	54.15%	1	100.00%	31	48.35%	1	95.00%
เชียงราย	780.5213	661.5697	84.76%	143	53.41%	-	-	50	73.33%	2	100.00%
สุโขทัย	1,154.2001	1,025.6450	88.86%	219	49.34%	3	100.00%	33	86.39%	-	-
น่าน	607.3122	397.4312	65.44%	365	33.13%	1	100.00%	58	66.84%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**				เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,777.8347	12,779.2021	86.48%	2,734	● 96.89%	25	● 99.48%	421	79.66%	3	● 82.50%
กำแพงเพชร	1,852.7730	1,698.2825	91.66%	329	● 99.19%	4	● 100.00%	40	76.50%	-	-
นครสวรรค์	5,182.7604	4,637.7352	89.48%	697	● 98.30%	5	● 100.00%	85	74.61%	1	75.00%
พิจิตร	2,864.6056	2,418.8777	84.44%	483	● 96.90%	8	● 96.88%	90	89.22%	-	-
อุทัยธานี	967.4419	813.2744	84.06%	155	● 96.41%	4	● 100.00%	98	85.80%	-	-
ชัยนาท	2,262.0914	1,838.4713	81.27%	761	● 95.47%	3	● 100.00%	57	65.52%	-	-
พิษณุโลก	1,648.1624	1,372.5609	83.28%	309	● 95.01%	1	● 100.00%	51	77.74%	2	● 90.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmodflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปายน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2555							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ส.ค.**				เสร็จหลัง ส.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปายน้ำ	63,648.5611	46,924.5270	73.72%	8,050	● 91.63%	46	● 88.27%	1,989	63.48%	-	-
สระบุรี	1,817.6412	1,652.8720	90.94%	300	● 98.12%	1	● 100.00%	54	● 93.04%	-	-
นครนายก	657.3108	604.1490	91.91%	246	● 97.92%	3	● 100.00%	24	● 81.64%	-	-
อ่างทอง	3,189.6306	2,667.6067	83.63%	1,177	● 97.84%	3	● 100.00%	58	64.51%	-	-
สุพรรณบุรี	1,886.1052	1,668.7617	88.48%	359	● 97.54%	4	● 100.00%	43	73.01%	-	-
ปราจีนบุรี	849.2189	851.2537	100.24%	283	● 95.81%	5	● 100.00%	68	● 86.48%	-	-
ลพบุรี	3,639.7751	2,453.9001	67.42%	546	● 95.18%	4	37.50%	108	28.92%	-	-
สิงห์บุรี	2,170.3808	1,524.2676	70.23%	601	● 94.96%	1	● 100.00%	54	58.99%	-	-
นนทบุรี	4,860.3630	2,928.9707	60.26%	427	● 94.68%	6	● 98.33%	61	66.58%	-	-
ฉะเชิงเทรา	1,681.5208	1,435.9455	85.40%	432	● 94.54%	1	● 100.00%	135	● 88.07%	-	-
นครปฐม	4,790.5988	3,968.0555	82.83%	311	● 93.84%	1	● 100.00%	59	72.16%	-	-
สมุทรปราการ	681.3018	609.2465	89.42%	40	● 93.82%	3	● 100.00%	30	77.67%	-	-
ปทุมธานี	9,501.2415	7,046.9101	74.17%	1,058	● 88.94%	2	● 100.00%	277	72.23%	-	-
สมุทรสาคร	950.9053	592.3996	62.30%	54	● 87.25%	7	● 100.00%	27	61.22%	-	-
พระนครศรีอยุธยา	11,886.2562	7,680.3678	64.62%	1,902	● 82.97%	5	● 98.00%	755	45.16%	-	-
กรุงเทพมหานคร	15,086.3111	11,239.8205	74.50%	314	● 82.47%	-	0.00%	236	● 80.69%	-	-

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	8,134	37,485.0606	25,530.7962	68.11	● 86.21%
ยโสธร	352	986.1980	945.6464	95.89	● 98.36%
ชัยภูมิ	773	2,358.8316	2,315.1798	98.15	● 98.07%
ตรัง	30	92.7492	86.2648	93.01	● 97.93%
บึงกาฬ	238	171.4880	138.2792	80.63	● 97.90%
มหาสารคาม	437	1,142.5344	1,064.4961	93.17	● 97.64%
เลย	385	694.8703	592.6039	85.28	● 96.97%
อุบลราชธานี	352	1,501.7088	1,401.2050	93.31	● 96.19%
ร้อยเอ็ด	474	1,885.9152	1,811.5359	96.06	● 95.90%
กาฬสินธุ์	412	929.5045	877.5607	94.41	● 95.84%
ขอนแก่น	405	1,822.3321	1,989.2071	109.16	● 95.51%
นครราชสีมา	166	951.7398	835.1458	87.75	● 95.18%
สตูล	100	378.9823	320.9561	84.69	● 94.79%
ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	17.9167	54.98	● 94.41%
เพชรบูรณ์	261	946.1782	746.7473	78.92	● 93.92%
สุรินทร์	251	1,206.2901	1,191.5050	98.77	● 93.57%
สระแก้ว	102	394.1946	368.1706	93.40	● 93.17%
พังงา	170	169.1089	127.1246	75.17	● 93.15%
สกลนคร	111	227.3488	197.7834	87.00	● 92.53%
ศรีสะเกษ	454	1,407.4135	1,323.3403	94.03	● 90.64%
นครพนม	216	1,125.6246	400.7352	35.60	● 90.32%
ชลบุรี	61	245.4188	196.4485	80.05	● 88.71%
ตราด	45	92.3450	77.7282	84.17	● 87.93%
อำนาจเจริญ	80	216.2592	131.0461	60.60	● 86.51%
ระยอง	60	118.3100	70.0594	59.22	● 86.21%
บุรีรัมย์	92	612.2214	503.8135	82.29	● 86.10%
จันทบุรี	42	144.3167	131.7662	91.30	● 83.90%
อุดรธานี	194	562.7185	467.0371	83.00	● 80.94%
ระนอง	38	94.8738	79.7319	84.04	● 80.79%
ภูเก็ต	31	115.6562	42.7487	36.96	● 80.63%
มุกดาหาร	154	340.3249	282.8947	83.12	● 80.17%
ส่วนกลาง	413	12,835.9490	4,845.3467	37.75	79.07%
หนองคาย	120	406.1732	318.2604	78.36	75.94%
ราชบุรี	29	97.2690	68.4206	70.34	75.85%
สงขลา	143	552.7129	287.9250	52.09	57.05%
หนองบัวลำภู	45	353.4646	270.8587	76.63	53.33%
พัทลุง	283	445.6317	315.9556	70.90	49.68%
ปัตตานี	92	198.0500	159.4983	80.53	48.45%
สุราษฎร์ธานี	110	200.3472	91.9854	45.91	48.27%
นราธิวาส	88	229.8091	75.2399	32.74	35.23%
สมุทรสงคราม	3	28.1928	27.6140	97.95	33.33%
ยะลา	72	62.7363	45.5447	72.60	31.94%
นครศรีธรรมราช	234	1,106.4359	289.4691	26.16	24.02%
เพชรบุรี	2	0.2414	-	-	0.00%

หมายเหตุ: ● สูงกว่าร้อยละ 80

โครงการ/รายการ ที่ยังไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน 120,000 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ		งบกลาง
รวมภาคใต้		124.6765
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
1.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 4 ก.ย. 2555		
2.	การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 ภายใต้กรอบ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) ครั้งที่ 3 (กระทรวงการต่างประเทศ)	20.0000
มติ ครม. 2 ต.ค. 2555		
3.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	20.2635
4.	โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด : โครงการชุดลอกบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	97.9970
