

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๗๖๑๒
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๘ มกราคม ๒๕๕๖) เกี่ยวกับรายงานสถานะ
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร. ๓. ๓. ๒๕๕๖

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk56_03_04 : อนุรักษ์)

ร. ๓. ๓. ๒๕๕๖
๙ ๑๒ ๒๕๕๖
๑๖ ๑๒ ๒๕๕๖
๑๗ ๑๒ ๒๕๕๖
๑๗ ๑๒ ๒๕๕๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เรื่องเพื่อทราบจร

เรื่องที่.....

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ๓๓๓.3344

ที่ นร ๐๓๐๑/ ๓๖๖๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 12 มี.ค. 56

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ๒/90
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) วันที่ 13 มี.ค. 56
13.00 น.

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ๒๕๕๖

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตาม
โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) ดังนี้

จัดเข้าวาระ 12 มี.ค. 2556

๑. การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานประมาณจัดสรรสุทธิ เป็นเงิน ๑๑๙,๕๑๒.๑๒๐๔ ล้านบาท
- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๑๕,๔๕๐.๑๓๑๖ ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน

๑๑๐,๒๒๘.๓๑๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๓ จากยอดจัดสรรสุทธิ

๒. ผลการดำเนินงาน

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๑๓ กระทรวง ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๖ กระทรวง
- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๕๗ จังหวัด ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๘ จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๓. วงเงินงบประมาณคงเหลือ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ
เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ วันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานประมาณจัดสรรแล้วสุทธิ ๑๑๙,๕๑๒.๑๒๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๘๗.๘๗๙๖
ล้านบาท ประกอบด้วย รายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน
๓๗๑.๔๖๙๖ ล้านบาท (ซึ่งรวมรายการที่ส่วนราชการฯ ยังมีได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขอย้ายระยะเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๓ โครงการ/รายการ วงเงิน ๒๔๒.๙๓๗๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ ๒) และวงเงินคงเหลือที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมได้ทันที จำนวน ๑๑๖.๔๑๐๐
ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเงินประจำงวดกลับจาก
ส่วนราชการฯ ที่แจ้งส่งคืนอีกจำนวน ๑๘.๕๒๕๗ ล้านบาท ดังนั้น วงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติ
เพิ่มเติมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๔.๙๓๕๗ ล้านบาท

๓๐ 1
สค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2556 ลงมติว่า

เห็นชอบ เสนอ ดร. ทราบ

ในวันที่ 12 มีนาคม 56

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

๑๑ มี.ค. ๕๖

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ทราบ
นายวิมล งาม.

เพื่อโปรดทราบ
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


ทวน
๑๑ มี.ค. ๕๖

นร. ๓๐๔
เข้า 11/3/56
10.24๔
ออก 11/3/56
19.36๔


นร. 11 ๒๘7
8 20 36 (11:30 น.)

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวม 120,000 ลบ.

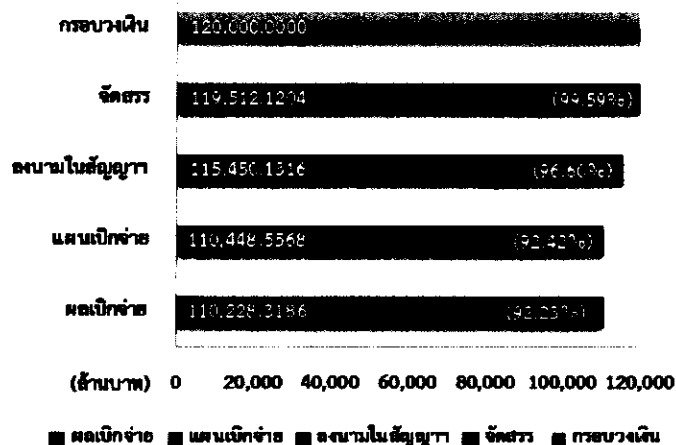

สรุปภาพรวมเงินเหลือจ่าย

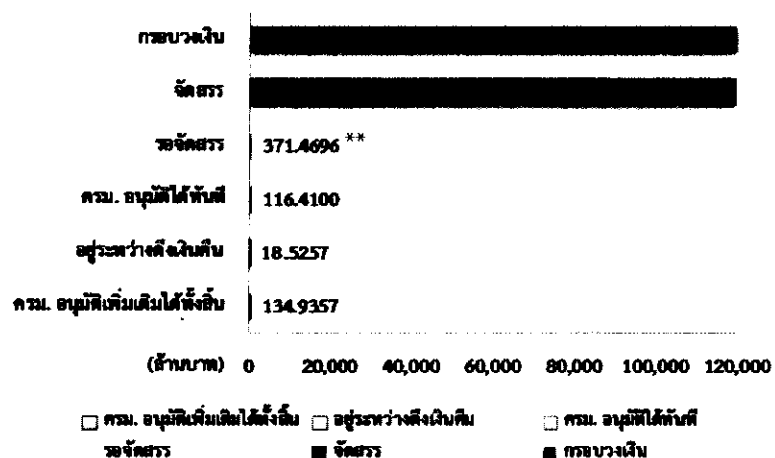

สรุปจำแนกตามกระทรวง

กระทรวง	งบวงเงิน (ล้านบาท)	จัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	สถานะ	ร้อยละ (%)
รวมทั้งสิ้น	119,512.12	110,228.32	92.23%	●	88.10%
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.41	11.41	100.00%	●	100.00%
กระทรวงคมนาคม	16,678.94	15,387.97	92.26%	●	99.29%
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1,368.11	1,362.60	99.60%	●	98.80%
กระทรวงสาธารณสุข	1,841.11	1,659.26	90.12%	●	97.29%
กระทรวงกลาโหม	8,857.31	7,517.26	84.87%	●	95.88%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,838.17	12,484.52	97.25%	●	95.50%
กระทรวงอุตสาหกรรม	690.97	534.00	77.28%	●	92.52%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,211.73	7,031.14	97.50%	●	92.13%
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,450.41	2,449.54	99.96%	●	92.02%
กระทรวงแรงงาน	887.88	887.64	99.97%	●	89.00%
กระทรวงวัฒนธรรม	1,140.33	693.20	60.79%	●	87.30%
กระทรวงศึกษาธิการ	6,280.74	5,337.89	84.99%	●	87.13%
กระทรวงมหาดไทย	30,359.52	28,601.48	94.21%	●	81.25%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	556.45	477.51	85.81%	●	74.17%
รัฐสภา	26,118.80	24,738.44	94.72%	●	67.12%
นายกรัฐมนตรี	232.05	43.14	18.59%	●	63.23%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,938.76	988.87	51.01%	●	58.41%
กระทรวงยุติธรรม	44.45	22.46	50.53%	●	50.97%
กระทรวงการต่างประเทศ	5.00	-	0.00%	●	0.00%

หมายเหตุ: * ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 6 มี.ค. 2556

** ข้อมูลจากระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานปรมาณ

● สูงกว่าร้อยละ 80

** ได้รวมงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของกรมศิลปากร วงเงิน 70.9739 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ

จังหวัด	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558							
	งบกลาง	งบกลาง (งบอุดหนุน)	ร้อยละ	งบกลาง งบฯ 1				งบกลาง งบฯ 2			
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ	8,992.8444	7,741.7487	86.09%	1,726	63.92%	11	100.00%	643	77.52%	17	99.17%
พะเยา	106.6368	103.4639	97.02%	252	90.48%	-	-	32	100.00%	1	100.00%
อุดรดิตถ์	753.8269	617.2690	81.88%	319	88.21%	-	-	61	85.98%	3	93.33%
ลำปาง	710.3777	569.8685	80.22%	85	83.55%	-	-	25	86.89%	2	100.00%
แม่ฮ่องสอน	250.2245	235.1803	93.99%	24	81.96%	-	-	5	98.78%	-	-
เชียงใหม่	1,559.2131	1,422.0495	91.20%	82	81.80%	5	100.00%	38	95.90%	-	-
ลำพูน	474.8500	483.7977	101.88%	55	80.92%	-	-	28	89.19%	4	100.00%
ตาก	1,239.7752	1,196.8431	96.54%	90	79.82%	1	100.00%	33	95.13%	2	100.00%
แพร่	1,355.9066	1,027.9496	75.81%	163	54.15%	1	100.00%	31	48.53%	1	100.00%
เชียงราย	780.5213	661.5697	84.76%	143	53.41%	-	-	50	87.25%	2	100.00%
สุโขทัย	1,154.2001	1,026.3260	88.92%	219	49.39%	3	100.00%	33	86.64%	-	-
น่าน	607.3122	397.4312	65.44%	365	33.13%	1	100.00%	58	66.84%	2	100.00%

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการไปแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟู (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 มี.ค. 2556							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ก.ค.**				เสร็จหลัง ก.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
2.กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ	14,777.8347	12,902.9537	87.31%	2,736	● 97.21%	25	● 100.00%	419	81.87%	3	● 95.00%
กำแพงเพชร	1,852.7730	1,698.2821	91.66%	329	● 99.19%	4	● 100.00%	40	79.00%	-	-
นครสวรรค์	5,182.7604	4,711.5616	90.91%	699	● 98.30%	5	● 100.00%	83	78.01%	1	● 95.00%
พิษณุโลก	1,648.1624	1,372.5609	83.28%	309	● 97.34%	1	● 100.00%	51	81.66%	2	● 95.00%
พิจิตร	2,864.6056	2,448.7927	85.48%	483	● 97.20%	8	● 100.00%	90	89.83%	-	-
อุทัยธานี	967.4419	833.2851	86.13%	155	● 96.44%	4	● 100.00%	98	86.59%	-	-
ชัยนาท	2,262.0914	1,838.4713	81.27%	761	● 95.47%	3	● 100.00%	57	69.02%	-	-

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmocflood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปกลุ่มจังหวัดปายน้ำ

จังหวัด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 มี.ค. 2556							
	จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	เสร็จใน ส.ค.**				เสร็จหลัง ส.ค.**			
				ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship		ภาพรวม		เฉพาะโครงการ Flagship	
				รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***	รายการ	ก้าวหน้า	รายการ	ก้าวหน้า***
กลุ่มจังหวัดปายน้ำ	63,650.6611	47,579.5932	74.75%	8,047	● 92.26%	46	● 99.52%	1,993	65.94%	-	-
สระบุรี	1,817.6412	1,652.9940	90.94%	300	● 98.14%	1	● 100.00%	54	● 94.90%	-	-
อ่างทอง	3,189.6306	2,723.9683	85.40%	1,176	● 98.12%	3	● 100.00%	59	67.41%	-	-
นครนายก	657.3108	605.7655	92.16%	246	● 97.92%	3	● 100.00%	24	● 86.06%	-	-
สุพรรณบุรี	1,886.1052	1,680.6278	89.11%	359	● 97.54%	4	● 100.00%	43	75.03%	-	-
ปราจีนบุรี	849.2189	854.0227	100.57%	283	● 95.86%	5	● 100.00%	68	● 87.18%	-	-
ลพบุรี	3,639.7751	2,453.9001	67.42%	546	● 95.37%	4	● 95.00%	108	28.92%	-	-
สิงห์บุรี	2,170.3808	1,527.7956	70.39%	601	● 95.30%	1	● 100.00%	54	61.47%	-	-
นนทบุรี	4,860.3630	2,992.6776	61.57%	427	● 95.08%	6	● 98.33%	61	74.75%	-	-
สมุทรปราการ	681.3018	609.5311	89.47%	37	● 94.59%	3	● 100.00%	33	● 82.42%	-	-
ฉะเชิงเทรา	1,681.5208	1,444.7186	85.92%	434	● 94.56%	1	● 100.00%	133	● 88.75%	-	-
นครปฐม	4,790.5988	4,046.9804	84.48%	311	● 94.18%	1	● 100.00%	59	75.55%	-	-
กรุงเทพมหานคร	15,086.3111	11,369.9975	75.37%	314	● 93.09%	-	0.00%	236	● 82.33%	-	-
สมุทรสาคร	950.9053	609.0984	64.05%	54	● 89.10%	7	● 100.00%	27	66.89%	-	-
ปทุมธานี	9,503.3415	7,212.5140	75.89%	1,057	● 89.09%	2	● 100.00%	279	74.46%	-	-
พระนครศรีอยุธยา	11,886.2562	7,795.0016	65.58%	1,902	● 83.31%	5	● 100.00%	755	48.06%	-	-

หมายเหตุ: * ผลการเบิกจ่ายจากระบบรายงานแผน/ผลการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ

** ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีให้กลุ่มจังหวัดต้นน้ำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

*** ความก้าวหน้าโครงการ Flagship จาก www.pmoctlood.com โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับรายการ (ไม่มีข้อมูลของกรุงเทพมหานคร)

● สูงกว่าร้อยละ 80

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปจังหวัดนอกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า	
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)	
รวมทั้งสิ้น	8,135	37,490.0606	26,171.9848	69.81	●	86.87%
ยโสธร	352	986.1980	945.6464	95.89	●	98.93%
บึงกาฬ	238	171.4880	164.9092	96.16	●	98.11%
ชัยภูมิ	773	2,358.8316	2,315.1798	98.15	●	98.07%
ศรีสะเกษ	30	92.7492	86.2648	93.01	●	97.93%
มหาสารคาม	437	1,142.5344	1,064.4961	93.17	●	97.88%
นครราชสีมา	166	951.7398	835.1458	87.75	●	97.59%
เลย	385	694.8703	596.3102	85.82	●	97.27%
เพชรบูรณ์	261	946.1782	746.7473	78.92	●	96.60%
พังงา	170	169.1089	127.1246	75.17	●	96.51%
อุบลราชธานี	352	1,501.7088	1,401.2050	93.31	●	96.48%
ร้อยเอ็ด	474	1,885.9152	1,812.3259	96.10	●	96.19%
สกลนคร	111	227.3488	197.7834	87.00	●	95.92%
กาฬสินธุ์	412	929.5045	877.5607	94.41	●	95.84%
สตูล	100	378.9823	320.9561	84.69	●	95.78%
ขอนแก่น	405	1,822.3321	1,989.2071	109.16	●	95.51%
สระแก้ว	102	394.1946	368.1706	93.40	●	95.00%
ประจวบคีรีขันธ์	14	32.5903	17.9167	54.98	●	94.41%
สุรินทร์	251	1,206.2901	1,202.6967	99.70	●	93.67%
ศรีสะเกษ	454	1,407.4135	1,323.3403	94.03	●	90.64%
ชลบุรี	61	245.4188	197.3929	80.43	●	90.39%
ภูเก็ต	31	115.6562	43.4642	37.58	●	90.32%

จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้า	
		จัดสรร	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ	ในการดำเนินงาน เฉลี่ย (ร้อยละ)	
นครพนม	216	1,125.6246	400.7352	35.60	●	90.32%
บุรีรัมย์	92	612.2214	564.6200	92.22	●	89.53%
ระยอง	60	118.3100	70.0594	59.22	●	88.83%
ตราด	45	92.3450	77.7282	84.17	●	87.93%
อำนาจเจริญ	80	216.2592	131.0461	60.60	●	86.52%
จันทบุรี	42	144.3167	133.8652	92.76	●	84.85%
ระนอง	38	94.8738	80.0039	84.33	●	83.36%
อุดรธานี	194	562.7185	462.0371	82.11	●	80.94%
มุกดาหาร	154	340.3249	282.8947	83.12	●	80.25%
ส่วนกลาง	414	12,840.9490	5,368.7112	41.81		79.84%
ราชบุรี	29	97.2690	69.8831	71.85		77.92%
หนองคาย	120	406.1732	318.2604	78.36		75.94%
สงขลา	143	552.7129	292.3050	52.89		57.15%
หนองบัวลำภู	45	353.4646	270.8587	76.63		53.33%
พัทลุง	283	445.6317	315.9556	70.90		49.68%
ปัตตานี	92	198.0500	160.4733	81.03		49.54%
สุราษฎร์ธานี	110	200.3472	91.9854	45.91		48.27%
นราธิวาส	88	229.8091	75.2399	32.74		36.36%
ยะลา	72	62.7363	49.3337	78.64		34.72%
สมุทรสงคราม	3	28.1928	27.6140	97.95		33.33%
นครศรีธรรมราช	234	1,106.4359	294.5314	26.62		25.64%
เพชรบุรี	2	0.2414	-	-		0.00%

หมายเหตุ: ● สูงกว่าร้อยละ 80

โครงการ/รายการ ที่ยังไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 บกกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 (วงเงิน 120,000 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/รายการ		งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		242.9370
มติ ครม. 10 ก.ค. 2555		
1.	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบการเผชิญเหตุเพื่อบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคกลาง (สบอช.) **คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยพิจารณาทบทวน	124.6765
มติ ครม. 2 ค.ค. 2555		
2.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบ แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)	20.2635
3.	โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ประสบอุทกภัยตามข้อเสนอของจังหวัด : โครงการขุดลอกบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร (กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	97.9970
