



ที่ กค ๐๘๐๕.๒/ ๑๖๖๖

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนก
รายการกระทรวง
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สำคัญ
๔. รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า
๕. สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๖. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ) พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. สถานะการใช้จ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๘. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๖๔
๙. สถานะการใช้จ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ
โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒)
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐและเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไปยังประธานกรรมการและกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๓.๑.๒ ปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๐๖,๑๒๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ^(๕)	๓,๑๐๐,๐๐๐	๙๘๓,๖๑๔	๓๑.๗๓	๑,๑๑๘,๐๗๔	๓๖.๐๗
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๔๙๔,๗๓๘	๘๘๖,๖๑๑	๓๕.๕๔	๘๙๕,๘๒๙	๓๕.๙๑
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๐๕,๒๖๒	๙๗,๐๐๓	๑๖.๐๓	๒๒๒,๒๔๕	๓๖.๗๒
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๔๙,๒๕๒	๙๗,๐๐๐	๑๗.๖๖	๒๒๒,๒๔๒	๔๐.๔๖
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๒๓๗,๒๔๑	๗๕,๕๓๐	๓๑.๘๔	๒๓๕,๖๙๘	๙๙.๓๕
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๓)	๒๘๗,๔๓๙	๕๓,๒๖๙	๑๘.๕๓		

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔)		การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๔)	๘๘,๔๐๘	๗๓,๘๗๗	๘๓.๕๖		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)	๔,๕๒๙	๗,๘๔๔	๑๗๓.๑๙		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ขดเซยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๗๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)	๑๐,๗๘๖	๑๐,๕๔๘	๙๗.๗๙		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)	๗๓,๐๙๓	๕๕,๔๘๕	๗๕.๙๑		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)	๑๙๑,๔๔๑	๑๑๙,๘๓๓	๖๒.๖๐		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๗๒,๕๐๓	๓๔,๒๗๓	๔๗.๒๗		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และขดเซยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๓๖,๔๑๖	๓๓,๗๐๐	๙๒.๕๔		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ COVID - ๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๘๒,๕๒๒	๕๑,๗๙๐	๖๒.๗๖		
รวมทั้งสิ้น	๓,๙๐๔,๕๒๙	๑,๓๐๖,๑๒๓	๓๓.๔๕		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ภาพรวม ร้อยละ ๓๔.๐๘ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๓๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๘.๙๖ เป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ภาพรวม ร้อยละ ๓๐.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๔.๐๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๓.๐๐

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๒	๒,๕๐๘,๙๐๕	๑๙๒,๗๗๖	๓๕,๔๑๘	๑๘.๓๗

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวงสามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์

๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

๒.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๐๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๖๑ ล้านบาท)

๒.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มิมีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓,๕๒๔ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๒.๓) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๐๐ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๒๖ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ ๑๖๕,๘๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๖๕,๘๖๔ ล้านบาท)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/๓) ปัญหา ...

๓) ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้า สรุปได้ดังนี้

๓.๑) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ ได้แก่ มีการปรับปรุงแบบรูปรายการ แบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง หรือชะลอการดำเนินการ เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่พร้อมดำเนินการ

๓.๒) ปัญหาด้านการดำเนินงาน ได้แก่ ราคาวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา ทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร หน่วยรับงบประมาณต้องหารือกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือทบทวนราคากลางเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะได้ดำเนินการได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนหน้านี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๔.๒) กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๓/ว๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หรือกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง)

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๐๗,๑๘๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบลงทุน ทั้งปี (๑)	เบิกจ่ายจริง สะสม (๒)	ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม /กรอบลงทุนทั้งปี (๒)/(๑)	เบิกจ่ายจริง สะสมปี ๖๓
๑. ปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) จำนวน ๓๔ แห่ง (๑๒ เดือน)	๑๗๔,๐๐๙	๑๔๕,๔๖๑	๘๔	๑๐๐,๗๘๓
๒. ปีปฏิทิน (ม.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๙ แห่ง (๑๒ เดือน)	๑๗๖,๔๖๕	๑๖๑,๗๒๔	๙๒	๑๕๓,๐๓๙
๓. รวม ๔๓ แห่ง (๑+๒.)	๓๕๐,๔๗๔	๓๐๗,๑๘๕	๘๘	๒๕๓,๘๒๒

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS-SOE ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและ สศช. ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๓ ที่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายได้ ๒๕๓,๘๒๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทำให้ในปี ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายลงทุนสูงกว่าปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓,๓๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑

๒) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑๘,๑๐๓ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๓ เดือน จำนวน ๑๔,๒๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๑๕,๐๐๗ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะเริ่มมีผลการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป


๓) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจประสบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง งานโยธา และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ โดยมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า นครหลวง และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีปัญหาการเบิกจ่าย งบลงทุน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และองค์การเภสัชกรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔) แผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๕

รัฐวิสาหกิจมีแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๕ กระจุกตัวในช่วง ครึ่งหลังของปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

/หน่วย ...

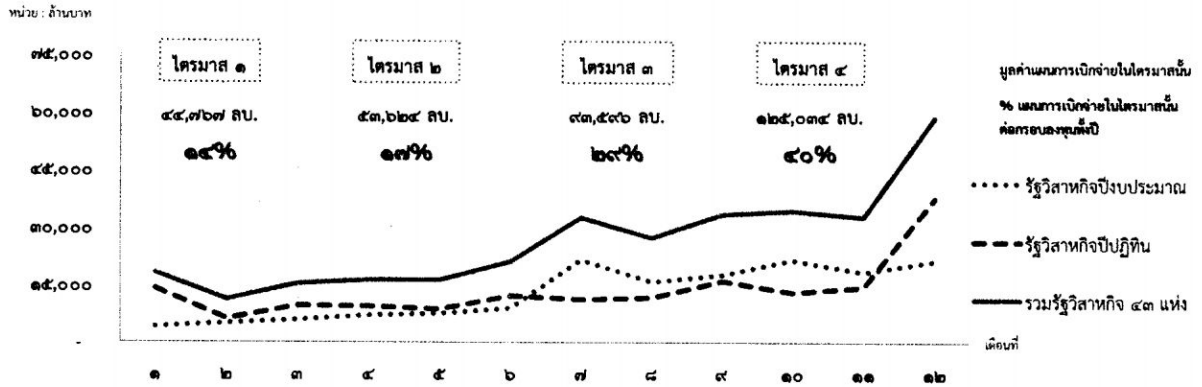

ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS-SOE ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนลงทุนของ อสป. อสค. และ อตค. เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : (๑) แผนการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ และแผนการเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

(๒) ข้อมูลกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ปรับปรุงแล้ว ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และกรอบอนุมัติของ สศช. และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๕) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการดังนี้

๕.๑) เร่งขออนุมัติปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ

โดยให้เสนอ สศช. ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี รวมถึงให้เร่งรัดรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กรอบระยะเวลายกหนดด้วย ทั้งนี้ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการลงทุนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้กรอบวงเงินลงทุนลดลง ควรเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถควบคุมได้ หรือเป็นการดำเนินการเชิงนโยบายเท่านั้น

๕.๒) ปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี ๒๕๖๕ (Front - Loaded) รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงและมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าในปี ๒๕๖๔

๓.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๒ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๑ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๒,๗๗๖ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการ) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน ^(๑)						
	PPP	เงินกู้ ต่างประเทศ	เงินกู้ ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๙,๑๗๘	๑๔,๐๔๘	-	-	๒๔,๔๑๖	-	๖๗,๖๔๒
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๖,๐๓๑	๘๔,๒๘๒	๑,๕๐๕,๒๖๖	๓๕๕,๑๐๐	๑๔๒,๗๙๑	๔๓,๕๓๗	๒,๔๒๗,๐๐๗
รวม	๓๒๕,๒๐๙	๙๘,๓๓๐	๑,๕๐๕,๒๖๖	๓๕๕,๑๐๐	๑๖๗,๒๐๘	๔๓,๕๓๗	๒,๔๙๔,๖๔๙ ^(๒)
ร้อยละ	๑๓	๔	๖๐	๑๔	๗	๒	๑๐๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สสร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีการนับรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมจำนวน ๑๔,๒๕๖ ล้านบาท ในมูลค่าโครงการ โดยมีเงินลงทุนจำนวน ๑,๘๔๐ ล้านบาท

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

ขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๑ โครงการ มูลค่า ๒.๐๙ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๑ โครงการ มูลค่า ๗๐๔,๙๑๕ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๘ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๒๑,๙๓๔ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๒๙๖,๕๔๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ) พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ วงเงิน ๙๘๖,๙๖๔ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๔๓,๕๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ มีแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ วงเงินรวม จำนวน ๙๘๖,๙๖๔ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๘๘,๔๐๘ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) วงเงินรวม ๘๕,๖๓๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๒๖ โครงการ วงเงินรวม ๗๓,๘๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และร้อยละ ๘๖ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหาอุปสรรค

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ของแผนงานเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID - ๑๙ สำหรับประชาชนไทย (A๐๔๑) ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ประกอบกับครุภัณฑ์บางส่วนมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้โครงการที่มีผลการดำเนินการล่าช้า

- การอุทธรณ์ผลการประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น การจัดซื้อเข็มฉีดยา ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID - ๑๙ สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๓๕ ล้านโดส ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่าวัสดุทางการแพทย์

แนวทางแก้ไข

- หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการให้สามารถรองรับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งรวมถึงรองรับความล่าช้าในการส่งมอบครุภัณฑ์ของโครงการ

- คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้พิจารณาให้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๕ โดยกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างยาเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษานั้น ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีปกติได้ทัน ซึ่งหากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ (๑) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษา COVID - ๑๙ เป็นกรณีเร่งด่วน หากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่เอกสารถูกต้องตามที่เงื่อนไขเพียงรายเดียว ให้สามารถดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ และ (๒) หากมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สามารถจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างกำหนด และยกเว้นการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๑ วรรคสอง

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

การโอนเงินให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่สำเร็จ เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนบัญชีรับเงินหรือบัญชีถูกปิดรวมถึงบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกินระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางแก้ไข

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยเบิกจ่ายแทนจะดำเนินการโอนเงินให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง รวมถึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเร่งดำเนินการแจ้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ทราบถึงปัญหาและแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ

๓.๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

- แรงงานไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงานใหม่ได้ทันตามกำหนด

- เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งกรณีที่มีผู้ยื่นเพียงรายเดียวจึงต้องยกเลิกและการไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

- สถานการณ์อุทกภัยทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

- เงื่อนไขในการใช้สิทธิของโครงการมีความซับซ้อนทำให้ยอดการใช้จ่ายของโครงการไม่เป็นไปตามแผน เช่น โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน มีความต้องการทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สถานประกอบการมีความต้องการจ้างงาน

แนวทางแก้ไข

- หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอต่อ คกก. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการได้อย่างครบถ้วน

- กรมการพัฒนาชุมชนเร่งดำเนินโครงการโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากสถานการณ์น้ำกลับสู่สภาวะปกติ ซึ่งขณะนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ขุดแปลงสำหรับสร้างพื้นที่ต้นแบบไปแล้วทั้งสิ้น ๒๔,๔๙๘ แปลง (เป้าหมาย ๒๕,๑๗๙ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๙๗ เหลือแปลงที่ยังไม่สามารถขุดได้ ๖๘๑ แปลง ทั้งนี้ ได้มีการผูกสัญญาจ้างทั้งหมดแล้ว

- กรมการจัดหางานดำเนินการ Matching ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบการที่มีความต้องการจ้างงาน ผ่านเว็บไซต์ <https://thaimengaantam.doe.go.th/> รวมถึงเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในการ Matching ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๓ โครงการ วงเงิน ๓๔๒,๓๑๗ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๒๒๙,๖๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๓ โครงการ วงเงินรวม ๓๔๒,๓๑๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๑๙๑,๔๔๑ ล้านบาท และมีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) วงเงินรวม ๑๓๘,๕๐๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีการเบิกจ่ายจำนวน ๓๐ โครงการ วงเงินรวม ๑๑๙,๘๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และร้อยละ ๘๗ ของแผนเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

๓) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหาอุปสรรค

การเบิกจ่ายค่าวัคซีนของโครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID - ๑๙ สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๑๐ โดส (Pfizer) พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากต้องเบิกจ่ายค่าวัคซีนในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID - ๑๙ สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๙,๙๙๘,๘๒๐ โดส (Pfizer) ให้ครบทุกโดสก่อน

แนวทางแก้ไข

กรมควบคุมโรคจะเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าวัคซีนของโครงการแรกให้แล้วเสร็จและเตรียมการสำหรับโครงการที่ ๒ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๒)

ปัญหาอุปสรรค

- ข้อมูลรายชื่อของนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลเนื่องจากนักศึกษามีรายชื่ออยู่ในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๑ คณะ/สาขาวิชา/สถาบัน

- สถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายแทนกันได้

- ผู้ประกันตนในโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสำเร็จ

/แนวทาง ...

แนวทางแก้ไข

- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสานสถาบันอุดมศึกษา
ให้นิสิต นักศึกษาเลือกยื่นยันขอรับความช่วยเหลือได้เพียง ๑ สิทธิ์ต่อ ๑ คนเท่านั้น
- ทำความตกลงแนวทางการเบิกจ่ายแทนกันกับกรมบัญชีกลาง
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องทำหน้าที่เบิกจ่าย
- สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับผู้ประกันตน
ที่โอนเงินไม่สำเร็จทุกสัปดาห์

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
และตามพ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ที่คณะกรรมการฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐-๒๒๔๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๗๓

โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๘๕๔๗

e-mail : pavi_s@sepo.go.th
